

SEJAM BEM-VINDOS

COMEÇAREMOS EM INSTANTES

16ª REUNIÃO DO COMITÊ

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

15 DE DEZEMBRO DE 2022

*Projeto de Apoio à Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência
na Gestão Pública do Estado do Ceará (2019 a 2026)*

PAUTA DA REUNIÃO

1. Aprovação da Ata da 15ª Reunião do Comitê;
2. Informações importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Projetos de Assistência Técnica;
5. Indicadores;
6. Controle e Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais; e
7. Encerramento.

1. APROVAÇÃO DA ATA

15ª Reunião do Comitê (27/10/2022)

E-mail enviado em 30/11/2022



2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!!

- ✓ Preencher o formulário de frequência;
- ✓ Gestão Documental: recomendamos que toda a documentação dos processos licitatórios (todas as fases) se concentrem em uma área e/ou setor da Setorial;
- ✓ Enviar Ordem de Serviço/fornecimento dos contratos; e
- ✓ Empenhar produtos que serão entregues até Fevereiro/2023.


3. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

DESEMBOLSOS



Valor do Empréstimo	US\$139.880.000,00
Valor da Contrapartida	US\$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee	US\$ 349.700,00

Descrição	Data	Valor US\$	%
Valor do Empréstimo		139.880.000,00	
Valor da Contrapartida		34.970.000,00	
Taxa Front-end Fee	15/05/2020	349.700,00	0,25%
1º e 2º Desembolsos	2020	1.539.864,78	1,10%
3º e 4º Desembolsos	2021	2.390.035,96	1,71%
5º a 7º Desembolsos	2022	16.388.752,65	11,72%
Total		20.668.353,39	14,78%
Saldo a desembolsar		119.211.646,61	

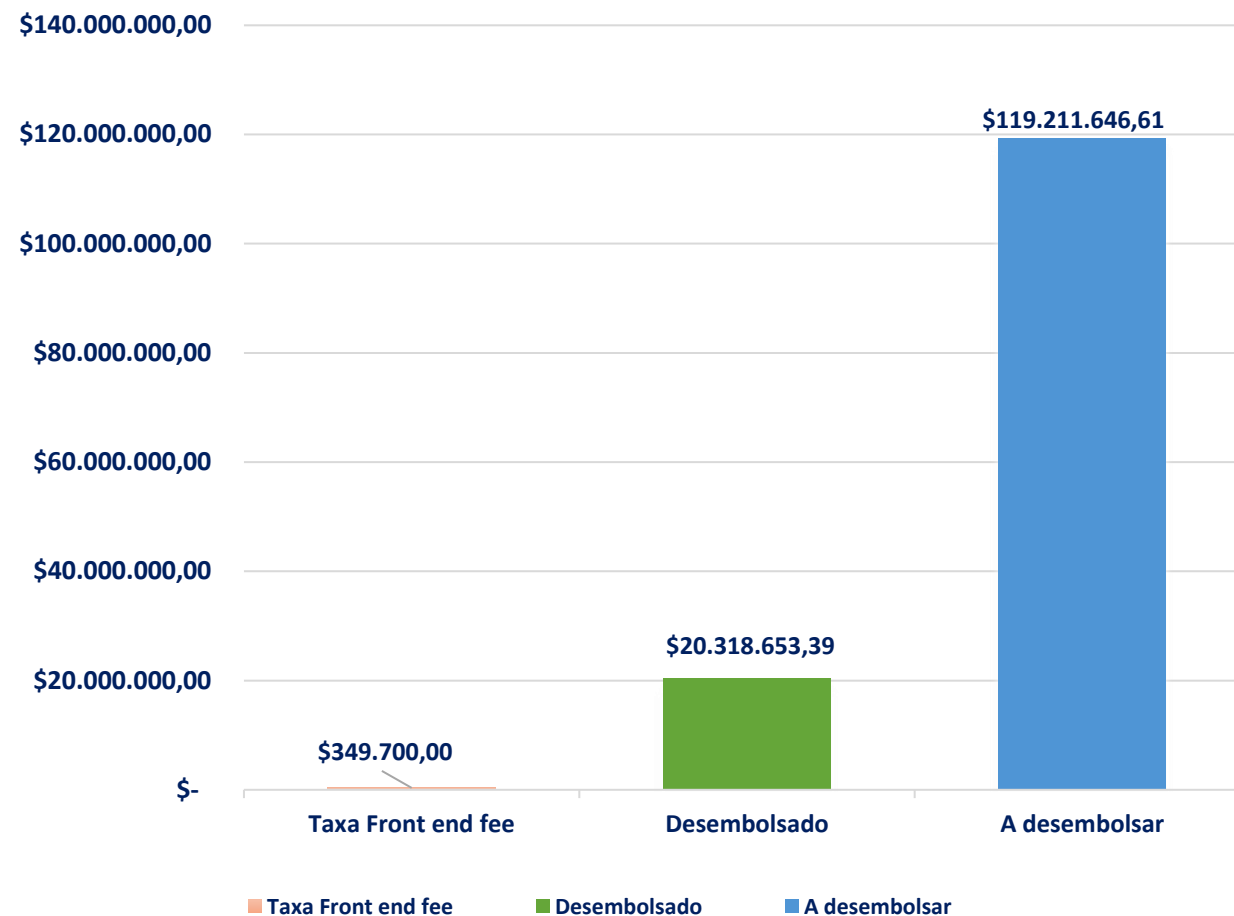


SALDO DA CONTA OPERATIVA

Saldo Conta Operativa em Dezembro/2022 (US\$)	
Valor Desembolsado	20.318.653,39
Valor Executado até 14/12/2022	15.814.209,79
Saldo desembolsado a Executar	4.504.443,60

Saldo Conta Operativa em Dezembro/2022 (R\$)	
Valor Desembolsado em Reais	105.714.843,43
Valor Executado até 14/12/2022	82.438.100,19
Saldo desembolsado a Executar	23.276.743,24

Desembolsado a executar x Executado

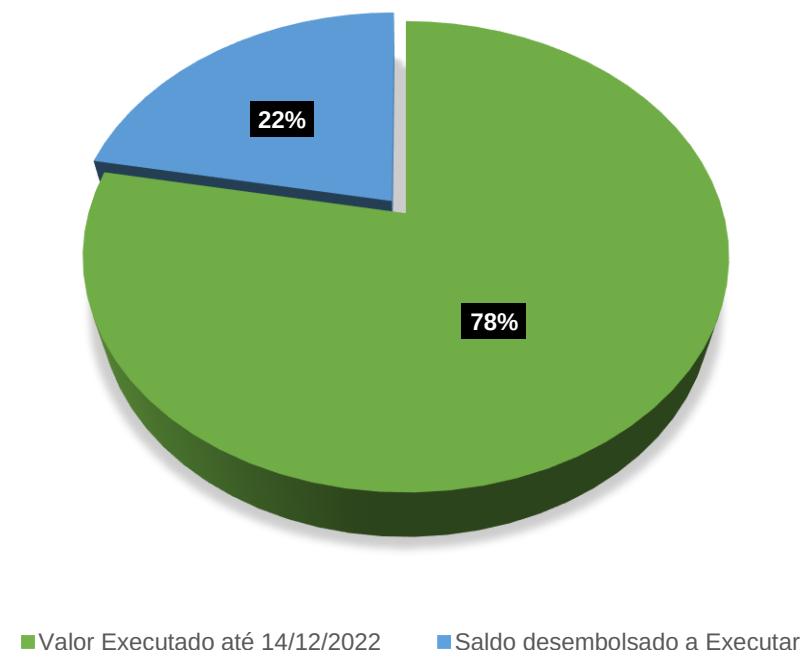

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - CONCILIAÇÃO DESEMBOLSO X EMPENHO (R\$)

Ano	Desembolsos	Empenhos	Pagamentos			Saldo da Conta
			Orçamento	Restos a pagar	Total	
2020	8.177.297,92	2.420.219,32	824.905,89	-	824.905,89	7.352.392,03
2021	13.013.218,72	12.677.021,55	8.632.583,45	1.595.313,43	10.227.896,88	10.137.713,87
2022	84.524.326,79	69.891.682,31	67.342.675,55	4.042.621,87	71.385.297,42	23.276.743,24
Total	105.714.843,43	82.205.425,26	76.800.164,89	5.637.935,30	82.438.100,19	

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO – ORÇAMENTO 2022

ORÇAMENTO 2022 - R\$						
SETORIAL	Lei + Crédito (A)	Valor Internalizado (B)	Saldo Orçamento(A) – (B)	Valor Empenhado (C)	Saldo Empenho (B) – (C)	Valor pago
ARCE	4.350.000,00	960.132,00	3.389.868,00	0,00	960.132,00	0,00
CAGECE SCIDADES	6.300.000,00	2.716.123,57	3.583.876,43	421.789,73	2.294.333,84	421.789,73
CGE	2.148.800,00	674.490,28	1.474.309,72	720.000,00	-45.509,72	317.600,00
FUNCEME	10.395.438,00	2.927.064,69	7.468.373,31	5.004.748,83	-2.077.684,14	3.176.661,23
IPECE	2.943.822,00	2.091.704,74	852.117,26	1.380.378,49	711.326,25	1.061.859,33
SCIDADES	500.000,00	212.054,65	287.945,35	0,00	212.054,65	0,00
SEPLAG	950.000,00	580.725,00	369.275,00	0,00	580.725,00	0,00
SRH	178.176.211,00	74.241.632,26	103.934.578,74	60.352.811,20	13.888.821,06	60.352.811,20
COGERH	7.185.850,00	9.265.615,56	-2.079.765,56	1.946.234,06	7.319.381,50	1.946.234,06
TCE	2.500.000,00	60.913,11	2.439.086,89	65.720,00	-4.806,89	65.720,00
TOTAL GERAL	215.450.121,00	91.947.760,62	123.502.360,38	69.891.682,31	22.056.078,31	67.342.675,55

ACOMPANHAMENTO FÍSICO – MAPP's


Setorial	Nº	Nome	Status
CGE	131	Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos_IPF-9006	Vencido

EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

CONTRATOS ASSINADOS			
Status	Nº Contratos Assinados	Valor Contratado R\$	Valor Pago R\$
Em execução	29	766.488.603,47	64.213.059,18
Concluído Financeiramente, mas em execução física	12	12.408.629,66	12.408.629,66
Execução física e financeira Concluídas	20	5.816.411,34	5.816.411,35
Rescindido *	1	0,00	0,00
TOTAL	62	784.713.644,47	82.438.100,19

* O valor do contrato rescindido da COGERH não está refletido no valor total contratado

CONTRATOS



- Em execução
- Concluído Financeiramente, mas em execução física
- Execução físico e financeiro Concluídos.
- Rescindido

EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

Setorial	Nº de Subprojetos	Nº de Contratos	Nº Contratos Em Execução Física + Concluída Execução Financeira	Contratos Rescindidos	Nº Contratos + Execução física e financeira Concluídas	Valor Contratado + Patronal FONTE BIRD (R\$)	Valor Contratado + Patronal CONTRAPARTIDA (R\$)	Valor Pago Até 14/12/2022 (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% Pago Setorial	% Pago Total
1	ARCE	3	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	CAGECE	5	2		0	2.254.474,31	0,00	421.789,73	1.832.684,58	18,71%	0,07%
3	CGE	1	1		0	4.000.000,00	0,00	317.600,00	3.682.400,00	7,94%	0,05%
4	CIDADES	2	1		0	219.360,00	0,00	0,00	219.360,00	0,00%	0,00%
5	COGERH	6	12	1	4	16.067.645,41	0,00	7.273.398,52	8.794.246,89	45,27%	1,17%
6	FUNCEME	13	16		11	11.463.672,30	0,00	9.114.430,58	2.349.241,72	79,51%	1,47%
7	IPECE	14	15		3	6.269.221,36	0,00	2.762.731,98	3.506.489,38	44,07%	0,44%
8	SEDET	5	3		1	5.780.028,94	0,00	1.851.043,90	3.928.985,04	46,51%	0,30%
9	SEPLAG	2	1		0	2.317.264,86	0,00	0,00	2.317.264,86	0,00%	0,00%
10	SRH	8	9		2	572.631.535,89	163.644.721,42	60.631.385,48	512.000.150,41	8,23%	9,76%
11	TCE	2	2		0	65.720,00	0,00	65.720,00	0,00	100,00%	0,01%
TOTAL		61	62		21	621.068.923,06	163.644.721,42	82.438.100,19	538.630.822,88	10,51%	10,51%
TOTAL			62			784.713.644,50					

4. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



02 OBRAS



34 CONSULTORIAS



08 SERVIÇOS



17 BENS



61 SUBPROJETOS

Componente I: Aumento da Segurança Hídrica

SRH | **SECRETARIA DOS
RECURSOS HÍDRICOS**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



01 OBRA



05 CONSULTORIAS



02 BENS

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - SRH

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos nº 07, 08 e 09/2022. Concluído Financeiramente, mas em execução física.
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - Concluído.
5	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	SRH ajustando a documentação após reunião com o Banco Mundial na Missão de novembro de 2022.
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. <i>Há Indicador associado</i>	1º Consultor: Contrato Revogado. 2º Consultor: Reunião de negociação agendada para o dia 21/12.
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA
8	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/SRH/CE/2020 em Execução - RONEI VIEIRA DE CARVALHO



02 CONSULTORIAS
01 SERVIÇOS
03 BENS

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - COGERH

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da Macromedição da COGERH. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 014, 015 e 016/2021/COGERH. Concluído Financeiramente, mas em execução física.
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH - Concluído.
3	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão. <i>Há Indicador associado</i>	UGP emitiu a Anuência para o Parecer Conclusivo do Pregão Eletrônico 20220018 – COGERH. Processo em análise na PGE.
4	Consultoria	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 066/2022/COGERH em Execução - CONSÓRCIO HYDROS / REGEA / IRRIGART.
5	Bens	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1– Equipamentos de TI: Concluído ; 2 – Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH. Concluído Financeiramente, mas em execução física; e 3 – Aquisição de TI: Processo encontra-se na PROLIC/PGE para análise desde o dia 18/07.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 072/2022/COGERH em Execução - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

FUNCEME



**FUNDAÇÃO CEARENSE
DE METEOROLOGIA E
RECURSOS HÍDRICOS**



02 CONSULTORIAS



04 SERVIÇOS



07 BENS

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	Contratos: 04/2021, 05/2021, 06/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 Concluídos.
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 - Concluído.
3	Serviços	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	Edital de Pregão Eletrônico aprovado pela UGP no dia 01/12. FUNCEME instruindo o processo para envio a PGE.
4	Serviços	Contratação de empresa para realização de serviço de laboratório para análises físico-químicas e biológicas em amostras de água bruta de corpos hídricos superficiais localizados no Ceará.	Parecer de Julgamento validado pela UGP, entretanto empresas entraram com recursos ao processo.
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado Do Ceará.	Contrato nº 07/2022 - JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ. Aguardando a emissão da Ordem de Serviço.
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato nº 08/2021 em Execução Física, Concluída Execução Financeira.

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME

Nº	Método	Subprojetos	Status
7	Serviços	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	Contrato nº 16/2021 Concluído .
8	Bens	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	Minuta da Especificação Técnica em ajustes na FUNCEME após reunião realizada no dia 07/12.
9	Bens	Aquisição de Drones.	Processo encaminhado para PGE no dia 28/11, para análise e posterior lançamento do Pregão Eletrônico.
10	Consultoria	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	Contrato nº 14/2021 em Execução - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM.
11	Bens	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Contratos Nº 17/2022 Concluído Financeiramente, mas em execução física. Nº 19/2022 em Execução - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluências aos principais reservatórios do Estado. <u>Há Indicador associado</u>	Edital de SDO aprovado pela UGP. Processo analisado pela PGE e aguardando Edital assinado do Dr. Rafael (Procurador) para lançamento.
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em Execução - MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. Aguardando a emissão da Ordem de Serviço.

Componente II: Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água



01 OBRA



04 CONSULTORIAS

COMPONENTE II – MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - CAGECE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <u>Há Indicador associado 1</u>	Relatório de Avaliação de Proposta aprovado pela Banco Mundial 13/12.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i>	Minuta do contrato remetido para conferências e assinaturas por parte do Consórcio.
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Contrato nº 145/2022 em Execução - INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA .
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. <u>Há Indicador associado</u>	Contrato nº 201/2021 em Execução - QUANTUM DO BRASIL LTDA .
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	Documentação negociada (minuta do contrato e atas negociadas) remetidas para análise e assinatura do Consórcio.

Componente III: Fortalecimento da Gestão do Setor Público



**AGÊNCIA REGULADORA
DO ESTADO DO CEARÁ**



03 CONSULTORIAS

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

ARCE



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <u>Há Indicador associado</u>	Relatório de Avaliação Combinada (técnica e financeira) aprovado pela UGP no dia 12/12. ARCE colhendo as assinaturas e posterior envio a Cel04.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Resultado Final de Licitação publicado. ARCE providenciando a Homologação e Adjudicação e posterior assinatura do contrato.
3	Consultoria	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	Previsão de envio do Termo de Referência e Estimativa de Custo para análise da UGP?



10 CONSULTORIAS
03 SERVIÇOS
01 BEM

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

IPECE



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. - <u>Há Indicador associado</u>	Contrato nº 08/2022 em Execução - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Contrato nº 10/2022 em Execução - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.
3	Serviço	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <u>Há Indicador associado 1 – 2 – 3</u>	Edital Pregão Eletrônico validade e assinado pelo IPECE. Aguardando o lançamento.
4	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 07/2020, 09/2020 e 02/2021 em Execução .
5	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1. Contratos nº 13/2022 - FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA , nº 14/2022 - SPENCER COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA , nº 16/2022 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e 17/2022 - TORINO INFORMÁTICA em Execução .

SEDET | FUNCEME



03 CONSULTORIAS



01 BEM

SEDET

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ



01 CONSULTORIA

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

SEDET

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SEDET/IPECE	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
2	Consultoria	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SEDET/FUNCEME	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
3	Consultoria	Contratação de Consultoria Internacional (Fundação) para Orientação e Acompanhamento de Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)". SEDET/FUNCEME	Estão sendo realizadas reuniões com as equipes da FUNCEME e da SEDET para ajustes no escopo, objeto e método de aquisição.
4	Consultoria Individual	Contratação de Consultores Individuais para Apoio na Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)". SEDET/FUNCEME.	
5	Bens	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SEDET/FUNCEME	Contrato nº 06/2020 Concluído.

SCIDADES



**SECRETARIA
DAS CIDADES**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



02 CONSULTORIAS

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

SCIDADES



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Relatório de Formação da Lista Custa (RFLC) aprovado pela UGP no dia 06/12. SCIDADES colhendo as assinaturas e posterior envio a Cel04/PGE. UGP elaborando a minuta do Edital de Solicitação de Proposta – SDP.
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Contrato nº 20/2022 em Execução - WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO.

CGE



**CONTROLADORIA
E OUVIDORIA GERAL
DO ESTADO**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



01 CONSULTORIA

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. <u>Há Indicador associado</u>	Contrato nº 07/2022 em Execução - CONSÓRCIO CONFIDERE E CANIX.

SEPLAG



**SECRETARIA
DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



01 CONSULTORIA



01 BEM

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. Há Indicador associado	Contrato nº 018/2022 em Execução - CONSÓRCIO MTC: MACROPLAN / TRANSPLAN / J C M Freitas-serviços de Informática (CHERRY IT) .
2	Bens	Aquisição de mobiliário de equipamentos de TIC para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	1) Adesão à Ata de Preços da ETICE para aquisição de computadores: já retornou do Gabinete e está na COTEC para dar sequência ao processo; 2) Aquisição de Mobiliário: Está na COAFI para finalizar e enviar para a PGE; e 3) Aquisição de equipamentos: Está na COAFI para dar sequência ao processo.



02 BENS

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

TCE



Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	Contratos nº 35 e 36/2021 Em Execução Física Concluída Execução Financeira
2	Bens	Aquisições de Equipamentos para desenvolver solução de monitoramento de obras de engenharia que consiste na elaboração de uma base analítica composta de mecanismo de coleta de dados e painéis de monitoramento de obras de engenharia por meio da tecnologia de Business Intelligence e aplicação de modelos de Machine Learning. Há Indicador associado	Pregão Eletrônico realizado no dia 05/12/2022. TCE elaborando o Parecer de Julgamento.

6. CONTROLE E MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO - ADUTORA

ATIVIDADES		EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
1	Ações de planejamento ambiental e social das obras	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS / PRI
2	Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Social das obras (PGASO)	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
3	Elaboração do Plano de Gerenciamento e Disposição de Resíduos	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
4	Elaboração do Plano de Gestão do Sistema Viário	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
5	Elaboração do Plano de Interferência com Infraestrutura de Serviços Públicos	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
6	Elaboração do Plano de Salvamento do Patrimônio Cultural	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
7	Elaboração do Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência e Meio Ambiente do Trabalho	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
8	Elaboração do Plano de Educação Socioambiental dos Trabalhadores e Código de Conduta na Obra	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS

MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO - ADUTORA

	ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
9	Elaboração do Plano de Comunicação Social	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
10	Elaboração do Plano de Ações Socioeducativas e de Gênero	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	PGS
11	Elaboração do Plano de Reassentamento Involuntário - PRI da Adutora	Empresa Construtora	SRH	UGP	22/08/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	MRI
12	Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) dos lixões a céu aberto existentes na bacia do reservatório Banabuiú	Empresa Consultora	SRH COGERH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Aguardando recebimento da versão atualizada	EVA / PGS
13	Elaboração do EVA para análise e emissão da LI	Empresa Construtora	SRH	UGP	21/07/2022	Não se repete	Em atraso	Retornou à SRH com a análise do BM	MGSA
14	Preenchimento do Formulário de Análise socioambiental das atividades do projeto (Anexo 1 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
15	Preenchimento do Formulário de Supervisão socioambiental de obras civis (Anexo 2 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA
16	Preenchimento do Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Ambientais e Sociais (Anexo 3 do MGSA)	Empresa Construtora	Empresa Supervisora SRH	UGP	15/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA

MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO - ADUTORA

ATIVIDADES		EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
17	Solicitação de Emissão de licença para captação de água no reservatório Banabuiú	Empresa Construtora	SRH	UGP			Em atraso	Aguardando	-
18	Solicitação de Emissão de outorga para captação de água no reservatório Banabuiú	Empresa Construtora	SRH COGERH	UGP			Em atraso	Aguardando início das obras	-
19	Implantação da faixa referente à Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório Banabuiú e elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do reservatório artificial (Pacuera)	Empresa Consultora	COGERH	UGP	21/08/2022	Não se repete	Em atraso	Em análise na SRH	PGS
20	Levantamento, caracterização e diagnóstico das fontes poluidoras localizadas no entorno do reservatório e na bacia hidrográfica	Empresa Consultora	SRH	UGP	21/08/2022	Não se repete	Concluído		EVA
21	Aperfeiçoamento do monitoramento qualitativo do reservatório	Empresa Consultora	FUNCEME	UGP	09/11/2022	Quando necessário	Em atividades preparatórias	Aguardando o envio do Edital e Mapa de Preço para análise da UGP	PGS
22	Elaboração do Plano de Segurança Hídrica da bacia hidrográfica do reservatório Banabuiú	Empresa Consultora	COGERH	UGP	11/07/2023	Não se repete	Em fase de licitação	Aguardando fim do processo licitatório para contratação da empresa	PGS

MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO - ADUTORA

ATIVIDADES		EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
23	Renovação da LP 1/2022 - DICOP (validade: 02/01/2027)	SRH	SRH	UGP		Período definido na licença	Concluído	-	-
24	Renovação da LO 660/2017 - DICOP-GECON (validade: 19/09/2021)	SRH	SRH	UGP	19/09/2021	Período definido na licença	Em andamento	Solicitada	-
25	Elaboração do Plano Abreviado de Reassentamento (PAR) da ETA	SRH	SRH	UGP			Concluído	-	MGSA
26	Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao MAC, ao Manual de Comunicação Social e MSGA	Empresa Supervisora	SRH	UGP	Fim de cada obra/atividade	Mensal	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA

MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO - DMCS

ATIVIDADES		EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	PERIODICIDADE	STATUS	OBSERVAÇÕES	DOCUMENTO ASSOCIADO
1	Ações de planejamento ambiental e social das obras	Empresa Construtora	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Não se repete	Em atraso	Aguardando fim do processo licitatório	MGSA
2	Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Social das obras (PGASO)	Empresa Construtora	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Não se repete	Em atraso	Aguardando fim do processo licitatório	MGSA
3	Preenchimento do Formulário de Análise socioambiental das atividades do projeto (Anexo 1 do MGSA)	Empresa Construtora	ATO CAGECE	UGP	05/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
4	Preenchimento do Formulário de Supervisão socioambiental de obras civis (Anexo 2 do MGSA)	Empresa Construtora	ATO CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Semestral	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA
5	Preenchimento do Relatório Analítico de Acompanhamento das Salvaguardas Ambientais e Sociais (Anexo 3 do MGSA)	ATO	ATO CAGECE	UGP	05/12/2022	Semestral	Em andamento	Formulário do primeiro semestre de 2022 foi entregue	MGSA
6	Fiscalização, acompanhamento e orientação das ações ambientais relativas ao MAC, ao Manual de Comunicação Social e MSGA	ATO	CAGECE	UGP	Fim de cada obra/atividade	Mensal	Em atraso	Aguardando início das obras	MGSA

Próxima Reunião do Comitê

23/02/2023

**QUE O ESPÍRITO NATALINO
TRAGA AOS NOSSOS
CORAÇÕES A FÉ E A CRENÇA
EM UM NOVO TEMPO DE
PAZ E AMOR E QUE
OS DESAFIOS DO
PRÓXIMO ANO SE
TRANSFORMEM EM
OPORTUNIDADES
DE CRESCIMENTO
E REALIZAÇÕES.**

BOAS FESTAS!

UGP - IPECE





CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

WWW.IPECE.CE.GOV.BR
