

ATA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA

Data: 02/03/2023 **Início:** 10h00min **Duração:** 1h06min **Término:** 11h06min **Local:** Virtual

QUADRO DE PRESENÇA			
SETORIAIS	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO UGP / IPF	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Christina Bianchi	Consultora Individual	PRESENTE
	Fabiana Silva de Castro	Técnica	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Gonçalves	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	PRESENTE
	Deusimar Lira Cavalcante Filho	Consultor Individual	PRESENTE
	Carlos Wagner Rios Pinto	Consultor Individual	PRESENTE
ARCE	Danielle Silva Pinto	Titular	PRESENTE
	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	PRESENTE
CAGECE	Abigail Lino de Araújo	Titular	PRESENTE
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	PRESENTE
CGE	Marcos Henrique de Carvalho Almeida	Titular	PRESENTE
	Marcelo de Sousa Monteiro	Suplente	PRESENTE
	Elayne Cristina Chaves Cavalcante	Representante	PRESENTE
	José Otacílio de Assis Júnior	Representante	PRESENTE
SCIDADES	Marcos Cesar Cals de Oliveira	Representante	PRESENTE
	Pryscilla Gomes Mota Matos	Representante	PRESENTE
	Carla Leite da Escossia Abreu	Participante	PRESENTE
COGERH	Elano Lamartine Leão Joca	Titular	AUSENTE
	Paulo Henrique Studart Pinho	Suplente	PRESENTE
	Itamara Mary Leite de Menezes Taveira	Representante	PRESENTE
	Sarah Freire	Representante	PRESENTE
	Anthony Rafael Soares Maia	Representante	PRESENTE
	Marcilio Caetano de Oliveira	Representante	PRESENTE
	Mikaelle Duarte Mariano	Representante	PRESENTE
	Paulo Miranda Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	PRESENTE
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	AUSENTE
IPECE	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	PRESENTE
SEDET	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	AUSENTE
SEPLAG	Francisco Adaudo de Oliveira	Titular	PRESENTE
	Marcelo Correia Lima da Rocha	Suplente	PRESENTE
SRH	Gianni Peixoto Bezerra Lima	Titular	PRESENTE
	Mércia Cristina Manguiera Sales	Suplente	JUSTIFICADO
TCE	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	JUSTIFICADO
	Luís Sávio Pires de Braga	Suplente	AUSENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 10h00 do dia 02 de março de 2023, virtualmente, **Alice Menezes (UGP/IPECE)** agradeceu a participação de todos e iniciou a reunião. Ressaltou se tratar da 17ª Reunião do Comitê IPF. Informou que a reunião estava sendo gravada para elaboração da Ata e apresentou a pauta dos assuntos a serem tratados por meio de arquivo em *Power Point*,¹ conforme pauta abaixo:

1. Aprovação da Ata da 16ª Reunião do Comitê;
2. Informações Importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Projetos de Assistência Técnica;
5. Indicadores;
6. Controle e Monitoramento das Salvaguardas Socioambientais; e
7. Encerramento.

II. APROVAÇÃO DA ATA

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Colocou em pauta a aprovação da Ata da última reunião do Comitê, ocorrida em 15 de dezembro de 2022 e encaminhada no dia 5 de janeiro de 2023, por e-mail. A ata foi aprovada por unanimidade.

III. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Preencher o formulário de frequência;

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Solicitou o preenchimento do formulário de frequência, disponível do chat, para formalizar a presença na reunião do Comitê.

- ✓ Dúvidas e entraves favor remeter, preferencialmente, por e-mail (ugp.ipf@ipece.ce.gov.br);

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Comunicou a participação da equipe do financeiro da UGP no treinamento da SEFAZ sobre as mudanças no processo financeiro e contábil implementadas no sistema SIAFE. Ressaltou ser de conhecimento da UGP que a maioria das pessoas presentes não trabalham operacionalizando os sistemas, mas solicitou que as informações da reunião do Comitê sejam repassadas ao financeiro de cada setorial ou para os setores envolvidos na dinâmica do processo do IPF como um todo. Solicitou que as dúvidas sejam enviadas para o e-mail da UGP para que possam ser encaminhadas à SEFAZ no caso de entraves no setor financeiro, ou qualquer outra dúvida em outras áreas, facilitando o monitoramento.

- ✓ Formação das novas e/ou ajustes das Comissões (licitação e contrato);

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Às secretarias que tiveram exonerações de pessoal que compunham comissões de análise de produto ou eram gestores de contrato, devem informar à UGP sobre a existência de novas comissões ou se irão manter as comissões que já existem, tanto na parte de licitação como também na parte dos contratos, com o intuito de atualizar os arquivos do Projeto.

¹ https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2022/10/Apresentacao_Comite271022.pdf

- ✓ Datas prováveis da próxima Missão (Meio Termo): primeiras semanas de maio;

Alice Menezes (UGP/IPECE) – A próxima Missão do Banco Mundial, segundo informação da gerente do Projeto, ocorrerá possivelmente nas primeiras semanas do mês de maio, ainda não se tem data oficial.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Essa Missão do Banco será diferente em relação as Missões tradicionais. Pois trata-se da Missão de Meio Termo que tem como objetivo discutir as metas e cláusulas que constam no Acordo de Empréstimo e o que consta no PAD no intuito de analisar a necessidade de reformulações ou alterações. A minuta do Relatório está em elaboração e posteriormente será apresentado e discutido com as setoriais e com o Banco Mundial.

- ✓ Quaisquer ajustes aos contratos devem ser analisados previamente pela UGP.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Qualquer ajuste que ocorrer nos contratos deve ser analisado previamente pela UGP.

- ✓ Enviar Ordem de Serviço/Fornecimento dos contratos.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Encaminhar ordem de serviço/fornecimento a UGP, sempre que forem emitidas.

IV. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Tabela 1: Desembolsos – Valor do Empréstimo x Valor da Contrapartida x Taxa Front-end Fee.

Valor do Empréstimo	US\$ 139.880.000,00
Valor da Contrapartida	US\$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee	US\$ 349.700,00


Fonte: UGP/IPECE.

Tabela 2: Desembolsos.

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR US\$	%
Valor do Empréstimo		139.880.000,00	
Valor da Contrapartida		34.970.000,00	
Taxa Front-end Fee	15/05/2020	349.700,00	0,25%
1º e 2º Desembolsos	2020	1.539.864,78	1,10%
3º e 4º Desembolsos	2021	2.390.035,96	1,71%
5º a 7º Desembolsos	2022	16.388.752,65	11,72%
8º Desembolso	2023	5.665.503,17	4,05%
Total		26.333.856,56	18,83%
Saldo a desembolsar		113.546.143,44	

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 1: Desembolsos do Projeto – US\$.

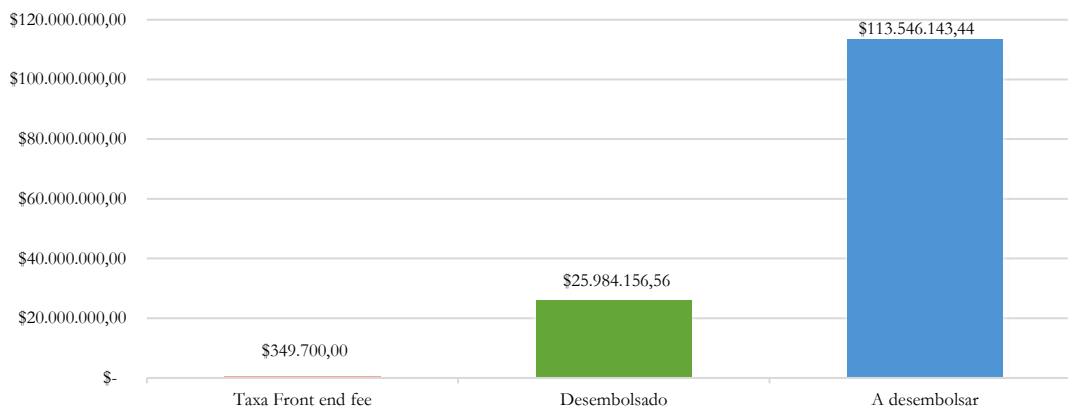

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Os desembolsos realizados no Projeto até fevereiro 2023, totalizaram US\$ 25.984.156,56. Tendo ainda o montante de US\$ 113.546.143,44 de saldo a desembolsar.

Tabela 3: Saldo da Conta Operativa em Fevereiro/2023 (US\$).

Valor Desembolsado	25.984.156,56
Valor Executado até 24/02/2023	16.437.974,84
Saldo desembolsado a executar	9.546.181,72


Fonte: UGP/IPECE.

Tabela 4: Saldo da Conta Operativa em Fevereiro/2023 (R\$).

Valor Desembolsado	135.274.606,22
Valor Executado até 24/02/2023	85.663.589,25
Saldo desembolsado a executar	49.611.016,97

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 2: Desembolsado a executar x Executado (R\$)

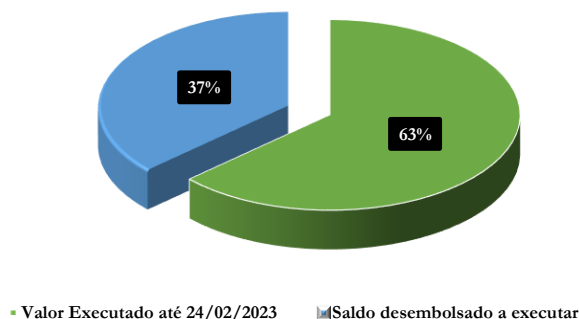

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – O saldo atual da conta operativa é de R\$ 49.611.016,97, com base no que foi executado. Perfazendo um total de 63% do valor desembolsado.

Tabela 5: Acompanhamento Financeiro – Conciliação Desembolso x Empenho (R\$).

ANO	DESEMBOLSOS	EMPENHOS	PAGAMENTOS			SALDO DA CONTA
			ORÇAMENTO	RESTOS A PAGAR	TOTAL	
2020	8.177.297,92	4.233.693,58	824.905,89	-	824.905,89	7.352.392,03
2021	13.013.218,72	12.677.021,55	8.632.583,45	1.595.313,43	10.227.896,88	10.137.713,87
2022	84.524.326,79	74.955.949,05	69.963.059,00	4.042.621,87	74.005.680,87	20.656.359,79
2023	29.559.762,79	1.793.505,12		605.105,61	605.105,61	49.611.016,97
TOTAL	105.714.843,43	93.660.169,30	76.800.164,89	5.637.935,30	82.438.100,19	49.611.016,97

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – A tabela 5 traz o monitoramento do Projeto ano a ano, os desembolsos realizados, os empenhos, a execução dentro do orçamento e com recursos de exercícios anteriores. Esse ano, até a presente data, só ocorreram pagamentos de restos a pagar.

Tabela 6: Acompanhamento Financeiro – Restos a Pagar (R\$).

SETORIAL	CONTRATO/FORNECEDOR	Valor Executado em R\$		
		2022		2023
		Total Empenhado	Total pago	Restos a Pagar
CAGECE	QUANTUM DO BRASIL LTDA	738.132,02	421.789,73	316.342,29
TOTAL CAGECE		738.132,02	421.789,73	316.342,29
FUNCEME	UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	1.946.480,58	1.395.029,06	551.451,52
SEDET / FUNCEME	3V3 TECNOLOGIA LTDA	912.422,16	210.558,96	701.863,20
TOTAL FUNCEME		2.858.902,74	1.605.588,02	1.253.314,72
IPECE	SPENCER COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	7.796,00	-	7.796,00
	FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	40.000,00	-	40.000,00
SEDET / IPECE	3V3 TECNOLOGIA LTDA	122.400,00	-	122.400,00
TOTAL IPECE		170.196,00	-	170.196,00
SCIDADES	VLADIMIR ANTONIO RIBEIRO	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL SCIDADES		50.000,00	-	50.000,00
SEPLAG	MACROPLAN / TRANSPLAN / JCN FREITAS	347.589,73	115.863,24	231.726,49
TOTAL SEPLAG		347.589,73	115.863,24	231.726,49
TCE	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A	2.366.204,95	-	2.366.204,95
TOTAL TCE		2.431.924,95	65.720,00	2.366.204,95
TOTAL GERAL		6.596.745,44	2.208.960,99	4.387.784,45

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Informações da tabela 6 listam os contratos com despesas empenhadas em 2022 e que estão inscritas como restos a pagar.

Tabela 7: Acompanhamento Financeiro – Orçamento 2023 (R\$).

SETORIAL	Lei + Crédito	Valor empenhado 2023	Valor pago 2023	Saldo (Lei + crédito - valor empenhado)	Saldo Valor Empenhado - Pago	Empenhado/LOA	Pago/Empenhado
ARCE	4.676.400,00	0	0	4.676.400,00	0	0,00%	0,00%
CAGECE	44.007.980,00	0	0	44.007.980,00	0	0,00%	0,00%
CGE	1.920.000,00	1.680.000,00	0	240.000,00	1.680.000,00	87,50%	0,00%
FUNCEME	10.050.000,00	17.200,00	0	10.032.800,00	17.200,00	0,17%	0,00%
IPECE	5.939.022,00	96.305,12	0	5.842.716,88	96.305,12	1,62%	0,00%
SCIDADES	675.000,00	0	0	675.000,00	0	0,00%	0,00%
SEPLAG	1.275.000,00	0	0	1.275.000,00	0	0,00%	0,00%
SRH	156.342.879,00	0	0	156.342.879,00	0	0,00%	0,00%
COGERH	22.626.757,00	0	0	22.626.757,00	0	0,00%	0,00%
TCE	2.500.000,00	0	0	2.500.000,00	0	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL	250.013.038,00	1.793.505,12	0	248.219.532,88	1.793.505,12	0,72%	0,00%

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – O acompanhamento do orçamento do ano de 2023, mostra que até agora apenas a CGE, a FUNCEME e o IPECE empenharam, totalizando R\$ 1.793.505,12.


Tabela 8: Execução Acumulada dos Contratos Assinados (R\$).

CONTRATOS ASSINADOS					
Status	Nº Contratos	Valor Contratado/BIRD	Valor Contratado/Contrapartida	Valor Pago/BIRD	Valor Pago/Contrapartida
Em execução	29	606.143.011,41	163.644.721,42	66.942.398,24	
Concluído Financeiramente, mas em execução física	12	12.703.060,66		12.703.060,66	
Concluído	23	6.018.130,34		6.018.130,35	
Rescindido *	1	0		0	
TOTAL	65	624.864.202,42	163.644.721,42	85.663.589,25	

* O valor do contrato rescindido da COGERH não está refletido no valor total contratado.

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 3: Contratos.

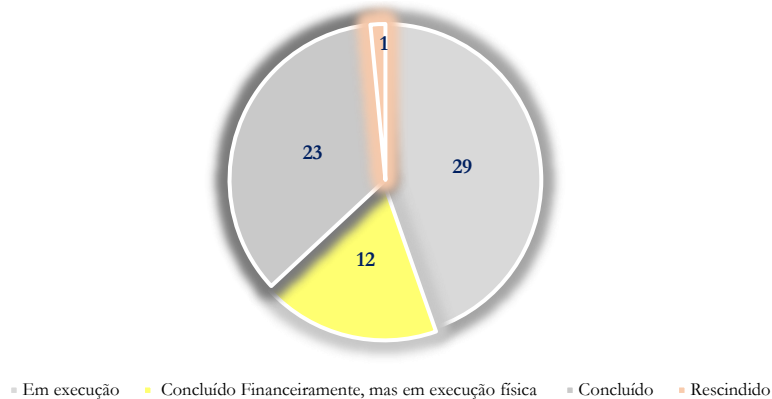

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – A execução acumulada dos contratos mostra que dos sessenta e cinco contratos, vinte e nove estão em execução, doze concluídos financeiramente, mas em execução física, vinte e três concluídos e um rescindido. O valor total pago na execução desses contratos foi de R\$ 85.663.589,25 dos R\$ 624.864.202,42 que já foram contratados.

Tabela 9: Execução Acumulada dos Contratos (R\$).

Sectorial	Nº de Subprojetos	Nº de Contrato	Nº Contratos Em Execução Física + Concluído Financeiramente, mas em execução física	Contratos Rescindidos	Nº Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal FONTE BIRD	Valor Contratado + Patronal CONTRAPARTIDA	Valor Pago Até 24/02/2023	Saldo a Pagar	% Pago Setorial	% Pago Total
1 ARCE	3	1	1		0	843.951,42	0	0	843.951,42	0,00%	0,00%
2 CAGECE	5	2	2		0	2.254.474,31	0	421.789,73	1.832.684,58	18,71%	0,07%
3 CGE	1	1	1		0	4.000.000,00	0	320.000,00	3.680.000,00	8,00%	0,05%
4 CIDADES	2	1	1		0	219.360,00	0	0	219.360,00	0,00%	0,00%
5 COGERH	6	12	6	1	5	16.067.645,41	0	7.273.398,52	8.794.246,89	45,27%	1,16%
6 FUNCEME	13	16	6		10	11.463.672,30	0	10.115.100,20	1.348.572,10	88,24%	1,62%
7 IPECE	14	15	12		3	6.568.257,05	0	3.305.178,10	3.263.078,95	50,32%	0,53%
8 SEDET	5	3	2		1	5.780.028,94	0	1.851.043,90	3.928.985,04	46,51%	0,30%
9 SEPLAG	2	1	1		0	2.317.264,86	0	115.863,24	2.201.401,62	5,00%	0,02%
10 SRH	9	10	8		2	572.917.623,19	163.644.721,42	62.195.495,56	674.080.761,75	8,44%	9,95%
11 TCE	2	3	1		2	2.431.924,95	0	65.720,00	2.366.204,95	2,70%	0,01%
TOTAL	62	65	41	1	23	624.864.202,43	163.644.721,42	85.663.589,25	702.845.334,60	10,86%	10,86%
TOTAL			65			788.508.923,85					

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Na execução dos contratos por setorial foi executado 10,86% do que foi contratado.

V. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Figura 1: Visão Geral dos Subprojetos no Projeto de Segurança Hídrica e Governança.



Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que iria passar por todas as setoriais envolvidas nas assistências técnicas assinalado alguns projetos que merecem acompanhamento mais próximo.

1. Componente I – Aumento da Segurança Hídrica

Figura 2: SRH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 1: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – SRH.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos nº 07, 08 e 09/2022. Concluído Financeiramente, mas em execução física.
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - Concluído.
5	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Termo de Referência ajustado e Estimativa de Custo remetidos para análise prévia do Banco em 01/03/23.
6	Consultoria Individual	Consultoria Técnica Especializada (pessoa física) para realizar Curso de Capacitação na Análise e Elaboração de Laudos de Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais, com ênfase no Marco da Política de Reassentamento Involuntário (MRI).	Termo de Referência, Estimativa de Custo e Justificativa remetidos para Não Objeção do Banco Mundial.
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. <i>Há Indicador associado</i>	1º Consultor: Contrato Revogado. 2º Consultor: 01/PSHG/SRH/CE/2023 - Contrato assinado.
8	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA
9	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/SRH/CE/2020 em Execução - RONEI VIEIRA DE CARVALHO

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – No caso da SRH, com relação aos principais contratos dentro do Acordo de Empréstimo, os itens 1 e 2, de uma forma geral tem-se enfrentado grandes desafios na execução desses contratos, o que se acredita que será o principal tema nas discussões da Missão de Meio Termo devido aos atrasos em suas respectivas execuções. O subprojeto “Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC)”, teve documentação enviada para o Banco Mundial em 1/3/2023. É um projeto que está vinculado ao cumprimento de uma cláusula do Acordo de Empréstimo e que além de entregar o Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central ao final do Acordo, deve-se entregar também essa proposição de modelo de como isso irá funcionar para o estado do Ceará. Sendo assim, aguarda-se resposta nos próximos dias.

Figura 3: COGERH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 2: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – COGERH.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da Macromedição da COGERH. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 014, 015 e 016/2021/COGERH. Concluído Financeiramente, mas em execução física.
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH - Concluído .
3	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão. <i>Há Indicador associado</i>	Pregão realizado. Processo encontra-se no jurídico para elaboração do Contrato com posterior assinatura entre as partes.
4	Consultoria	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 066/2022/COGERH em execução - CONSÓRCIO HYDROS / REGEA / IRRIGART .
5	Bens	Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1– Equipamentos de TI: Concluído ; 2 – Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH. Concluído Financeiramente, mas em execução física; e 3 – Aquisição de TI (Workstation): COGERH elaborando as Especificações Técnicas e Mapa de Preços.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 072/2022/COGERH em execução - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Em relação ao subprojeto ‘Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão’ o processo licitatório demorou, pois o pregão teve alguns recursos. Indagou aos representantes da COGERH sobre a assinatura do contrato tanto pela COGERH quanto pelo Consórcio.

Paulo Miranda (COGERH) – O contrato já foi assinado e foi realizada reunião com a empresa para melhorar os entendimentos, o que ficou acertado, que no dia 13/03 será emitida a ordem de serviço para iniciar as atividades. A empresa pediu um prazo para realizar as visitas nos locais que

pretende iniciar antes da emissão da ordem de serviço e já apresentou inclusive um cronograma físico para ser aprovado.

Sarah Freire (COGERH) – Comentou sobre o subprojeto ‘Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará, que há indicador associado. Relatou a dificuldade para conseguir efetivar o primeiro pagamento das medições. Agradeceu a ajuda da UGP/IPECE junto à SRH. O processo de pagamento da sub-rogação foi encaminhado em dezembro de 2022 para a SRH e até a presente data não conseguiu executar o pagamento. Destacou a preocupação com essa situação, com receio da empresa acionar a multa e como seria esse pagamento da multa pelo atraso do contrato.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – O contato com a SEFAZ e a SRH foi feito para discutir sobre o entrave para a realização do pagamento. A informação que se tem é que o sistema está passando por ajustes. A SEFAZ entrará em contato especificamente com o técnico que está tentando realizar o pagamento no sistema e espera-se que seja resolvido o problema.

Marcilio Caetano (COGERH) – Apesar das dificuldades com o pagamento, a execução do ponto de vista operacional de acompanhamento do projeto está muito boa. Se o pagamento do primeiro relatório tivesse ocorrido, a comissão estaria aprovando o terceiro relatório. A empresa não interrompeu suas atividades, continuam executando o trabalho conforme o esperado e inclusive superando as expectativas.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Em relação as dificuldades para os empenhos e pagamentos, no geral, a SEFAZ ainda não definiu como será o fluxo. Os casos estão sendo resolvidos, pontualmente, como por exemplo, o que aconteceu com a FUNCEME, a CGE e o IPECE. A UGP fica sempre intermediando, com o intuito de resolver da melhor forma possível. No caso do pagamento específico da SRH, que foi uma sub-rogação de um Projeto da COGERH. Destacou que haverá outro que será sub-rogado, os serviços de instalação dos medidores. É importante informar que foi alinhado com a CGE um fluxo de sub-rogação com o objetivo de reduzir o tempo para a formalização do instrumento, já que existe também o atraso no cadastro. O fluxo foi validado com a CGE para padronizar as sub-rogações e será disponibilizado com COGERH, SRH, CAGECE e SCIDADES, para as próximas sub-rogações.

Sarah Freire (COGERH) – A entrega deste subprojeto das doze Bacias é vinculada a indicador e atrasos no cronograma de pagamento podem levar a atraso nas entregas, com isso pode haver a necessidade de fazer aditivo de prazo. Sobre o subprojeto ‘Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas), a ordem de serviço ainda não foi emitida, porque estava faltando designar os membros da comissão de análise técnica, a comissão mista.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Houve um alinhamento sobre indicar um técnico da SRH para compor esta comissão conforme já mencionado, mas ainda não ocorreu essa indicação.

Itamara Menezes (COGERH) – Verificou acerca do processo solicitando indicação, que foi encaminhado em dezembro de 2022 para a SRH. O responsável pelo processo entrará em contato com o Secretário da SRH para que seja respondido via processo.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Como já existe o nome do técnico ficam faltando os trâmites formais para essa indicação e conseguir nomear os membros desta comissão.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Em relação ao subprojeto ‘Aquisição de equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos’, subitem 3, a última informação que se tem é que a especificação estava sendo elaborada, assim como o mapa de preços.

Anthony Maia (COGERH) – Já foi elaborado o Termo de Referência e estão esperando o último orçamento das empresas para fechar o mapa comparativo de preços, após isso será remetido para a análise e emissão da anuência da UGP e seguir com os trâmites, o processo também será enviado para análise da COGET/ETICE.

Figura 4: FUNCEME.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 3: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – FUNCEME.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos para instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	Contratos: 04/2021, 05/2021, 06/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 Concluídos.
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 - Concluído.
3	Serviços	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	Homologação e Adjudicação publicadas no dia 23/02. FUNCEME elaborando o contrato.
4	Serviços	Contratação de empresa para realização de serviço de laboratório para análises físico-químicas e biológicas em amostras de água bruta de corpos hídricos superficiais. Localizados no Ceará.	Processo em análise na PGE após um dos Fornecedores entrar com recurso.
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado Do Ceará.	Contrato nº 07/2022 - JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ. Aguardando a emissão da Ordem de Serviço.
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato nº 08/2021 em Concluído Financeiramente, mas em execução física.
7	Serviços	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	Contrato nº 16/2021 Concluído.
8	Bens	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda X.	Minuta da Especificação Técnica em ajustes na FUNCEME.
9	Bens	Aquisição de Drones.	Parecer de Julgamento validado pela UGP para todos os itens. Aguardando homologação dos itens pela PGE.
10	Consultoria	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	Contrato nº 14/2021 em execução - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM.
11	Bens	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Contratos Nº 17/2022 Concluído Financeiramente, mas em execução física. Nº 19/2022 em Execução - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluentes aos principais reservatórios do Estado. Há Indicador associado	FUNCEME analisando as Propostas após reunião com a UGP o dia 27/02.
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em execução - MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Os acompanhamentos estão atualizados conforme reunião realizada com a equipe da FUNCEME. Questionou sobre o item 3, destacado.

Hoilton Rios (FUNCEME) – O contrato foi elaborado e irão proceder com a assinatura. Salientou que, como parte dos equipamentos serão instalados em seções de rios, que neste período chuvoso encontram-se com relativa quantidade de água correndo, poderá haver uma dificuldade maior na implantação dos equipamentos. Será realizada uma reunião com a empresa para definir a data de assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.

2. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Figura 5: CAGECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 4: Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água – CAGECE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <i>Há Indicador associado</i>	Aviso de Resultado Final de Licitação publicado pela PGE no dia 06/02/2023. CAGECE providenciando a Homologação e Adjudicação e posterior elaboração do Contrato.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i>	Aviso de Resultado Final de Licitação publicado pela PGE no dia 10/02/2023. CAGECE providenciando a Homologação e Adjudicação e posterior elaboração do Contrato.
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Contrato nº 145/2022 em execução - INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA.
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 201/2021 em execução - QUANTUM DO BRASIL LTDA.
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	Em Fase de Negociação Contratual (2ª Colocada): Documentação negociada (minuta do contrato e atas negociadas) remetidas para análise do Banco em 03/02/2023. Proposta selecionada no montante de R\$ 980.816,00.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Os itens 1 e 2 representam os principais projetos da CAGECE, e chegaram praticamente ao mesmo tempo nos resultados finais das licitações. Próximo passo é formalizar os contratos. Ocorreram reuniões com todos os consórcios, referentes as documentações necessárias que antecedem as assinaturas dos contratos com a participação de gestores. A UGP irá remeter as minutas das Cartas de Aceite e de contrato. Referente ao item 2, a CAGECE informou que recebeu, recentemente, a formação do consórcio constituído na Junta Comercial. Com isso já se consegue prosseguir com a assinatura do contrato. Primeiro fazer o Aviso de Adjudicação, publicar no site da CAGECE e em seguida efetivamente assinar o contrato e começar o serviço do Apoio Técnico Operacional antes dos contratos dos DMC's.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Em relação ao subprojeto “Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE”, tendo em vista o valor da proposta vencedora ter ficado quase 25% acima do valor estimado, foi remetida toda documentação negociada para uma análise prévia do Banco Mundial, no início do mês de fevereiro e ainda não houve retorno até a presente data. Tão logo a UGP receba a validação, encaminhará para a CAGECE para dar prosseguimento.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Os contratos dos itens 2 e 5 serão sub-rogados à SCIDADES, por se tratar de consultorias.

Abigail Lino (CAGECE) – Como foi dada a instrução que tinha ajustado e otimizado o fluxo, a CAGECE irá encaixar nesse procedimento.

3. Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público

Figura 6: ARCE.



03 CONSULTORIAS

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 5: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – ARCE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	UGP remeteu a minuta do contrato em 10/02/23 para análise e complementações por parte da equipe da ARCE, incluindo setor jurídico.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Contrato nº 04/ARCE/2023 em execução - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. Ordem de Serviços emitida em 16/02/23.
3	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	Termo de Referência e Estimativa de Custo em análise na UGP desde 24/02/23.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Em relação ao subprojeto “Elaboração de Manual de Controle Patrimonial”, a minuta de contrato já foi validada entre a UGP e a área técnica e foi enviada para o setor jurídico da ARCE para uma última análise antes de ser enviada para validação e assinatura da empresa. Perguntou aos representantes da ARCE qual a expectativa de retorno para que seja remetida a minuta de contrato para a empresa e conseguir dar seguimento ao processo.

Danielle Pinto (ARCE) – Em contato com o coordenador do projeto, o mesmo ratificou que o processo continua em análise na Procuradoria Jurídica, mas não se tem uma data exata para a finalização da análise.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Em relação ao subprojeto “Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico” a UGP recebeu o Termo de Referência e a estimativa de custos e esperamos dar retorno referente a análise até o dia 7 de março de 2023, no máximo.

Figura 7: IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 6: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – IPECE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. - <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 08/2022 em execução - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Contrato nº 10/2022 em execução - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.
3	Serviço	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado 1 – 2 – 3</i>	IPECE irá elaborar o Parecer de Julgamento após a publicação da nova comissão.
4	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 07/2020, 09/2020 e 02/2021 em execução .
5	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1. Contratos nº 13/2022 - FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA , nº 14/2022 - SPENCER COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA , nº 16/2022 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e 17/2022 - TORINO INFORMÁTICA em execução .

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Em relação ao subprojeto ‘Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.’ aguarda-se apenas a portaria designando a comissão, para realizar o parecer referente ao Pregão Eletrônico, mas foi assinada, pelo Diretor Geral e encaminhada para publicação. Informou que irá passar a minuta com o parecer para ser ajustada pela comissão e depois enviada para a PGE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Em relação aos outros projetos que não estão selecionados, por se tratar de projetos do IPECE com outras secretarias, a comissão era composta por servidores comissionados que foram exonerados. Aguarda-se as portarias com os nomes dos novos comissionados ou novos servidores que comporão a comissão, haverá um pequeno atraso.

Figura 8: SEDET/FUNCEME – SEDET/IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 7: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEDET.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SEDET/IPECE	Contrato nº 12/2022 em execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
2	Consultoria	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SEDET/FUNCEME	Contrato nº 12/2022 em execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
3	Consultoria	Contratação de Consultoria Internacional (Fundação) para Orientação e Acompanhamento de Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)". SEDET/FUNCEME	Estão sendo realizadas reuniões com as equipes da FUNCEME e da SEDET para ajustes no escopo, objeto e método de aquisição.
4	Consultoria Individual	Contratação de Consultores Individuais para Apoio na Implantação da Metodologia "Surface Renewal (SR)". SEDET/FUNCEME.	
5	Bens	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SEDET/FUNCEME	Contrato nº 06/2020 Concluído .

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Em relação aos itens 3 e 4 destacados, seria importante alinhar depois as questões, em relação a contratação da fundação internacional.

Figura 9: SCIDADES.



02 CONSULTORIAS

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 8: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SCIDADES.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	UGP remeteu a minuta do Edital de SDP em 19/12/22 para análise e complementações por parte da equipe da SCIDADES. Previsão de envio para anuência da UGP?
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Contrato nº 20/2022 em execução - WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO .

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Em relação ao subprojeto “Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos”, desde dezembro foi encaminhada a minuta da SDP. A SDP será o edital que se pretende lançar para as empresas que serão selecionadas para compor a Lista Curta. Sabe-se que o período de final de ano foi bastante atribulado, mas necessita-se saber a previsão de envio deste documento. Solicitou que a SCIDADES comente um pouco sobre o contrato referente ao subprojeto do consultor jurídico individual. Mostrou preocupação sobre o prazo de vigência do contrato que foi todo pensado com base na execução de produtos que estão com os prazos previamente definidos. Informou que sempre que um produto for atrasando acontece o efeito cascata, e que é preciso pensar em aditivos de prazo. Caso seja necessário, a UGP se coloca à disposição para conversar com a equipe da SCIDADES e traçar uma estratégia para que os prazos sejam cumpridos.

Marcos Cals (SCIDADES) – Em relação ao processo do consultor jurídico individual foram realizadas reuniões com a equipe da ARCE e da SCIDADES.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Sugeriu uma reunião para atualizar os status desses dois projetos.

Carla Escóssia (SCIDADES) – O consultor jurídico individual entregou o primeiro produto, e já foi encaminhado para o IPECE, qual seja o relatório sobre o que iria modificar dentro da secretaria e está sendo feito o processo de pagamento para esse produto. Informou também quanto à modificação da 162, está faltando a última reunião, e quanto a SDA, houve alguns entraves como férias e nomeações que já estão sendo resolvidos na SCIDADES.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Quanto ao conteúdo da SDP, qualquer dúvida, a UGP está à disposição e ficamos aguardando esse documento.

Figura 10: CGE.



01 CONSULTORIA

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 9: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – CGE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/2022 em execução - CONSÓRCIO CONFIDERE E CANIX.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – O contrato foi assinado há quase um ano e a empresa está executando bem, conforme informações da CGE, mas com um pouco de atraso nas entregas dos produtos.

Marcos Almeida (CGE) – A empresa está trabalhando no produto 3.1 e começou de fato o desenvolvimento da plataforma. Serão realizadas reuniões para tratar do detalhamento do produto 3.2 e estão sendo trabalhados praticamente nos dois produtos em paralelo. Encerrou a atividade 2 para ir para a atividade 3 que seria a etapa dos requisitos iniciais de forma macro e agora está sendo trabalhado o desenvolvimento da plataforma e ao mesmo tempo que detalha esses requisitos, abordando essa metodologia incremental. Tem-se um pequeno atraso, porque nessa etapa de requisitos iniciais seria uma etapa que se precisava também ter uma interação com as outras setoriais e houve algumas dificuldades de agenda também, por conta dessa transição entre o final do ano passado e o início desse ano. Foi conversado com a empresa uma forma de compensar esse atraso no final, pois a última etapa será uma atividade de treinamentos. Informou também que foi observado uma forma de poder realizar alguns treinamentos em paralelo e espera-se que não haja prejuízo ao prazo total do projeto.

Figura 11: SEPLAG.



01 CONSULTORIA 01 BEM

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 10: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEPLAG.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. Há Indicador associado	Contrato nº 018/2022 em execução - CONSÓRIO MTC: MACROPLAN / TRANSPLAN / J C M Freitas —serviços de Informática (CHERRY IT) .
2	Bens	Aquisição de mobiliário de equipamentos de TIC para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	1)Aquisição de Equipamentos de TI: Contrato remetido para assinatura da empresa; 2) Aquisição de Mobiliário: Processo na PGE para análise e posterior publicação do Pregão; e 3)Aquisição de equipamentos: SEPLAG instruindo o processo para posterior envio a PGE após Anuência da UGP.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Informou que o acompanhamento está sendo realizado com os representantes da SEPLAG.

Figura 12: TCE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 11: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – TCE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras de infraestrutura hídrica.	Contratos nº 35 e 36/2021. Concluído Financeiramente, mas em execução física.
2	Bens	Aquisições de Equipamentos para desenvolver solução de monitoramento de obras de engenharia que consiste na elaboração de uma base analítica composta de mecanismo de coleta de dados e painéis de monitoramento de obras de engenharia por meio da tecnologia de Business Intelligence e aplicação de modelos de Machine Learning. Há Indicador associado	Contrato nº 44/2022 em execução - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Os contratos estão em execução, o primeiro concluído e o segundo foi assinado e em execução atualmente.

VI. INDICADORES

- Indicadores PDO.

Quadro 12: Indicadores PDO – **SRH** e **COGERH** – Nome do Indicador (1): Percentagem de Usuários Estratégicos da Água Regularizados - COGERH.

Subprojeto associado: Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato em Execução (Contrato nº 066/2022/COGERH)	
Observação: Entregue o Produto 1 - Plano de ação e levantamento dos usos de recursos hídricos.	
Produzida Nota Técnica com definições de “Usuários Estratégicos” e “Regularizados” e estratégias do Estado para o alcance da meta de 80% dos usuários regularizados.	
Metas	Prazo
Meta: 80	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 13: Indicadores PDO – **SRH** e **CAGECE** – Nome do Indicador (2): Continuidade dos Sistemas Hídricos Abastecidos com Água do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central – CAGECE.

Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: 70	
Status: Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH)	
Observação: Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022.	
Metas	Prazo
Meta: 90	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 14: Indicadores PDO – **CAGECE** – Nome do Indicador (5): Redução da Água Não Geradora de Receita na Cidade de Fortaleza (litros/conexões/dia) (número) – CAGECE.

Subprojeto associado: Controle e Redução de Perdas	
Linha de base: 469	
Status: Aviso de Resultado Final de Licitação publicado pela PGE no dia 06/02/2023.	
Observação:	
Metas	Prazo
Meta: 317	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 15: Indicadores PDO – **IPECE** – Nome do Indicador (3): Pessoas Beneficiadas com Serviços Hídricos mais Confiáveis – CAGECE.

Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH)	
Observação: Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022.	
Metas	Prazo
Meta: 118.490	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 16: Indicadores PDO – **IPECE** – Nome do Indicador (4): Mulheres beneficiadas com Serviços Hídricos mais Confiáveis – IPECE.

Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central	
Linha de base: 0	
Status: Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH)	
Observação: Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022.	
Metas	Prazo
Meta: 61.615	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

- Indicadores Intermediários – Componente I: Aumento da Segurança Hídrica.

Quadro 17: Indicadores de Resultado Intermediário – **FUNCEME** – Nome do Indicador (6): Sistema de Previsão Climática Fortalecido – FUNCEME.

Subprojeto associado: Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúências aos principais reservatórios do Estado.	
Linha de base: Sistema de Previsão Climática baseado em um modelo climático global, atualizado mensalmente.	
Status: FUNCEME analisando as Propostas após reunião com a UGP o dia 27/02.	
Observação: Meta intermediária 01 atingida. Enquanto não é possível apresentar as previsões de aflúências em periodicidade quinzenal, estas vêm sendo apresentadas em periodicidade mensal, com divulgação restritas aos órgãos do setor de recursos hídricos, pela natureza sensível da informação e por se tratar de um projeto em maturação.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.	15/06/2021
Meta Final: Informações geradas pelo Sistema de Previsão Climática sendo usadas para calcular a aflúência da água para reservatórios estratégicos.	15/06/2022

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 18: Indicadores de Resultado Intermediário – **SRH e COGERH** – Nome do Indicador (7): Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição – COGERH.

Subprojetos associados: 1. Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH; 2. Serviços de instalação das Estações de Medição Fixas.	
Linha de base: 7	
Status: 1. Executado e entregue as Estações de Medição Fixas; 2. Pregão realizado. Processo encontra-se no jurídico para elaboração do Contrato com posterior assinatura entre as partes.	
Observação: Produzida nota técnica apresentando a política de medição da COGERH - Previsão da Meta ser superada em setembro de 2024.	
Medição atual: 20,0%	
Metas	Prazo
Meta final: 75	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 19: Indicadores de Resultado Intermediário – **SRH e COGERH** – Nome do Indicador (8): Maior capacidade de tratamento da água na região do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central - SRH/CAGECE.

Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH)	
Observação: EVA elaborado e aprovado.	
Capacidade refere-se às estações de tratamento de água da CAGECE nos municípios de Senador Pompeu (110 m³/h), Piquet Carneiro (110 m³/h), Mombaça (220 m³/h) e Jaguaratama (110 m³/h)	
Metas	Prazo
Meta: 1.900 m³/h	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 20: Indicadores de Resultado Intermediário – **IPECE, SRH e CAGECE** – Nome do Indicador (9): Redução do tempo perdido de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água - IPECE, SRH e CAGECE.

Subprojeto associado: 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central; 2. Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: "Para mulheres - 3,48 dias / ano Para homens - 3,15 dias / ano"	
Status: 1. Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH); 2. IPECE irá elaborar o Parecer de Julgamento após a publicação da nova comissão.	
Observação: 1. EVA elaborado e aprovado; 2. Em licitação empresa visando realizar uma pesquisa domiciliar de linha de base utilizando amostragem probabilística para coleta dos dados. Haverá uma nova contratação em 2025 para realização da pesquisa de seguimento. Foi proposta pelo BM a realização de uma outra pesquisa a ser realizada pela Empreiteira exclusiva com a população que irá receber as palestras sobre a temática de gênero, para captar a percepção dessa população antes e depois das palestras.	
Metas	Prazo
Meta: Redução da diferença em 20%	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 21: Indicadores de Resultado Intermediário – **IPECE, SRH e CAGECE** – Nome do Indicador (10): Redução do tempo dedicado a tarefas domésticas (incluindo a busca de água para o domicílio) - IPECE, SRH e CAGECE.

Subprojeto associado: 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central; 2. Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do sistema adutor Banabuiú:	
Linha de base: "Para mulheres- 18,1 horas/semana Para homens – 10,5 horas/semana"	
Status: 1. Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH); 2. IPECE irá elaborar o Parecer de Julgamento após a publicação da nova comissão.	
Observação: 1. EVA elaborado e aprovado; 2. Em licitação empresa visando realizar uma pesquisa domiciliar de linha de base utilizando amostragem probabilística para coleta dos dados. Haverá uma nova contratação em 2025 para realização da pesquisa de seguimento. Foi proposta pelo BM a realização de uma outra pesquisa a ser realizada pela Empreiteira exclusiva com a população que irá receber as palestras sobre a temática de gênero, para captar a percepção dessa população antes e depois das palestras.	
Metas	Prazo
Meta: Redução da diferença em 10%	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 22: Indicadores de Resultado Intermediário – **IPECE, SRH e CAGECE** – Nome do Indicador (11): Nível de satisfação dos beneficiários com o fornecimento de serviços hídricos - IPECE, SRH, CAGECE.

Subprojeto associado: 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central; 2. Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do sistema adutor Banabuiú:	
Linha de base: 0	
Status: 1. Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH); 2. IPECE irá elaborar o Parecer de Julgamento após a publicação da nova comissão.	
Observação: 1. EVA elaborado e aprovado; 2. Em licitação empresa visando realizar uma pesquisa domiciliar de linha de base utilizando amostragem probabilística para coleta dos dados. Haverá uma nova contratação em 2025 para realização da pesquisa de seguimento. Foi proposta pelo BM a realização de uma outra pesquisa a ser realizada pela Empreiteira exclusiva com a população que irá receber as palestras sobre a temática de gênero, para captar a percepção dessa população antes e depois das palestras.	
Metas	Prazo
Meta: 90%	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 23: Indicadores de Resultado Intermediário – **CGE** – Nome do Indicador (12): Queixas e consultas recebidas através do Mecanismo de Reparação de Queixas registradas e solucionadas – OUIDORIA GERAL/ UGP/ SRH/ CAGECE.

Subprojeto associado:	
1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central;	
2. Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	
Linha de base: 0	
Status:	
1. Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH); e	
2. Aviso de Resultado Final de Licitação publicado pela PGE no dia 06/02/2023.	
Observação:	
1. EVA elaborado e aprovado;	
2. Inseridos assuntos e sub assuntos específicos das ações do IPF na “Plataforma Ceará Transparente”; Reunião com equipes da Empreiteira, Engenheiro, SRH, CAGECE e UGP para apresentação e treinamento da Plataforma Ceará Transparente e discussões sobre o fluxo de informações do Mecanismo de Reparação de Queixas constante no MGSA.	
Metas	Prazo
Meta Final: 90	30/06/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 24: Indicadores de Resultado Intermediário – **SRH e COGERH** – Nome do Indicador (8): Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.

Subprojetos associados:	
1. Pannel de especialistas em segurança de barragens;	
2. Planos de Segurança das Barragens;	
3. Base de dados para armazenamento de dados com Alertas Automatizados;	
4. Obras de Reabilitação do Banabuiú: Em execução pelo DNOCS.	
Linha de base: Nenhuma atividade implementada.	
Observação:	
1. Entregues os seguintes produtos:	
1.1. Plano de Trabalho detalhado;	
1.2. Análise dos estudos e documentos;	
1.3. Visita às Barragens (Visita 1);	
1.4. Orientação e análise dos Termos de Referência dos Planos de Segurança das Barragens relacionadas ao projeto;	
1.5. Orientação sobre termos de referência para contratação e execução dos estudos e obras complementares das barragens; existentes em processo de contratação direta novo consultor (Engenheiro Geotécnico);	
2. Contrato assinado aguardando ordem de serviço;	
3. Contrato foi elaborado e enviado para a empresa para assinatura	
4. Obras de Reabilitação do Banabuiú: Em execução pelo DNOCS - (RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO Nº 09):	
a) Construção (Consórcio Conpate/Britânia): 69,24%% do total contratual até 31/12/2022	
b) Gerenciamento e Supervisão técnica (GEOTECHNIQUE): 100% do total contratual até 31/12/2022	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Pannel de especialistas em segurança de barragens contratado.	31/dez/20
Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida.	31/dez/21
Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Ação para Emergência - PAE). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados.	30/dez/22
Meta Intermediária 04: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú finalizados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Ação para Emergências - PAE). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas.	29/dez/23
Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas.	31/dez/24

Fonte: UGP/IPECE.

- Indicadores Intermediários – Componente II: Melhoria da eficiência dos Serviços de Água.

Quadro 25: Indicadores de Resultado Intermediário – **CAGECE** – Nome do Indicador (14): Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza – CAGECE.

Subprojeto associado:	
1. Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)	
2. Supervisora da Obra - ATO	
Linha de base: 0	
Status:	
1. Aviso de Resultado Final de Licitação publicado pela PGE no dia 06/02/2023;	
2. Aviso de Resultado Final de Licitação publicado pela PGE no dia 10/02/2023. CAGECE providenciando a Homologação e Adjudicação e posterior elaboração do Contrato.	
Observação:	
Metas revisadas pela CAGECE de acordo com Nota Técnica em 29/09/2022:	
Meta intermediária 1: julho de 2023;	
Meta intermediária 2: setembro de 2024;	
Meta final: maio de 2025.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: 9	31/12/2021
Meta Intermediária 02: 18	30/12/2022
Meta final: 44	31/12/2023

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 26: Indicadores de Resultado Intermediário – **CAGECE** – Nome do Indicador (15): Proposta de revisão da estrutura tarifária para serviços hídricos finalizada, aprovada pelo Conselho Administrativo e apresentada às agências reguladoras - CAGECE/ GECOR.

Subprojeto associado:	
1. Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	
Linha de base: Estrutura tarifária não revisada.	
Status: 1. Contrato em execução (Contrato nº 201/2021 - CAGECE).	
Observação: Empresa Quantum entregou os seguintes produtos:	
1. Plano de trabalho e Relatório nº 1 (R1) - Diagnóstico da Companhia de Água e Esgoto do Ceará e realização de workshop;	
2. Relatório nº 2 (R2) - Estudo de mercado e realização de workshops. Previsão de conclusão do Contrato para janeiro de 2023;	
3. Relatório nº 3.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.	31/12/2020
Meta Intermediária 02: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.	30/12/2022
Meta Intermediária 03: Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.	30/06/2023
Meta final: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.	28/06/2024

Fonte: UGP/IPECE.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou sobre a missão do Banco de Revisão de Meio Termo do Projeto que ocorrerá em maio do corrente ano e que os indicadores do Projeto serão objeto de muita atenção na referida Missão. Como exemplo, foi solicitada a análise e leitura das principais informações acerca do indicador “Proposta de revisão da estrutura tarifária para serviços hídricos finalizada, aprovada pelo Conselho Administrativo e apresentada às agências reguladoras -

CAGECE/ GECOR. Comentou com a equipe da CAGECE se havia possibilidade de se cumprir com a meta “Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada” antes da Missão e que isso seria excelente para apresentação durante a apresentação do Evento.

Abigail Lino (CAGECE) – Vai ocorrer reunião de avaliação do quarto relatório, que será o último produto. Na Missão do Banco Mundial de novembro de 2022, já tinha sido explicado que seria pedido dilatação de prazo, e que de fato foi solicitado para ajustar. Foi enviada no dia 28 de fevereiro de 2023 para a SCIDADES, a medição referente ao 3º produto. Informou que repassará para a equipe esses prazos, como também sobre essa Missão de Meio Termo do Banco Mundial para ver o que pode ser cumprido de cronograma para tentar fechar.

Wagner Rios (UPG/IPECE) – Questionou se a diretoria acompanha o progresso do Projeto.

Abigail Lino (CAGECE) – A diretoria tem sido reportada sim, pela equipe que está conduzindo e irá passar essas questões para eles sobre a necessidade de que precisa que esse indicador seja aprovado pela diretoria e que no meio desse ano teremos a Missão do Banco Mundial de meio termo.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que a apresentação exibida nesta reunião estará disponível no site do IPECE e que nela constam todas as informações atualizadas sobre os parâmetros dos Indicadores do Projeto. Tais informações ainda deverão sofrer novas atualizações até a data de referência da Missão do Banco e que, sobretudo, será importante que as Setoriais, juntamente com a equipe da UGP, deverão montar uma estratégia ótima a ser apresentada à Equipe do Banco quanto ao cumprimento das metas dos indicadores que ainda não foram atingidas. Se tratando especificamente do indicador da revisão de estrutura tarifária que deve estar concluída até junho de 2023 ficando bem perto da Missão do Banco e que se conseguíssemos nessa consultoria e aprovar seria excelente para apresentar ao Banco.

Abigail Lino (CAGECE) – Comentou que irão fazer o possível para cumprir e a intenção já era ter terminado desde o final do ano passado, mas foi preciso um prazo adicional e tentarão cumprir dentro do prazo solicitado. O prazo adicional vai até abril.

- Indicadores Intermediários – Componente III: Fortalecimento da Gestão do Setor Público.

Quadro 27: Indicadores de Resultado Intermediário – **SEPLAG** – Nome do Indicador (16): Sistema de Gestão de Investimentos Públicos Implementado e em Operação – SEPLAG.

Subprojeto associado: 1. Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará; e 2. Aquisição de mobiliário e equipamentos de TIC para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	
Linha de base: Nenhum sistema	
Status: 1. Contrato em execução (Contrato nº 018/2022 – SEPLAG); 2. Aquisição de Equipamentos de TI: Contrato remetido para assinatura da empresa; Aquisição de Mobiliário: Processo na PGE para análise e posterior publicação do Pregão; e Aquisição de equipamentos: SEPLAG instruindo o processo para posterior envio a PGE após Anuência da UGP.	
Observação: 1. Entregues os seguintes produtos: Plano de Gerenciamento do Projeto (Produto 01 - atividade 01); Plano de Revisão da Metodologia (Produto 01 - atividade 02); SEPLAG revisou (envio de e-mail) os prazos para cumprimento das metas tal como segue: i. Meta Intermediária 01: Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários - 01/2024 ii. Meta Intermediária 02: 10% dos novos projetos da SDA analisados através do sistema - 12/2024; iii. Meta final: 20% dos novos projetos de recursos hídricos analisados através do sistema - 12/2025; Somente após a entrega o Produto 2.3. Documentação da Metodologia Revisada, prevista para a última semana de março de 2023, em versão preliminar, serão feitos os contatos com a DAS.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.	30/12/2022
Meta Intermediária 02: 10% dos novos projetos da SDA analisados através do sistema.	31/12/2024
Meta final: 20% dos novos projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.	31/12/2025

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 28: Indicadores de Resultado Intermediário – **TCE** – Nome do Indicador (17): Percentagem de Obras Públicas Monitoradas.

Subprojeto associado: 1. Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais; 2. Aquisição de mobiliário de equipamentos de TIC para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	
Linha de base: 0	
Status: 1. TCE desenvolvendo o sistema com recursos próprios; e 2. Contrato nº 018/2022 em Execução.	
Observação: 1. Em desenvolvimento 2º Produto do sistema (Estruturar procedimentos e levantamento de informações) conclusão prevista para 02/2023; Previsão de conclusão do sistema para 08/06/2023 de acordo com Relatório de Andamento enviado pelo TCE.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.	30/06/2023
Meta Intermediária 02: 70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.	28/06/2024
Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.	30/06/2025

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 29: Indicadores de Resultado Intermediário – **ARCE** – Nome do Indicador (18): Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada.

Subprojeto associado: 1. Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	
Linha de base: 0	
Status: UGP remeteu a minuta do contrato em 10/02/23 para análise e complementações por parte da equipe da ARCE, incluindo setor jurídico.	
Observação:	
Metas	Prazo
Meta Final: 1	30/06/2023

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 30: Indicadores de Resultado Intermediário – **IPECE** – Nome do Indicador (20): Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico para o desenho de políticas nos setores hídrico e de agronegócios, através de pesquisa mediante demanda.

Subprojeto associado: 1. Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB; 2. Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água; 3. Estudo inter- e intra-setorial de demanda utilizando o modelo de entrada e saída (input output).	
Linha de base: Nenhum índice	
Status: 1. Contrato em execução (Contrato nº 018/2022 – IPECE).	
Observação: 1. Entregue o primeiro Produto (Relatório Parcial 1.1) A Publicação dos estudos 1 e 2 está condicionada a atualização de Matriz Insumo-Produto do Ceará e das Contas Satélites do Agronegócio e da Agricultura Familiar, ambas contempladas na Consultoria Metodológica do Cálculo do PIB do agronegócio. Prazos das metas factíveis de acordo com IPECE.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.	30/06/2021
Meta Intermediária 02: Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água finalizado.	29/12/2023
Meta final: Estudo inter- e intra-setorial de demanda utilizando o modelo de entrada e saída (input output) finalizado.	31/12/2024

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 31: Indicadores de Resultado Intermediário – **CGE** – Nome do Indicador (19): Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.

Subprojeto associado: 1. Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	
Linha de base: Nenhum índice	
Status: Contrato em Execução (Contrato nº 07/2022 – IPECE).	
Observação: 1. Foram entregues os seguintes Produtos: Produto 1.1- Plano de Trabalho do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Governo do Estado do Ceará elaborado, contendo a metodologia, as etapas, as fases, prazos e responsáveis para o desenvolvimento e implementação; Produto 2.1 - Pesquisa, explorando o contexto do problema e utilizando instrumentos adequados de coleta de dados, como exemplo, entrevistas, oficinas e trabalhos de campo; Produto 2.2 - Mapeamento inicial dos processos críticos relacionados ao funcionamento do Sistema Produto 2.3 - Padrão inicial de interfaces do Sistema Produto 2.3 - Padrão inicial de interfaces do Sistema A partir da entrega do mapeamento das funcionalidades do sistema (2º produto) serão iniciados debates entre as equipes da CGE e Consultora para produção da Metodologia de cálculo (Meta 01).	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Metodologia de cálculo definida incluindo critérios de avaliação a serem estabelecidos pelas instituições que usarão o sistema conjuntamente com a empresa contratada.	30/06/2023
Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema.	30/06/2025

Fonte: UGP/IPECE.

VII. CONTROLE E MONITORAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS

- ✓ Monitoramento do PGS;
- ✓ Monitoramento do PRI;
- ✓ Monitoramento das condicionantes da LI do SAB-SC; e
- ✓ Cumprimento da execução dos programas norteadores.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Durante esse período, desde a última reunião ocorrida em novembro, houve o controle e o monitoramento das salvaguardas ambientais. Com relação a questão do PGS e do PRI da adutora, a UGP está fazendo um monitoramento conjunto com a SRH, verificando as notificações que estão sendo emitidas nos relatórios do Engenheiro. Quando sair a versão final dos documentos, a UGP envia para o Banco Mundial. Sobre a questão do licenciamento do Sistema Adutor, a LI foi emitida com uma série de condicionantes que estão sendo monitoradas, pois elas têm prazo para serem executadas. A UGP está fazendo o monitoramento dessas condicionantes e também o cumprimento da execução dos programas norteadores, que o conjunto dessas atividades são para o cumprimento dos mesmos.

Quadro 32: Monitoramento do PGS.

ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	OBSERVAÇÕES
Elaboração do Plano de Gestão Socioambiental (PGS)	Empreiteira	Engenheiro	SRH / UGP	20/07/2022	Em atraso	4º mês
Análise PGS	Engenheiro	SRH	UGP	04/08/2022	Em atraso	15 dias
Análise PGS	BM	-	-	19/08/2022	Em atraso	15 dias

Fonte: UGP/IPECE.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Em relação a questão do monitoramento do PGS, a elaboração deveria ter sido feita e apresentada até o dia 20 de julho de 2022, portanto é uma atividade que está em atraso. A análise feita conjuntamente entre Engenheiro, SRH e UGP deveria ter sido feita, entregue e aprovada até o dia 4 de agosto de 2022, estando assim também em atraso, e a análise do Banco Mundial que deveria ter sido realizada no dia 19 de agosto de 2022, sendo outra atividade em atraso.

Quadro 33: Monitoramento do PRI.

ATIVIDADES	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO	COORDENAÇÃO	DATA DE TÉRMINO	STATUS	OBSERVAÇÕES
Elaboração do Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) – Setor 1	Empreiteira	Engenheiro	SRH	28/08/2022	Em atraso	5º mês
Análise do Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) – Setor 1	Engenheiro	SRH	UGP	04/09/2022	Em atraso	15 dias
Análise do Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) – Setor 1	BM	-	-	19/09/2022	Em atraso	15 dias

Fonte: UGP/IPECE.

Christina Bianchi (UGP/IPECE) – Sobre o monitoramento do PRI, informou que o mesmo é feito em três setores, ao contrário do PGS, que é para obra inteira. Comentou também sobre a elaboração do Plano de Reassentamento para o setor 1, que deveria ter sido entregue no dia 28 de agosto de 2022, sendo assim uma atividade em atraso. Da mesma forma deveria ter sido analisado conjuntamente pelo Engenheiro, SRH e a UGP. Sua análise deveria ter sido entregue no dia 4 de setembro de 2022 e remetida para a análise do Banco Mundial, que deveria ter sido feita até o dia 19 de setembro de 2022, atividades estas também em atraso. Informou que estamos aguardando as últimas versões para análise e envio do Banco.

VIII. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ IPF

Alice Menezes (UGP/IPECE) – A próxima reunião do Comitê será realizada no dia 27 de abril de 2023.

IX. ENCERRAMENTO

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Finalizou a reunião, agradecendo a disponibilidade e presença de todos.

X. ANEXOS E APÊNDICES

Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança de Janeiro/2020 a Fevereiro/2023

