

ATA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA

Data: 31/08/2023 **Início:** 9h50min **Duração:** 1h15min **Término:** 11h05min **Local:** IPECE

QUADRO DE PRESENÇA			
SETORIAIS	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO UGP /IPF	Alice Helena da Silva Pinto Menezes	Coordenadora da UGP	PRESENTE
	André Morel Gonzaga	Consultor Individual	PRESENTE
	Giuseppe Furtado Nogueira	Consultor Individual	PRESENTE
	Laura Carolina Gonçalves	Técnica	PRESENTE
	Rodrigo José Almeida Rufino	Consultor Individual	PRESENTE
	Thâmara Aragão Teixeira Fernandes	Técnica	PRESENTE
	Deusimar Lira Cavalcante Filho	Consultor Individual	PRESENTE
	Carlos Wagner Rios Pinto	Consultor Individual	PRESENTE
ARCE	Danielle Silva Pinto	Titular	JUSTIFICADO
	Alexandre Caetano da Silva	Suplente	JUSTIFICADO
CAGECE	Abigail Lino de Araújo	Titular	PRESENTE
	Neuma Maria Silva Buarque	Suplente	AUSENTE
	Priscila Alencar Medeiros	Representante	PRESENTE
	Jessyca Costa Barros	Representante	PRESENTE
CGE	Marcos Henrique de Carvalho Almeida	Titular	JUSTIFICADO
	Ítalo José Brígido Coelho	Suplente	JUSTIFICADO
SCIDADES	Raimundo Weber de Araújo	Titular	AUSENTE
	Carla Leite da Escóssia Abreu	Suplente	JUSTIFICADO
	Danielle Araújo	Representante	PRESENTE
COGERH	Denilson Marcelino Fidelis	Titular	PRESENTE
	Sarah Furtado Freire	Suplente	AUSENTE
	Anthony Rafael Soares Maia	Representante	PRESENTE
	Mikaelle Duarte Mariano Feitosa	Representante	PRESENTE
	Paulo Miranda Pereira	Representante	PRESENTE
FUNCEME	Francisco Hoilton Araripe Rios	Titular	JUSTIFICADO
	Meiry Sayuri Sakamoto	Suplente	JUSTIFICADO
IPECE	Cleyber Nascimento de Medeiros	Titular	JUSTIFICADO
	Ana Cristina Lima Maia	Suplente	PRESENTE
SDE	Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima	Titular	AUSENTE
	Hyperides Pereira de Macedo	Suplente	AUSENTE
	Vandemberk Rocha de Oliveira	Representante	PRESENTE
SEPLAG	Francisco Aduino de Oliveira	Titular	AUSENTE
	Marcelo Correia Lima a Rocha	Suplente	AUSENTE
	Karine Machado	Representante	PRESENTE
	Andreia Osterno Silva	Representante	PRESENTE
SRH	Gianni Peixoto Bezerra Lima	Titular	PRESENTE
	-	Representante	-
TCE	Liana Peixoto Brandão Bandeira	Titular	PRESENTE
	Luís Sávio Pires de Braga	Suplente	AUSENTE

I. INTRODUÇÃO

Às 9h50 do dia 31 de agosto de 2023, presencialmente, **Alice Menezes (UGP/IPECE)** agradeceu a participação de todos e iniciou a reunião. Ressaltou se tratar da 20ª Reunião do Comitê IPF. Informou que a reunião estava sendo gravada para elaboração da Ata e apresentou a pauta dos assuntos a serem tratados por meio de arquivo em *Power Point*,¹ conforme pauta abaixo:

1. Aprovação da Ata da 19ª Reunião do Comitê;
2. Informações Importantes;
3. Acordos e Recomendações do Banco Mundial na Missão de Meio Termo;
4. Apresentação do Gerenciamento Financeiro;
5. Apresentação dos Projetos de Assistência Técnica;
6. Indicadores; e
7. Encerramento.

II. APROVAÇÃO DA ATA

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Indagou aos participantes se teriam comentários acerca do conteúdo da Ata da última reunião do Comitê, que foi encaminhada por e-mail no dia 21 de julho de 2023. As considerações recebidas foram incorporadas. A Ata foi aprovada por unanimidade, pois não houve objeções. Informou também que as seguintes setoriais CGE, ARCE e FUNCEME estão ausentes, mas justificaram.

III. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Missão do Banco Mundial:
 - 09 a 11/10/2023: Equipe Socioambiental (discussão dos aspectos ambientais e sociais);
 - 16 a 20/10/2023: Geral;

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Informou que a Missão do Banco Mundial, ocorrerá, no primeiro momento do dia 9 a 11, para tratar dos aspectos ambientais e sociais, e do dia 16 a 20 ocorrerá a Missão geral com todas as setoriais.

- ✓ Dúvidas e entraves favor remeter, preferencialmente, por e-mail (ugp.ipf@ipece.ce.gov.br);

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Informou que devem remeter preferencialmente por e-mail para que a equipe toda da UGP tenha conhecimento.

- ✓ Enviar as Ordens Bancárias dos pagamentos;

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Quando ocorrerem os pagamentos enviar suas ordens bancárias para a UGP.

¹ https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2023/09/Apresentacao_Comite_310823.pdf

- ✓ Enviar Ordem de Serviço/Fornecimento dos contratos;

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Comentou que quando os contratos forem assinados é preciso enviar as ordens de serviços/fornecimento dos contratos.

- ✓ Quaisquer ajustes aos contratos devem ser analisados previamente pela UGP;

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Os representantes que estão no Comitê devem repassar para as equipes técnicas que qualquer ajuste de contrato deve ser obrigatoriamente analisado pela UGP. Tivemos caso nesses últimos meses, onde aditivos simples foram formalizados sem a anuência da UGP. De acordo com o Manual do Acordo de Empréstimos, que é seguido pelo TCE, quando realiza a auditoria, ausência de anuência aos aditivos pode gerar recomendações. É importante a disseminação dessa informação para o jurídico e também para as pessoas que estão na gestão dos contratos.

- ✓ Substituição de Especialistas Principais;

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Sobre as substituições de Especialistas Principais, o Banco é exigente com relação a essa obrigatoriedade e por mais que a grande maioria dos nossos contratos seja do tipo Preço Global, onde o mais importante é realmente a entrega do produto, a participação desses especialistas vai definir normalmente a qualidade daqueles produtos, e então, devemos sempre estar atentos. Estamos sempre à disposição apoiando.

- ✓ Auditoria TCE; e


Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – O TCE atualmente está realizando auditoria nos contratos do ano de 2022 e alguns contratos do ano de 2021. Comentou que todos estejam atentos e se a UGP entrar em contato ou o TCE solicitar documentação complementar, tentemos atender essa demanda o mais breve possível.

- ✓ Evidenciar a realização dos workshops previstos em contratos.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Destacou que os contratos que tem treinamento, workshop, questões de transferência de conhecimento de maneira geral, é muito importante que essas evidências estejam disponíveis: ou nos produtos, ou em um relatório a parte. Por exemplo, um determinado produto que tenha a indicação de um treinamento, não é apenas citar que houve treinamento, a empresa precisa fazer um relatório, colocando as evidências, como exemplo, material didático, comprovando a realização do treinamento, workshop. Comentou que é necessário ter atenção com essas questões e isso é acompanhado pelos órgãos de controle.

IV. ACORDOS E RECOMENDAÇÕES DO BANCO MUNDIAL NA MISSÃO DE MEIO TERMO

Figura 1: Acordos e recomendações do BM na Missão de Meio Termo.

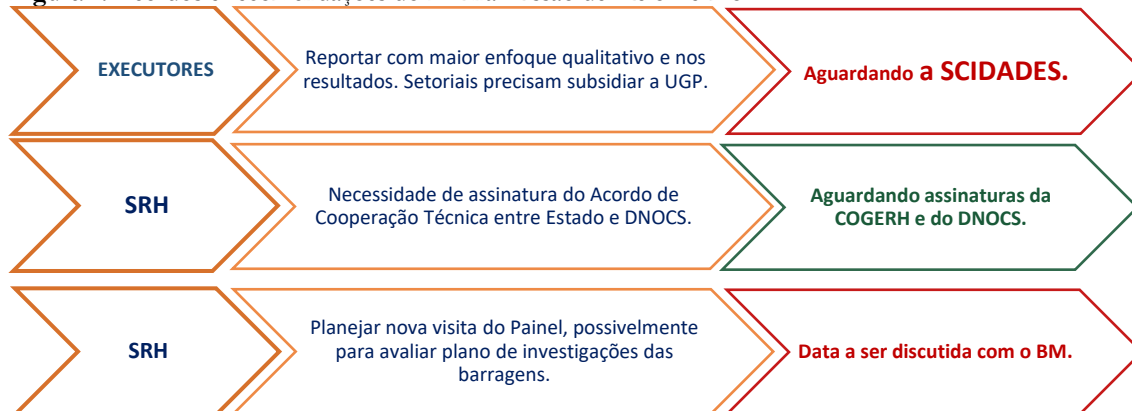

Fonte: UGP/IPECE.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Atualizou acerca dos acordos e recomendações da Missão de Meio Termo, foi elaborado o relatório de meio termo, como é sabido por todos. As setoriais deveriam reportar com maior enfoque qualitativo nos resultados das setoriais para subsidiar a UGP e estamos aguardando as informações da SCIDADES. Para a SRH ficou a recomendação para a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica e já estamos atualizados de que estão aguardando assinatura da COGERH e do DNOCS para posterior publicação e por fim ficou recomendada uma visita do painel para o plano de investigação das barragens e essa data será discutida com o Banco Mundial.

Quadro 1: Acordos e Recomendações do BM na Missão de Meio Termo.

Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Subprojeto	Previsão de Assinatura
1	CAGECE	Obra	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	mai/23
2	CAGECE	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	mai/23
3	ARCE	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	mai/23
4	IPECE	Serviço	Contratação de Empresa Especializada para Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	mai/23
5	FUNCEME	Bens	Cluster para Modernização do Sistema de Previsão Climática e de Afluências aos Principais Reservatórios do Estado.	jun/23
6	SRH	Consultor Individual	Prestação de Serviços de Consultoria (Pessoa Jurídica) para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	jul/23
7	SEPLAG	Bens	Aquisição de Imagem e Som para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	jul/23
8	FUNCEME	Serviço	Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações Linimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará.	ago/23
9	FUNCEME SDE	Consultoria	Contratação de Serviços para Transferência de Conhecimento e Tecnologia com Orientação Técnica Especializada e Treinamento Extensivo na Metodologia Surface Renewal (Fundação).	set/23
10	FUNCEME SDE	Consultor Individual	Gestão de Água e Eficiência Hídrica para Irrigação no Ceará – (Programa Cientista Chefe).	set/23
11	FUNCEME	Bens	Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com instalação e treinamento.	out/23
12	SCIDADES	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	nov/23
13	COGERH	Bens	Aquisição de 11 (onze) Estações Gráficas (Workstation) para Processamento de Nuvem de Pontos.	nov/23
14	ARCE	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	dez/23
15	IPECE	Consultor Individual	Consultoria Individual Analista Administrativa Financeira.	fev/24

Fonte: UGP/IPECE.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Informou que esses projetos foram apresentados com essas datas de previsão de assinatura na última Missão, e os destacados de verde são os que foram contratados. Conforme o que foi projetado, até o mês de julho teríamos que ter contratado o da SRH, a consultoria para o Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC), que posteriormente será contextualizado nessa reunião e a aquisição de bens da SEPLAG. Para o mês de agosto temos a FUNCEME, que conseguiu assinar. Para setembro seriam os dois da FUNCEME com a SDE e mais um da FUNCEME. De novembro em diante temos a expectativa de assinatura de mais quatro contratos.

V. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

Tabela 1: Desembolsos – Valor do Empréstimo x Valor da Contrapartida x Taxa Front-end Fee.

Valor do Empréstimo	US\$ 139.880.000,00
Valor da Contrapartida	US\$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee	US\$ 349.700,00


Fonte: UGP/IPECE.

Tabela 2: Desembolsos.

Descrição	Data	Valor US\$	% do Empréstimo
VALOR DO EMPRÉSTIMO		139.880.000,00	100,00%
TAXA DE ABERTURA (FRONT-END FEE)		349.700,00	0,25%
DESEMBOLSOS REALIZADOS		31.897.438,31	22,80%
1º e 2º Desembolsos	2020	1.539.864,78	1,10%
3º e 4º Desembolsos	2021	2.390.035,96	1,71%
5º a 7º Desembolsos	2022	16.388.752,65	11,72%
8º e 9º Desembolsos	2023	11.578.784,92	8,28%
SALDO A DESEMBOLSAR		107.632.861,69	76,95%

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 1: Desembolsos do Projeto – US\$.

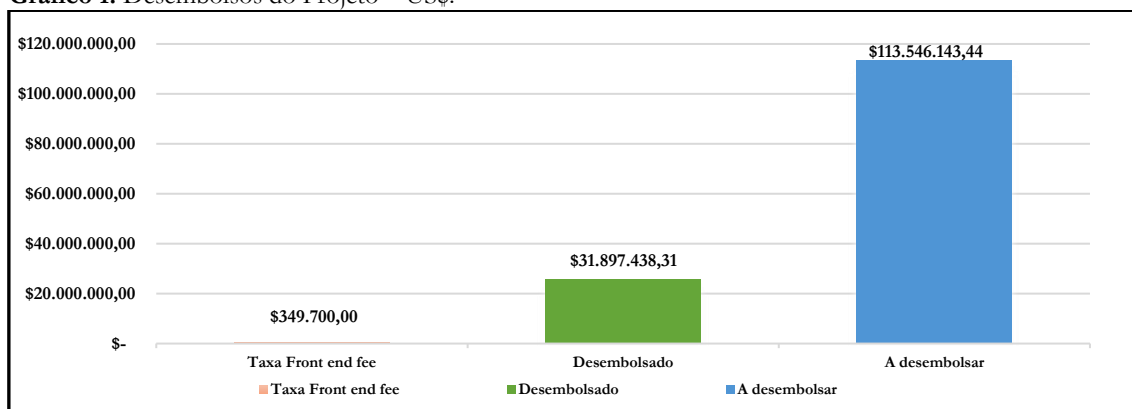

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Informou que foi realizado o nono desembolso, no valor de US\$ 5.913.281,75 e aguarda-se o melhor momento para internalizar, com a melhor cotação do dólar, o que já foi alinhado com a SEFAZ. Até o momento temos US\$ 31.897.438,31 desembolsados que representa 22,80% do valor do empréstimo e tem-se o saldo a desembolsar US\$ 107.632.861,69.

Tabela 3: Saldo da Conta Operativa em Agosto/2023 (US\$).

Valor Desembolsado	25.984.156,56
Valor Executado até 28/08/2023	23.938.232,91
Saldo desembolsado a executar	2.045.923,65


Fonte: UGP/IPECE.

Tabela 4: Saldo da Conta Operativa em Agosto/2023 (R\$).

Valor Desembolsado	135.274.606,22
Valor Executado até 28/08/2023	124.599.999,58
Saldo desembolsado a executar	10.674.606,64

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 2: Desembolsado a Executar x Executado (R\$).

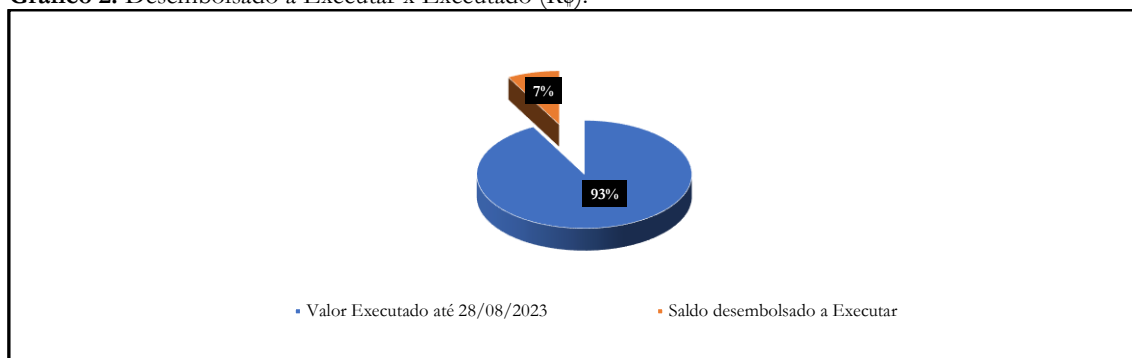

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – De acordo com esses valores, sendo 28 de agosto a data de corte, foi executado até agora R\$ 124.599.999,58 e tem-se um saldo desses desembolsos a executar de R\$ 10.674.606,64, que é o saldo da conta operativa.

Tabela 5: Acompanhamento Financeiro – Conciliação Desembolso x Empenho (R\$).

Ano	Desembolsos	Empenhos	Pagamentos			Saldo da Conta
			Orçamento	Restos a pagar	Total	
2020	8.177.297,92	2.420.219,32	824.905,89	-	824.905,89	7.352.392,03
2021	13.013.218,72	12.677.021,55	8.632.583,45	1.595.313,43	10.227.896,88	10.137.713,87
2022	84.524.326,79	74.955.949,05	69.963.059,00	4.042.621,87	74.005.680,87	20.656.359,79
2023	29.559.762,79	37.856.294,58	34.722.680,94	4.818.835,00	39.541.515,94	10.674.606,64
Total	135.274.606,22	127.909.484,50	114.143.229,28	10.456.770,30	124.599.999,58	

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Comentou sobre a conciliação do desembolso versus empenhos, para os quatro anos de projeto. Já foi empenhado o valor de R\$ 127.909.484,50 e pagamentos com o valor de R\$ 124.599.999,58. Em 2023 já empenhamos R\$ 37.856.294,58 e desse valor pagamos R\$ 34.722.680,94 e tivemos também pagamentos de restos a pagar de anos anteriores e como dito, o saldo da conta de R\$ 10.674.606,64.

Tabela 6: Acompanhamento Financeiro – Programação Desembolso x Empenho (R\$)

Período	Desembolsado	Saldo Internalização	Empenhado	Saldo Financeiro Acumulado a empenhar
2020	8.177.297,92	8.177.297,92	2.420.219,32	5.757.078,60
2021	13.013.218,72	18.770.297,32	12.675.205,31	6.095.092,01
2022	84.524.326,79	90.617.602,56	74.955.949,05	15.663.469,75
2023	29.559.762,79	45.221.416,30	37.856.294,58	7.366.937,96

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Informou que da programação de desembolso relacionado aos empenhos, temos um saldo financeiro acumulado a empenhar de R\$ 7.366.937,96 até o fim do ano de 2023. Informou também a internalização do valor do último desembolso para somar aos R\$ 10.674.606,64.

Tabela 7: Acompanhamento Financeiro – Restos a Pagar.

Setorial	Contratado/Fornecedor	Valor Executado em R\$		
		2022		2023
		Total Empenhado	Total pago	Restos a Pagar
SCIDADES	WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO	50.000,00	-	50.000,00

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Comentou que existiam setoriais que empenharam em anos anteriores, mas todos já fizeram os pagamentos, restando este contrato da SCIDADES que tem o valor de R\$ 50.000,00 empenhado do ano de 2022.

Tabela 8: Acompanhamento Financeiro – Orçamento 2023.

Execução Orçamentária 2023 R\$							
SETORIAL	Lei + Crédito	Valor empenhado 2023 (A)	Valor pago 2023 (B)	Saldo (Lei + crédito-valor empenhado)	A-B	Empenhado/ LOA	B/A
ARCE	4.676.400,00	33.758,06	0,00	4.642.641,94	33.758,06	0,72%	0,00%
CAGECE	44.007.980,00	352.342,30	352.342,30	43.655.637,70	0,00	0,80%	100,00%
CGE	1.920.000,00	1.680.000,00	1.040.000,00	240.000,00	640.000,00	87,50%	61,90%
FUNCEME	10.050.000,00	2.033.471,61	963.458,84	9.153.733,59	1.771.875,97	20,23%	47,38%
IPECE	5.939.022,00	2.906.124,00	1.555.781,19	3.032.898,00	1.350.342,81	48,93%	53,53%
SCIDADES	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SEPLAG	1.275.000,00	335.758,10	296.258,10	939.241,90	39.500,00	26,33%	88,24%
SRH	171.907.116,30	27.776.385,85	27.776.385,85	144.130.730,45	0,00	16,16%	100,00%
COGERH	22.626.757,00	2.738.454,66	2.738.454,66	19.888.302,34	0,00	12,10%	100,00%
TCE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL	265.577.275,30	37.856.294,58	34.722.680,94	228.858.185,92	3.133.613,64	14,25%	91,72%

Fonte: UGP/IPECE.


Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Comentou sobre o acompanhamento financeiro-orçamentário do ano de 2023, com valor empenhado de R\$ 37.856.294,58 e com valor pago de R\$ 34.722.680,94. Importante destacar que as setoriais devem projetar o valor na LOA mais próximo da realidade, pois a baixa execução pode identificar um mau planejamento. Comentou também que foi executado até agora 91,72% do valor que foi empenhado e do orçamento 14,25%.

Tabela 9: Execução Acumulada dos Contratos (R\$).

STATUS	Nº CONTRATOS	CONTRATADO		PAGO	
		R\$	US\$	R\$	US\$
Em execução	37	861.600.591,69	138.881.991,06	92.956.573,20	18.591.314,64
Concluído Financeiramente, mas em execução física	12	9.255.216,86	1.750.200,99	9.255.216,86	1.851.043,37
Concluído	29	14.686.617,09	2.766.878,20	14.686.617,09	2.937.323,42
Rescindido	3	400.364,99	76.719,67	383.622,89	76.724,58
TOTAL	81	885.942.790,63	143.475.789,92	117.282.030,04	23.456.406,01

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 3: Contratos.

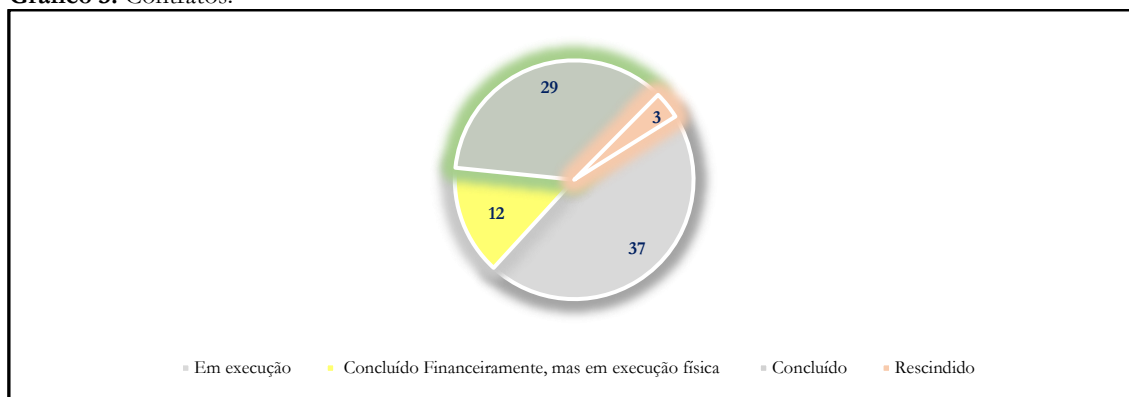

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Sobre o monitoramento dos contratos realizados pela UGP, temos 81 contratos, dos quais 37 contratos estão em execução, 12 contratos já foram concluídos financeiramente, mas ainda estão em execução física, 29 contratos concluídos e 3 contratos rescindidos. O valor contratado até agora é de R\$ 885.942.790,63 e o valor pago acumulado do projeto de R\$ 117.282.030,04.

Tabela 10: Execução Acumulada dos Contratos (R\$).

Setorial	Nº de Subprojetos	Nº de Contratos	Nº Contratos/Em Execução (Vigente)	Contratos Rescindidos	Nº Contratos/Concluídos	Valor Contratado + Patronal/FONTE BIRD/(R\$)	Valor Contratado + Patronal/CONTRAPARTIDA (R\$)	Valor Pago (R\$)	Saldo a Pagar (R\$)	% Pago/Setorial	% Pago/Total
1 ARCE	3	2	2	0	0	3.478.133,96	0	0	3.478.133,96	0,00%	0,00%
2 CAGECE	5	6	5	0	1	79.786.371,17	0	1.090.474,31	78.695.896,86	1,37%	0,15%
3 CGE	1	1	1	0	0	4.000.000,00	0	1.360.000,00	2.640.000,00	34,00%	0,19%
4 CIDADES	2	1	1	0	0	217.800,00	0	0	217.800,00	0,00%	0,00%
5 COGERH	6	13	6	1	6	27.667.645,41	0	10.011.853,18	17.655.792,23	36,19%	1,39%
6 FUNCEME	13	22	10	0	12	15.922.433,87	0	11.155.023,92	4.767.409,95	70,06%	1,54%
7 IPECE	14	16	12	1	3	7.642.667,24	0	4.474.955,29	3.167.711,95	58,55%	0,62%
8 SDE	5	3	2	0	1	5.780.028,94	0	3.460.038,70	2.319.990,24	59,86%	0,48%
9 SEPLAG	2	4	4	0	0	2.415.114,42	0	643.847,82	1.771.266,60	26,66%	0,09%
10 SRH	9	10	5	1	4	572.955.949,26	163.644.721,42	89.971.881,41	646.628.789,27	12,21%	10,16%
11 TCE	2	3	1	0	2	2.431.924,95	0	2.431.924,95	0	100,00%	0,34%
TOTAL	62	81	49	3	29	722.298.069,21	163.644.721,42	124.599.999,58	761.342.791,05	14,06%	14,06%

Fonte: UGP/IPECE.

Thâmara Teixeira (UGP/IPECE) – Comentou por último a disposição por setorial, que do valor que já está contratado, incluindo valor do contrato mais patronal nos contratos de consultor individual, temos que todas as setoriais já têm contratos firmados e embora a ARCE já tenha empenhado ainda não pagou e SCIDADES ainda não teve execução financeira.

VI. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Figura 2: Visão Geral dos Subprojetos no Projeto de Segurança Hídrica e Governança.



Fonte: UGP/IPECE.

1. Componente I – Aumento da Segurança Hídrica

Figura 3: SRH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 2: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – SRH.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiu - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO .
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiu - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A .
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos nº 07, 08 e 09/2022 - Concluídos .
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - Concluído .
5	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiu-Sertão Central (SAB-SC).	Em fase de negociação contratual com o consultor.
6	Consultoria Individual	Consultoria Técnica Especializada (pessoa física) para realizar Curso de Capacitação na Análise e Elaboração de Laudos de Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais, com ênfase no Marco da Política de Reassentamento Involuntário (MRI).	Projeto será cancelado no Plano de Aquisição e Sistema STEP.
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiu e Gavião: Especialista em Geotecnia. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023 em Execução - MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR
8	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiu e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA
9	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiu e Gavião: Especialista em Hidrologista. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/SRH/CE/2020 em Execução - RONEI VIEIRA DE CARVALHO

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Passou a palavra para o representante da SRH.

Gianni Bezerra (SRH) – Informou que o Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022, de obras, recentemente teve um aditivo em termos do contrato e a repactuação do prazo, mas não alterando o prazo total que é de 5 anos e mais um ano de garantia. Para esse acordo é praticamente quase inviável essa alteração devido a questão do empréstimo do Banco Mundial e também existiu um impacto no preço em relação da utilização de uma tecnologia diferente, não afetando muito ou quase nada na concepção geral que nesse momento está na fase da obra. Comentou também com relação a parte da ETA, informando que já está com toda área disponível para começar as obras e com algumas obras

complementares e alguns prédios que irão sediar o canteiro da obra, como exemplo, restaurante. Comentou também sobre a terraplanagem completa e já iniciando também a construção da fundação de reservatórios de água tratada e temos também alguns trechos da adutora já instaladas, principalmente entre a captação e a ETA. Sobre o contrato do engenheiro, informou que teve algumas alterações de equipe devidamente formalizadas e tivemos melhora nesse contrato. Informou que a obra está fluindo e todas as licenças foram dadas. Comentou que importante agora é o ritmo de obra para recuperarmos o tempo perdido.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que esse contrato traz uma figura que é uma novidade em nossa legislação que seria o Comitê de Resolução de Conflitos (DAAB), que são três profissionais, no caso de conflito entre a contratante e a contratada, eles são a primeira instância de discussão. Este comitê realizou a primeira visita no dia 22 de agosto juntamente com equipe da SRH, eu fui como representante da UGP, para entender um pouco mais do que estamos tratando ao longo desse tempo. A visita foi muito positiva de ver o avanço, a terraplanagem toda concluída, o pessoal no campo trabalhando, muitos equipamentos e promessas de chegada de equipamentos no mês de outubro, muitas promessas de aumento de frente de obra no mês de outubro e esperamos que a obra entre em outro nível e já no começo do ano de 2024 é obrigatório existir a primeira entrega, a não ser que eles tenham alguma justificativa para adiar novamente.

Gianni Bezerra (SRH) – Informou que será muito difícil aceitar essa prorrogação de prazo, pois os prazos iniciais foram todos alterados, não todos alterados porque essa obra é feita em seções, sendo cinco seções, mas a primeira, segunda e terceira seção foram repactuados os prazos, houve prorrogação e a quarta e a sexta não, pois está perto do prazo final e que é muito difícil que se aceite, muito difícil ter uma justificativa para um novo adiamento até em virtude da multa e a mesma é muito pesada e a empresa deve dar andamento ao trabalho para não ser multada pelo atraso.

Liana Brandão (TCE) – Questionou sobre o andamento das desapropriações.

Gianni Bezerra (SRH) – Nos dias 23 e 24 agora estivemos no campo, e negociou com todos que são atingidos. Informou que foi quase 100% de sucesso.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Informou que nos próximos dias teremos um relatório específico sobre essas questões de desapropriação.

Gianni Bezerra (SRH) – Comentou em relação ao modelo de gestão que é uma das pendências da SRH. O modelo de gestão é exatamente como será o arranjo institucional quando o sistema malha d'água, principalmente esse primeiro estiver pronto. Comentou também que existe uma obra nova que abrange vários municípios já que é um sistema adutor coletivo, para várias localidades, sendo 48 localidades, entre 7 distritos, e a gente precisaria ter um arranjo de quem iria operar esse sistema novo, que é um sistema coletivo e com água tratada e se fosse com água bruta estaria na mão do pessoal da COGERH. Comentou também que existe o termo de referência e está concluído e estamos na fase final de negociação em relação a valores e também já está alinhado com o próprio consultor e a gente está dependendo praticamente de a SRH aceitar a proposta do consultor. Informou que em relação ao modelo em si, existe vários cenários que propomos para ser estudado e o papel do consultor é dar respaldo jurídico a esses cenários, pois envolve legislação recente de saneamento e dos territórios e o Estado optará pelo cenário que será mais conveniente.

Danielle Araújo (SCIDADES) – Indagou quem dará o “de acordo” sobre esse modelo de gestão. Comentou que existe agora a figura da microrregião no saneamento básico, que são três, e inevitavelmente essa figura precisa estar presente na discussão e como se dará essa escolha do modelo de gestão para inserir as microrregiões dentro desse contexto.

Gianni Bezerra (SRH) – Comentou que todas essas peculiaridades recentes em relação ao saneamento serão o foco do estudo do consultor e ele irá considerar tudo que está definido para esse contexto e a escolha do cenário em si, é uma questão de Governo. Informou que a CAGECE está muito envolvida nesta discussão e fez parte na construção do termo de referência e da fiscalização

dessa obra e dentro desse cenário de que a CAGECE poderá assumir e já existe uma conscientização da Presidência da CAGECE e de seu corpo técnico principal para se preparar para isso.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que acrescenta a participação da ARCE.

Gianni Bezerra (SRH) – Na construção do Termo de Referência participaram ARCE, SCIDADES e a SEPLAG.

Liana Brandão (TCE) – Perguntou se a CAGECE já tem concessão com esses municípios.

Gianni Bezerra (SRH) – Respondeu que tem quatro centros.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que seria uma questão da avaliação, sendo quatro CAGECE, cinco SAAE's e o distrito tem muito desses SAAE's. Comentou também referente ao item seis sobre a solicitação de inclusão desse projeto no nosso Plano de Aquisições, foi acatado e, foi solicitado algumas respostas por e-mail e não obtiveram respostas, que seria o curso que não tinha um custo tão alto e ideia seria de não realizar mais e seria somente repassar essa informação.

Gianni Bezerra (SRH) – Perguntou se teve uma manifestação formal junto a SRH.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Solicitou algumas vezes a resposta por e-mail e não obteve resposta.

Gianni Bezerra (SRH) – Informou que houve mudanças na função de Coordenador de Infraestrutura e precisa atualizá-lo e perguntar se o mesmo manterá a decisão.

Figura 4: COGERH.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 3: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – COGERH.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a Universalização da Macromedição da COGERH. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 014, 015 e 016/2021/COGERH. Concluído Financeiramente, mas em execução física.
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH - Concluído.
3	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 010/2023/COGERH - em Execução - CONSÓRCIO MLG E RC MEDIÇÕES.
4	Consultoria	Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 066/2022/COGERH em Execução - CONSÓRCIO HYDROS / REGEA / IRRIGART.
5	Bens	Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1- Equipamentos de TI: Concluído; 2 - Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH. Concluído Financeiramente, mas em execução física; e 3 - Aquisição de Workstations: COGERH instruindo o Processo de Pregão Eletrônico com posterior envio a PGE, após anuência da UGP.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 072/2022/COGERH em Execução - GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Em relação aos seis projetos da COGERH podemos considerar quase todos como contratados, faltando apenas a compra de equipamentos de informática (Workstations). Questionou como estão as instalações dos medidores de vazão, e a consultoria do plano de segurança das barragens.

Paulo Miranda (COGERH) – Informou que a empresa para realização das instalações dos medidores foi contratada e vem transcorrendo dentro da normalidade e é possível que estejam acompanhando os indicadores pari-passu, os indicadores sem nenhum destaque e previa alguns entraves que poderiam ocorrer e vem sendo resolvidos.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que a ação da universalização da macromedição é um dos pontos mais importantes do Projeto, tanto é que há um indicador exclusivo sobre esse assunto. Informou que fazem parte da universalização a aquisição dos macromedidores e a instalação dos mesmos. Informou também que na Missão do Banco pedirá um relatório do avanço físico dessa obra, e que na última missão foi relatado que 25% estavam concluído. É preciso acompanhar o monitoramento desse percentual e sempre que for necessária essa informação ser reportada. Indagou se a COGERH tem essa informação atualizada.

Paulo Miranda (COGERH) – Informou que são 138 macromedidores instalados, correspondendo a 39,4%. Informou também que acompanham sistematicamente esse percentual.

Anthony Maia (COGERH) – Comentou sobre os projetos quatro e cinco. Informou que em relação ao projeto quatro, a COGERH já adquiriu drones, equipamento de tablets, GPS. Informou também em relação ao projeto quatro, o serviço de consultoria seria um cadastro dos usuários das doze bacias hidrográficas do estado do Ceará já está em execução, também informou o indicador utilizado e seu percentual.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Indagou se a meta já foi atingida.

Denilson Fidelis (COGERH) – Informou que existem 64 usuários cadastrados.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Indagou se esse percentual apresentado representa todas as doze bacias.

Anthony Maia (COGERH) – Respondeu que não.

Mikaelle Mariano (COGERH) – Informou que esse percentual é parcial.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Sobre o projeto “Plano de Segurança de Barragens”, comentou que algumas assistências técnicas têm relevância maior do que outras e esse projeto tem uma relevância enorme, tanto é que temos cláusulas no Acordo de Empréstimo relacionados a esse contrato assim como indicadores. e perguntou sobre as sondagens e a participação do especialista do painel e se houve avanços.

Mikaelle Mariano (COGERH) – Explicou que esse contrato está em execução e a empresa está realizando serviço de campo que integram aquele volume dos estudos complementares que é uma das metas que aparecerão na apresentação dessa reunião e uma das indicações do Banco é que o consultor acompanhe uma parte desses estudos. Informou que a primeira etapa já foi realizada e a segunda etapa está prevista para outubro e a empresa está com dificuldade para contratar. Ela irá subcontratar esse serviço, mas há um contato direto com a empresa para pegar essa data com antecedência e chamar o consultor para acompanhar o processo. Informou também que a equipe da COGERH está acompanhando o que está sendo realizado. Os serviços complementares dependem desse serviço de campo que ainda estão em execução, quando concluírem o serviço de campo, eles apresentarão um relatório e realizar a entrega. Informou também que essa entrega está prevista segundo o cronograma apresentado para a COGERH, para novembro agora.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Sobre o indicador, informou que existem metas intermediárias e finais. Sobre as metas intermediárias estas vão sendo monitoradas e classificadas de acordo com a probabilidade de cumprimento ou se já foram cumpridas. Com a cor vermelha representa que está atrasado ou a probabilidade é baixa de a meta ser atingida, e já foi discutido nas reuniões anteriores. Comentou que foram acordados novos prazos e o que irá ser observado durante a Missão é o prazo do último plano de ação.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que, do ponto de vista jurídico a COGERH assinou esse contrato, demorou para emitir a ordem de serviço e o prazo ficou comprometido.

Mikaelle Mariano (COGERH) – Comentou que a ordem de serviço está relacionada ao termo de cooperação com o DNOCS.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Solicitou a COGERH que iniciasse o processo objetivando a elaboração de aditivo de prazo.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou sobre a última meta, referente as obras de reabilitação do Banabuiú que s, há, em tramitação, o acordo de cooperação técnica com o DNOCS e gostaria de uma atualização sobre os andamentos.

Mikaelle Mariano (COGERH) – Informou que o acordo já foi para o DNOCS, e a assessoria jurídica do DNOCS realizou uma análise apontando algumas limitações que deveriam ser corrigidas e a assessoria jurídica da COGERH também realizou análise e já acatou e agora está para assinatura.

Figura 5: FUNCEME.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 4: Componente I – Aumento da Segurança Hídrica – FUNCEME.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de Equipamentos para Instrumentação e Monitoramento de Bacias Hidráulicas.	Contratos: 04/2021, 05/2021, 06/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 - Concluídos.
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 - Concluído.
3	Serviços	Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações limimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará.	Contrato nº 11/2023 em Execução - CONSTRUTORA ALVES SANTIAGO LTDA.
4	Serviços	Serviços de Laboratório para Análises Físico-químicas e Biológicas em Amostras de Água Bruta de Corpos Hídricos Superficiais localizados no Ceará.	Contrato nº 06/2023 em Execução - CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA.
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado Do Ceará.	Contrato nº 07/2022 em Execução - JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ.
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato nº 08/2021 - Concluído.
7	Serviços	Serviços de Engenharia para Instalação de Estações Meteorológicas.	Contrato nº 16/2021 - Concluído.
8	Bens	Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com instalação e treinamento.	Pregão Eletrônico nº 20230005-FUNCEME/NUMON lançado, com data de Sessão de disputa de Preço no dia 28/09/2023.
9	Bens	Aquisição de Drones.	01 Drones e Software - Contratos em Execução : Contratos nº 02/2023 - GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT LTDA ; e nº 03/2023 - G DRONES COMERCIO E SERVICOS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS LTDA. 02 - Contratos nº 08/2023 em Execução - SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
10	Consultoria	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	Contrato nº 14/2021 em Execução - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM.
11	Bens	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Contratos nº 17/2022 - TORINO INFORMÁTICA e nº 19/2022 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. Concluído Financeiramente, mas em execução física.
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluências aos principais reservatórios do Estado. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 10/2023 em Execução - VERSATUS HPC, INC.
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em Execução - MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Com relação a FUNCEME, comentou que os representantes estão ausentes, mas justificaram. Comentou também que a FUNCEME é a setorial com mais projetos e que falta somente a contratação de um projeto que seria a aquisição de sistema de Radar Meteorológico e sua instalação que será no autódromo do Eusébio. Este projeto já está na PGE, o Pregão está marcado para o dia 28/09.

2. Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Figura 6: CAGECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 5: Componente II – Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água – CAGECE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <i>Há Indicador associado</i>	Lote I: Contrato nº 0093/2023 - OS: 06/06/2023. CONSORCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS . Pendência referente a Arbitragem. Lote II: Contrato 0059/2023 – OS: 06/05/2023. CONSORCIO TELAR-ENORSUL-BBL . Pendência referente a Arbitragem.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 051/2023 – OS: 06/05/2023. CONSORCIO IGNEO INGENIERIA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Contrato nº 145/2022 em Execução - INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA.
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 201/2021 – Concluído.
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	Contrato 98/2023 - Assinado dia 23/05/2023 - CONSORCIO FALCONI CONSULTORES S.A e EFFICO SANEAMENTO LTDA . Aguardando a formalização do Termo de Sub rogação e aguardando a emissão da Ordem de Serviço.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que a CAGECE tem os outros contratos com obras dentro do Acordo de Empréstimo e solicitou um breve resumo da execução, de uma forma geral como estão os andamentos e expectativas.

Priscila Medeiros (CAGECE) – Informou que são três contratos, dois de obra e um de consultoria. Os dois estão andando bem, paralelamente. Nessa primeira fase, são os estudos e projetos, eles têm dois produtos para entregar que são os PGS's e a modelagem hidráulica. Foi recebida a versão preliminar do PGS e solicitamos que essa entrega fosse antecipada para podermos realizar uma análise conjunta com a consultoria, o ATO, para poder indicar para empresa as melhorias a serem realizadas. Comentou que em relação aos PGS's que foram recebidos, a CAGECE tem uma equipe muito boa, com o apoio técnico do ATO, e a pessoa do social do ATO já detectou algumas falhas no PGS, principalmente na parte dos indicadores sociais e de comunicação e por se tratar de uma pessoa que já tem experiência com outras obras do BIRD, ela conseguirá catalisar o processo e detectar algumas melhorias. Sobre o produto modelagem, comentou que a CAGECE entende a importância do projeto, a gerência passou por uma estruturação recente e agora teremos uma coordenação de obras de DMC que ficará à frente desse projeto e dos próximos que estão sendo elaborados, licitação para obras DMC e inclusive o coordenador participará das próximas reuniões. Informou também que em relação as modelagens, os representantes dos dois consórcios de campo começaram a campanha nessa semana para poder validar a calibragem desse modelo hidráulico. A CAGECE, para atender os prazos, sugere que quando uma empresa propõe um modelo hidráulico, ela venha com inovações tecnológicas, então ela quer mexer em um padrão de caixa, num padrão de automação e então para que a gente não fique esperando esse modelo estar calibrado e montado, a gente já solicitou que esses padrões fossem enviados para a CAGECE analisar e será uma oportunidade muito grande de inovação, pois existem algumas características construtivas que a CAGECE hoje não adota e esse intercâmbio será muito positivo para modernizar suas estruturas, como por exemplo, um medidor, uma bateria, que parece uma ideia simples e a gente tem outra obra de DMC na Messejana e Castelão, e tem locais que não conseguimos conversar com a Enel para a instalação de um poste. Informou por ser um contrato de performance, toda a equipe da CAGECE está com esse olhar de inovação e de absorver junto com a empresa do que eles estão utilizando melhor no mercado e o que for viável

para ser mantido. Falou que em relação a modelagem estamos avançando e não recebemos nenhum modelo pronto, pois eles estão pesquisando no campo. Informou que todos estão empenhados e o consórcio quer antecipar o que puder antecipar. Comunicou também quando o PGS for aprovado nós conseguiremos enxugar esse cronograma.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que a CAGECE apresentou o cronograma revisado e previsto das entregas dos DMC's e que, na Missão anterior, foi revisada a meta de entrega dos primeiros DMCs no mês de fevereiro de 2024. E como está tudo indo de acordo com o cronograma, essa nova meta será mantida para a Missão do Banco de outubro.

Priscila Medeiros (CAGECE) – Informou que possivelmente será atendido, mas existem muitos condicionantes envolvidos na obra, então será necessário autorização para quebra de asfalto, estamos falando de setores que são muito complicados de atuar, como por exemplo a Aldeota, não teremos facilidade para liberação de vias, pois existe muito fluxo. Comentou que dentro do modelo hidráulico estamos tendo essa preocupação. Informou que foi realizada reunião com a empresa e algumas coisas que vimos como proposto já foram descartadas pelas vias que eles escolheram e por isso que eles estão em campo para poder mudar esses traçados.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Como encaminhamento para a CAGECE uma atenção maior ao que está definido nos contratos, para a Missão do Banco. Nas últimas Missões, o Banco teve muita atenção para as obras do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central e não será diferente com a CAGECE. É importante interpretar o contrato e trazer as informações conforme o contrato. Tivemos muita dificuldade com o projeto da SRH como um todo, pois não tiveram atenção as letras do contrato, então o Banco quando chega vai no contrato, prestar sempre atenção ao contrato. Comentou sobre o recorte e o envio desses documentos para UGP, já que o Banco já está nos solicitando para antecipadamente tomar conhecimento, então muito provavelmente o Banco já chegue com as dúvidas e com os questionamentos e o que pudermos antecipar eu irei antecipando com vocês, mas a atenção do Banco irá agora para a CAGECE.

Priscila Medeiros (CAGECE) – Não temos nada validado, somente entregas parciais e espera-se que até a Missão poderemos ter o plano de trabalho validado que sai essa semana e a modelagem eu não sei, talvez o lote um que está mais avançado e eu consiga. Perguntou se até a Missão deveremos enviar as parciais ou só envio os produtos validados.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Solicitou que envie as parciais e também a informação da causa do não cumprimento.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Indagou a representante da SCIDADES se existia alguma novidade sobre CONSÓRCIO FALCONI CONSULTORES S.A e EFFICO SANEAMENTO LTDA.

Danielle Araújo (SCIDADES) – Comunicou que o secretário assinou e falta apenas enviar para publicação do extrato.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Solicitou o envio de cópia assinada para remeter para a CAGECE e questionou sobre o segundo termo que estava para ser cadastrado no SACC.

Danielle Araújo (SCIDADES) – Informou que o cadastro de uma das empresas foi realizado, estava faltando uma certidão, que já foi encaminhado pela empresa e já foi encaminhado para o CRC.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que o indicador da CAGECE foi cumprido. Indagou se existe chance de ser aprovado e apresentado pelas agências reguladoras.

Abigail Araújo (CAGECE) – Informou que ao longo da elaboração do trabalho, desenvolvimento do trabalho a ARCE já estava participando para conhecer o processo e foi apresentado e enviadas comprovações. Informou também que nesse momento a ARCE e a CAGECE estão muito voltadas para o processo de revisão de reajuste tarifário e quando passar essa fase, acredito que elas irão poder analisar os produtos e a gente irá acompanhando e ver como está. Como foi comentado na reunião de revisão de meio termo, se até concluir, em 2027, sendo aprovado, daremos o retorno para UGP.

3. Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público

Figura 7: ARCE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 6: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – ARCE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/ARCE/2023 em Execução - KROLL BRASIL LTDA.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Contrato nº 04/ARCE/2023 em Execução - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
3	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	Aviso de Manifestação de Interesse nº 20230001 - Publicado no dia 21/08, com data de recebimento dos Portfólios até o dia 13/09/2023. Acordado na Missão de Maio: Assinatura do contrato em dezembro/2023.

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que foi justificado a ausência dos representantes da ARCE. Informou que temos dois contratos já em execução e o terceiro projeto, onde está identificado, está com a manifestação de interesse publicada e nós assumimos o compromisso de ter esse contrato assinado até dezembro de 2023 e acredito que objetivo será alcançado.

Figura 8: IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 7: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – IPECE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. - <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 08/2022 em Execução - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	Contrato nº 10/2022 em Execução - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.
3	Serviço	Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 05/2023 em Execução – INSTITUTO OLHAR PESQUISA E INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA
4	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1 - Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 09/2020 e 02/2021 em Execução; e 2- Consultora Socioambiental – IPECE elaborado o Relatório de Avaliação Curricular.
5	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1. Contratos nº 13/2022; nº 14/2022; nº 16/2022 e 17/2022 - Concluídos Financeiramente, mas em execução física.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Informou que são cinco projetos do IPECE, Sobre a execução do projeto do item 1, indagou como está a execução do contrato.

Ana Cristina Lima (IPECE) – Respondeu que o projeto está bem encaminhado e está dentro do previsto e acredita que o prazo será cumprido conforme o prazo c previsto.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Perguntou se a Matriz Insumo-produto foi concluída.

Ana Cristina Lima (IPECE) – Respondeu qual foi o último produto entregue.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou também que essa Matriz seria um dos insumos para concluir o primeiro artigo.

Ana Cristina Lima (IPECE) – Respondeu que sim.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Solicitou à representante do IPECE que comentasse o que foi decidido sobre a contratação do consultor individual, o período da contratação, se será por produto e como está o andamento, pois, tal assunto deverá ser reportado ao Banco. Comentou que na última Missão foi acordado que seria uma contratação direta ou uma seleção e o IPECE já se manifestou informando que seria uma manifestação de interesse e o que ficou decidido.

Ana Cristina Lima (IPECE) – Respondeu que ficou decidido uma contratação individual para desenvolver esses dois produtos que são os indicadores e os responsáveis se reunirão esses dias para começar a desenhar o termo e o processo de contratação e temos um prazo e conseguiremos cumprir.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Perguntou quanto tempo para contratação de um consultor individual.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Respondeu que a contratação de um consultor individual gira em torno de 90 dias, da manifestação até a contratação.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Comentou que teria de entregar o projeto até dezembro. Comentou também que o importante é mostrar avanço na contratação do consultor na Missão do Banco.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comentou sobre o projeto número dois, são os cursos da Fundação Getúlio Vargas que estão sendo ofertados aos servidores que fazem parte do projeto, comentou também sobre o projeto número três e também do projeto número quatro que seria a contratação do consultor socioambiental que está na fase de análise de currículos e a estimativa que até a Missão do Banco já esteja contratado para dar suporte a UGP e aos projetos do IPF.

Figura 9: SDE/FUNCEME.



Fonte: UGP/IPECE.

Figura 10: SDE/IPECE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 8: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SDE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SDE/IPECE	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
2	Consultoria	Levantamento Cadastral de Irrigantes e Determinação de Demanda Hídrica para o Setor Agropecuário das Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SDE/FUNCEME	Contrato nº 12/2022 em Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.
3	Consultoria	Contratação de Serviços para Transferência de Conhecimento e Tecnologia com Orientação Técnica Especializada e Treinamento Extensivo na Metodologia Surface Renewal (Fundação). SDE/FUNCEME	Termo de Referência, Justificativa da Contratação Direta e Estimativa de Custo remetidos para análise prévia do Banco Mundial no dia 18/08. Acordado na Missão de Maio: Assinatura do contrato em setembro/2023.
4	Consultoria Individual	Gestão de Água e Eficiência Hídrica para Irrigação no Ceará – (Programa Cientista Chefe). SDE/FUNCEME	Termo de Referência e Tabela de Custos remetidos para análise prévia do Banco Mundial no dia 24/08. Acordado na Missão de Maio: Assinatura do contrato em setembro/2023.
5	Bens	Fornecimento e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SDE/FUNCEME.	Contrato nº 06/2020 - Concluído.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Informou que esses são os projetos da FUNCEME e da SDE. Os dois projetos estão em análise prévia pelo Banco Mundial, aguardando validação e só depois disso, é que se começa o processo da contratação. O projeto três é uma contratação direta e o projeto quatro é a contratação de consultores individuais que são bolsistas da FUNCAP. Solicitou ao representante da SDE que comentasse sobre os dois projetos.

Vandemberk Oliveira (SDE) – Informou que avançaram nos projetos e tem um projeto junto com a FUNCEME que é a instalação de estações e tecnologia para coleta de dados e essa metodologia foi desenvolvida pela Universidade Devis e com relação a outra consultoria, nossa ideia é validar esses processos e estamos fazendo a contratação desse consultor através de bolsa via FUNCAP e iremos realizar a validação, indo ao campo, nas bacias que recebe as estações já instaladas e juntamente com o IPECE. Informou também que os dois projetos terão um período de 18 meses.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Perguntou sobre o projeto dois que é o levantamento cadastral de Irrigantes e Determinação de Demanda Hídrica para o Setor Agropecuário das Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado e a representante do IPECE assumiu a gestão desse contrato a pouco tempo e solicitou novamente ao representante da SDE para comentar como está a execução desse projeto e se precisará de um aditivo.

Vandemberk Oliveira (SDE) – Comentou que todos os projetos estão interligados e a contratação de consultoria para o levantamento cadastral já tem em torno de 17.000 usuários dessas cinco bacias que estamos utilizando e a consultoria deve estar realizando um levantamento em torno de 6.000 usuários. Esse produto está ligado ao processo do IPECE, o sistema está sendo desenvolvido, eles estão relativamente dentro do prazo e esses dados serão importantes para validação do software.

Ana Cristina Lima (IPECE) – Comentou que o projeto está caminhando bem, apesar de ter surgido um pequeno empecilho na obtenção dos dados, existe uma boa relação com a empresa.

Figura 11: SCIDADES.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 9: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SCIDADES.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Edital de Solicitação de Proposta lançado no dia 18/07. Data de recebimento das Propostas no dia 11/09. Acordado na Missão de Maio: Assinatura do contrato em novembro/2023.
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Contrato nº 20/2022 em Execução - WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comentou em relação a consultoria e estamos na fase SDP, as empresas irão enviar suas propostas até o dia 11 desse mês. Informou que o consultor individual, Wladimir Antônio Ribeiro, é um contrato que está em execução desde o ano passado e a informação que nos foi passada é que ele já entregou um produto e perguntou se existe uma previsão de pagamento desse produto.

Danielle Araújo (SCIDADES) – Comentou que a informação que foi passada é que foi empenhado esse pagamento e foi solicitado a documentação completa pelo financeiro, isso relacionado ao produto um.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou que em relação ao contrato do Wladimir Antônio Ribeiro, na renovação, ele mostrou um receio muito grande por conta da demora da contratante nas respostas da análise dos produtos dele e até na ata de negociação ele se comprometeu a ser mais célere e não conseguiu e o trabalho dele envolve várias setoriais. Sugeriu que vissem o melhor caminho para a aprovação desse produto pois está se confirmando aquilo que ele falou na negociação. Esse contrato não existe previsão de reajuste e quanto mais tempo o consultor ficar no contrato, para ele não é interessante. Esse contrato deveria ser executado dentro de quatro a cinco meses e como não houve resposta, precisamos melhorar nesse sentido.

Danielle Araújo (SCIDADES) – Comentou que esse é um tópico que fez parte de uma reunião realizada na SCIDADES. Perguntou se a UGP teve acesso ao aditivo.

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Não.

Danielle Araújo (SCIDADES) – Comentou que o aditivo precisa ser enviado a UGP. Comentou também que existe esse aditivo e não foi enviado para a UGP.

Rodrigo Almeida (UGP/IPECE) – Afirmou que um aditivo já passou pela UGP.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Informou que provavelmente precisa do segundo aditivo. Comentou que esse consultor é uma autoridade a nível nacional no assunto e o referido consultor está também em negociação contratual para começar a desenhar o Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central na parte de legislação e até com receio da parte dele em relação ao projeto, apesar de ele ter uma excelente relação com o estado do Ceará, CAGECE, já teve contrato com a SCIDADES.

Danielle Araújo (SCIDADES) – Comentou que estão passando por uma reestruturação na coordenadoria e estamos organizando a célula de planejamento de saneamento e estruturando a equipe para dar uma acelerada nos processos.

Figura 12: CGE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 10: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – CGE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/2022 em Execução - CONSÓRCIO CONFIDERE E CANIX.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Comunicou que os representantes não estão presentes, mas devidamente justificados. Informou que o contrato está em execução e com um pequeno atraso na entrega de alguns produtos, mas a vigência será cumprida.

Figura 13: SEPLAG.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 11: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – SEPLAG.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. Há Indicador associado	Contrato nº 018/2022 em Execução - CONSÓRIO MTC: MACROPLAN / TRANSPLAN / J C M Freitas-serviços de Informática (CHERRY IT).
2	Bens	Aquisição de Mobiliário de Equipamentos de TIC para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	1) Aquisição de Equipamentos de TI: Contratos nº 02/2023 – DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e 03/2023 – TORINO INFORMÁTICA em Execução; 2) Aquisição de Mobiliário: Contrato nº 022/2023 - ESL LICITA COMÉRCIO E SERVIÇOS em Execução; e 3) Aquisição de equipamentos: Processo em análise na PGE, com posterior publicação do Edital de Pregão Eletrônico.

Fonte: UGP/IPECE.

André Gonzaga (UGP/IPECE) – Solicitou a representante da SEPLAG que comente como está o andamento da consultoria e do pregão eletrônico do equipamento.

Karine Machado (SEPLAG) – Comentou que o pregão foi marcado para o dia 15 de setembro. Em relação a consultoria estão na fase de desenvolvimento do sistema e temos várias telas que estão sendo testadas de acordo com as cinco fases de metodologia da gestão do investimento público e agora em setembro teremos o primeiro curso de capacitação mais avançada para aquelas pessoas que irão compor o grupo dos técnicos de investimento, além de SEPLAG e IPECE também. Comentou também que a primeira capacitação será agora e será on-line. Comentou também que em outubro será ofertado outra e será mais ampla para todas as setoriais envolvidas no investimento público e invertemos só um pouco o cronograma, pois o primeiro produto de capacitação era uma sensibilização no nível de alta gestão e conversamos com a secretária e com a equipe técnica também, e entenderam que melhor a sensibilização para quando o sistema estiver pronto para começar, porque seria o curso de sensibilização em setembro e o sistema só estará pronto em janeiro para poder começar a operacionalizar, então inverteu-se colocando o curso de sensibilização para o futuro e os cursos de capacitação ocorrerão no decorrer desse ano. Comentou também que em relação ao cronograma do contrato se manteve a data final apesar de existir ajustes internos de revisão de datas de produtos, mas o prazo final estamos tentando cumprir. Comentou que estão sendo pagos em torno de 30% do contrato, com essa última parcela e já estamos abrindo novo processo de pagamento também. Com relação aos computadores está tudo certo e do mobiliário precisamos fazer a solicitação da ordem de fornecimento.

Wagner Rios (UGP/IPECE) – Perguntou se o prazo final para o atingimento da meta intermediária do indicador relacionado é janeiro de 2024, conforme o plano de ação, se o sistema já está implementado e se as reuniões com a DAS tiveram avanço.

Karine Machado (SEPLAG) – Respondeu que o prazo é janeiro de 2024 no sistema e ainda temos mais três meses de operação assistida no sistema. O sistema está em produção e tem as fases e está em homologação para ser testado. Comentou que a gente vai testando o sistema e validando a metodologia ao mesmo tempo, obedecendo as fases. Comentou também que temos reunião semanal entre a equipe de negócio quanto da equipe da TI. Em relação a SDA, a secretária pediu que começássemos agora no segundo semestre e quanto tínhamos algo mais concreto e está na nossa programação fazer agora com a SDA e SRH também.

Figura 14: TCE.



Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 12: Componente III – Fortalecimento da Gestão do Setor Público – TCE.

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de Equipamentos (Vant's), Software e Treinamento para Auditoria e Monitoramento de Obras de Infraestrutura Hídrica.	Contratos nº 35 e 36/2021 – Concluídos.
2	Bens	Aquisições de Equipamentos para Desenvolver Solução de Monitoramento de Obras de Engenharia que Consiste na Elaboração de uma Base Analítica Composta de Mecanismo de Coleta de Dados e Painéis de Monitoramento de Obras de Engenharia por Meio da Tecnologia de Business Intelligence e Aplicação de Modelos de Machine Learning. Há Indicador associado	Contrato nº 44/2022 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A. Concluído Financeiramente, mas em execução física

Fonte: UGP/IPECE.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Perguntou se a representante do TCE gostaria de comentar sobre o sistema e a entrega.

Liana Brandão (TCE) – O sistema de monitoramento de obras foi entregue no final de junho de 2023, já tivemos uma reunião com os diretores do IPECE, mostrando a tecnologia. Comentou também que encaminhou ofícios para diversos órgãos, pois queremos incorporar nesse sistema com mais informações para adiantar a segunda etapa, a próxima meta, pois precisamos efetivar 70% das obras do Projeto monitoradas e 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados. Comentou também que deseja incluir os dados da CAGECE dos DMC's e tivemos como novidade essa semana a CGE esteve com a gente no TCE para a gente integrar esforços e já aproveitou essa questão da integração para discutir a questão dos contratos com os órgãos que estão envolvidos e tentar absorver também algumas funcionalidades do sistema relacionados a obras e contratos e suprir no futuro essas necessidades que o TCE está apontando.

Giuseppe Nogueira (UGP/IPECE) – Comentou da importância de se organizar para a Missão do Banco e fazer uma apresentação para a representante do Banco. E informou que encaminhou a planilha da SRH, atualizada.

Liana Brandão (TCE) – Agradeceu e informou que a planilha já foi incorporada.


VII. INDICADORES

Tabela 11: Status de Cumprimento das Metas dos Indicadores.

Nível de Probabilidade	A Cumprir	Cumpridas	Total	%
Probabilidade alta de atingir a meta no prazo ou meta atingida	6	7	13	35%
Probabilidade intermediária de atingir a meta no prazo	6	0	6	16%
Probabilidade baixa de atingir a meta no prazo	18	0	18	49%
Total	30	7	37	

Fonte: UGP/IPECE.

Gráfico 4: Status de Cumprimento das Metas dos Indicadores.

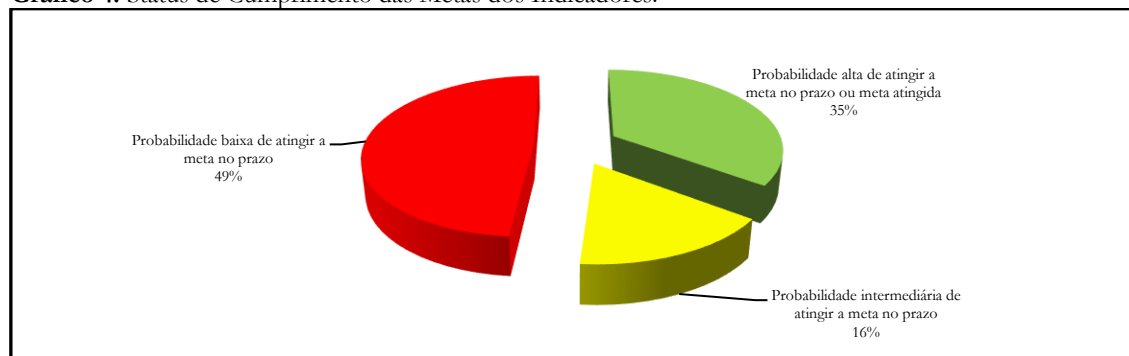

Fonte: UGP/IPECE.

Indicadores PDO

Quadro 13: Indicadores PDO – **SRH e COGERH** – Nome do Indicador (1): Percentagem de Usuários Estratégicos da Água Regularizados - COGERH.

Subprojeto associado: Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato em Execução (Contrato nº 066/2022/COGERH)	
- O Serviço de cadastro e regularização de usuários estratégicos das 12 bacias hidrográficas do estado, atualmente encontra-se 28,6% concluído; - Entregues até o momento 4 produtos referentes à Consultoria contratada; - Produzida Nota Técnica com definições de “Usuários Estratégicos” e “Regularizados” e estratégias do Estado para o alcance da meta de 80% dos usuários regularizados; - Aceita a proposta de isenção de pagamento do DAE no âmbito do Projeto de Regularização das 12 Regiões Hidrográficas do Estado do Ceará.	
Metas	Prazo
Meta: 80	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 14: Indicadores PDO – **SRH e CAGECE** – Nome do Indicador (2): Continuidade dos Sistemas Hídricos Abastecidos com Água do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central – CAGECE.

Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: 70	
Status: Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH)	
Observação: Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23. Design (projeto executivo) da Captação e ETA aprovado pelo Engenheiro em 21/06/23, que permitiu o início das obras civis na mesma data.	
Metas	Prazo
Meta: 90	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 15: Indicadores PDO – **CAGECE** – Nome do Indicador (5): Redução da Água Não Geradora de Receita na Cidade de Fortaleza (litros/conexões/dia) (número) – CAGECE.

Subprojeto associado: Controle e Redução de Perdas	
Linha de base: 469	
Status: Contratos nº 0059/2023 (Lote II) e 0093/2023 (Lote I) em execução, desde 06/05/23 e 06/06/23, respectivamente	
Lote I: 093/2023 Restor/Enops	
Lote II: 0059/2023 Telar/Enorsul/BBL	
Observação:	
Metas	Prazo
Meta: 317	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 16: Indicadores PDO – **IPECE** – Nome do Indicador (3): Pessoas Beneficiadas com Serviços Hídricos mais confiáveis – CAGECE.

Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH)	
Observação: Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23. Design (projeto executivo) da Captação e ETA aprovado pelo Engenheiro em 21/06/23, que permitiu o início das obras civis na mesma data.	
Metas	Prazo
Meta: 118.490	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 17: Indicadores PDO – **IPECE** – Nome do Indicador (4): Mulheres beneficiadas com Serviços Hídricos mais confiáveis – IPECE.

Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central	
Linha de base: 0	
Status: Contrato nº 01/2022/SRH – Em Execução	
Observação: Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23. Design (projeto executivo) da Captação e ETA aprovado pelo Engenheiro em 21/06/23, que permitiu o início das obras civis na mesma data.	
Metas	Prazo
Meta: 61.615	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

▪ Indicadores Intermediários - Componente I: Aumento da Segurança Hídrica

Quadro 18: Indicadores de Resultado Intermediário – **FUNCEME** – Nome do Indicador (6): Sistema de Previsão Climática Fortalecido – FUNCEME.

Subprojeto associado: Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de aflúências aos principais reservatórios do Estado.	
Linha de base: Sistema de Previsão Climática baseado em um modelo climático global, atualizado mensalmente.	
Status: Contrato nº 10/2023 em Execução - VERSATUS HPC, INC.	
Observação: Foi realizada uma revisão na redação dos parâmetros do Indicador. Meta intermediária 01 atingida. Enquanto não é possível apresentar as previsões de aflúências em periodicidade quinzenal, estas vêm sendo apresentadas em periodicidade mensal, com divulgação restritas aos órgãos do setor de recursos hídricos, pela natureza sensível da informação e por se tratar de um Projeto em maturação; Previsão de Fornecimento e instalação em 31/05/2024;	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.	15/06/2021
Meta Final: revisão de aflúência de água para os reservatórios estratégicos do Estado gerada duas vezes ao mês, no período de dezembro a abril, com base em dois modelos climáticos globais (ECHAM e CAM). Previsão de cumprimento da Meta Final em 15/12/2024.	15/06/2022

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 19: Indicadores de Resultado Intermediário – **SRH e COGERH** – Nome do Indicador (7): Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição – COGERH.

Subprojetos associados:	
1. Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da macromedição da COGERH; 2. Serviços de instalação das Estações de Medição Fixas.	
Linha de base: 7	
Status: 1. Executado e entregue as Estações de Medição Fixas; 2. Contrato nº 010/2023/COGERH - Em Execução (medições 1 e 2 pagas referentes aos serviços de instalação de medidores de vazão fixos ultrassônicos, medidores de vazão doppler e medidores de vazão eletromagnéticos, de sistema de geração fotovoltaico offgrid, de sistemas de telemetria e integração de dados ao sistema de supervisão, com fornecimento de material).	
Observação: - Número de macromedidores instalados para os grandes usuários (SAAE, CAGECE, grandes indústrias, grandes irrigadores) / total de grandes usuários da água registrados. - Produtida nota técnica apresentando a política de medição da COGERH - Previsão da Meta ser superada em setembro de 2024; - Medição atual: 25,1%	
Metas	Prazo
Meta final: 75	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 20: Indicadores de Resultado Intermediário – **SRH e COGERH** – Nome do Indicador (8): Maior capacidade de tratamento da água na região do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central - SRH/CAGECE.

Subprojeto associado: Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato em execução (Contrato nº 01/2022/SRH)	
Observação: - Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23; - Capacidade refere-se às estações de tratamento de água da CAGECE nos municípios de Senador Pompeu (110 m³/h), Piquet Carneiro (110 m³/h), Mombaça (220 m³/h) e Jaguaratama (110 m³/h).	
Metas	Prazo
Meta: 1.900 m³/h	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 21: Indicadores de Resultado Intermediário – **IPECE, SRH e CAGECE** – Nome do Indicador (9): Redução do tempo perdido de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água - IPECE, SRH e CAGECE.

Subprojeto associado: 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central; 2. Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	
Linha de base: "Para mulheres - 3,48 dias / ano Para homens - 3,15 dias / ano"	
Status: 1. Contrato nº 01/2022/SRH em execução; 2. Contrato nº 05/2023 em execução.	
Observação: 1. Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23; 2. Contrato firmado com o Instituto Olhar Pesquisa e Informação Estratégica, Haverá uma nova contratação em 2025 para realização da pesquisa de seguimento. Foi proposta pelo BM a realização de uma outra pesquisa a ser realizada pela Empreiteira exclusiva com a população que irá receber as palestras sobre a temática de gênero, para captar a percepção dessa população antes e depois das palestras.	
Metas	Prazo
Meta: Redução da diferença em 20%	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 22: Indicadores de Resultado Intermediário – **IPECE, SRH e CAGECE** – Nome do Indicador (10): Redução do tempo dedicado a tarefas domésticas (incluindo a busca de água para o domicílio) - IPECE, SRH e CAGECE.

Subprojeto associado: 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central; 2. Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do sistema adutor Banabuiú:	
Linha de base: "Para mulheres- 18,1 horas/semana Para homens – 10,5 horas/semana"	
Status: 1. Contrato nº 01/2022/SRH em execução; 2. Contrato nº 05/2023 em Execução.	
Observação: 1. Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23; 2. Contrato firmado com o Instituto Olhar Pesquisa e Informação Estratégica, Haverá uma nova contratação em 2025 para realização da pesquisa de seguimento. Foi proposta pelo BM a realização de uma outra pesquisa a ser realizada pela Empreiteira exclusiva com a população que irá receber as palestras sobre a temática de gênero, para captar a percepção dessa população antes e depois das palestras.	
Metas	Prazo
Meta: Redução da diferença em 10%	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 23: Indicadores de Resultado Intermediário – **IPECE, SRH e CAGECE** – Nome do Indicador (11): Nível de satisfação dos beneficiários com o fornecimento de serviços hídricos - IPECE, SRH, CAGECE.

Subprojeto associado: 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central; 2. Pesquisa domiciliar na área de abrangência dos municípios do sistema adutor Banabuiú:	
Linha de base: 0	
Status: 1. Contrato nº 01/2022/SRH em execução; 2. Contrato nº 05/2023 em Execução.	
Observação: 1. Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) elaborado e aprovado. Licença de Instalação (LI) emitida em 01/11/2022. Plano de Gestão Socioambiental – PGS) aprovado pelo Banco em 30/05/23. PRI do Setor 1 aprovado pelo Banco em 14/06/23; 2. Contrato firmado com o Instituto Olhar Pesquisa e Informação Estratégica, Haverá uma nova contratação em 2025 para realização da pesquisa de seguimento. Foi proposta pelo BM a realização de uma outra pesquisa a ser realizada pela Empreiteira exclusiva com a população que irá receber as palestras sobre a temática de gênero, para captar a percepção dessa população antes e depois das palestras.	
Metas	Prazo
Meta: 90%	31/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 24: Indicadores de Resultado Intermediário – **CGE** – Nome do Indicador (12): Queixas e consultas recebidas através do Mecanismo de Reparação de Queixas registradas e solucionadas – OUVIDORIA GERAL/ UGP/ SRH/ CAGECE.

Subprojeto associado: 1. Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central; 2. Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	
Linha de base: 0	
Status: Contratos nº 0059/2023 (Lote II) e 0093/2023 (Lote I) em execução, desde 06/05/23 e 06/06/23, respectivamente: Lote I: Restor/Enops; Lote II: Telar/Enorsul/BBL.	
Observação: - Realizada a primeira reunião de treinamento sobre o uso da Plataforma Ceará Transparente das equipes da Empreiteira do SAB – SC com os seguintes encaminhamentos: - SRH: A Gestão da SRH deverá ser informada sobre os assuntos relacionados a ouvidoria. - CGE: Perfil Operador Interno: Empreiteiro e Engenheiro devem enviar comunicação para a SRH solicitando a criação do Perfil e informando os dados de quem deve receber o acesso. - CGE: Elaboração do Manual do Operador Interno pela CGE, bem como realização de treinamento para os operadores. - Empreiteiro: Haverá um balcão de atendimentos fixo no setor principal da obra e haverá uma ouvidoria itinerante que acompanhará os trechos a serem percorridos. - Empreiteiro: Haverá a criação de Comissões em cada município envolvido para acompanhamento das atividades. Dessa comissão deve participar o setor público, comércio, sociedade civil, etc; - CGE/SRH: A manifestação que for cadastrada pelo Operados Interno será direcionada a SRH. Manifestação registrada e finalizada dentro do prazo legal na Plataforma Ceará Transparente.	
Metas	Prazo
Meta Final: 90	30/12/2026

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 25: Indicadores de Resultado Intermediário – **SRH e COGERH** – Nome do Indicador (13): Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.

Subprojetos associados: 1. Paineis de especialistas em segurança de barragens; 2. Planos de Segurança das Barragens; 3. Base de dados para armazenamento de dados com Alertas Automatizados; 4. Obras de Reabilitação do Banabuiú: Em execução pelo DNOCS.	
Linha de base: Nenhuma atividade implementada.	
Status: 1. Contratos em execução (Especialista em Hidromecânica, Hidrologia e Geotécnico); 2. Contrato nº 072/2022 - COGERH em execução; 3. Contrato em execução (com recursos próprios da COGERH); 4. Contrato em execução (com recursos do DNOCS).	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.	31/12/2020
Observação: 1. Entregues os seguintes produtos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5; 2. Enviada ao DNOCS a minuta do Acordo de Cooperação Técnica. Produtos relacionados ao aerolevantamento e à inspeção de segurança foram realizadas no prazo. O plano de investigação também foi enviado e encontra-se na Gesin para avaliação, posteriormente será enviado para o Painel de Consultores da SRH para aprovação. 3. Contratação com recursos próprios da COGERH; 4. Obras de Reabilitação do Banabuiú: Em execução pelo DNOCS - (RELATÓRIO MENSAL DE SUPERVISÃO Nº 09): a) Construção (Consórcio Conpate/Britânia): Em licitação serviços de instalação das comportas da Tomada d'água, e aquisição e montagem das válvulas dispersoras e viga pescadora; b) Gerenciamento e Supervisão técnica (GEOTECHNIQUE): Ordem de Paralisação do referido contrato enquanto aguardam a conclusão da licitação referente obra.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida. Previsão de cumprimento em 09/2024.	31/12/2021
Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Ação para Emergência - PAE). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados. Previsão de cumprimento em 08/2023.	30/12/2022
Meta Intermediária 04: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú finalizados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Ação para Emergências - PAE). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas. Previsão de cumprimento em 05/2024.	29/12/2023
Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas. Previsão de cumprimento em 12/2023.	31/12/2024

Fonte: UGP/IPECE.

- Indicadores Intermediários - Componente II: Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Quadro 26: Indicadores de Resultado Intermediário – **CAGECE** – Nome do Indicador (14): Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza – CAGECE.

Subprojeto associado:	
1. Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06)	
2. Supervisora da Obra - ATO	
Linha de base: 0	
Status:	
1. Obras:	
Lote I: (Restor/Enops): Contrato nº 093/2023;	
Lote II (Telar/Enorsul/BBL): Contrato nº 059/2023;	
2. ATO:	
Contrato em execução (nº 051/2023).	
Observação:	
Metas revisadas pela CAGECE de acordo com Nota Técnica em 29/09/2022:	
Meta intermediária 1: fevereiro 2024;	
Meta intermediária 2: junho de 2024;	
Meta final: outubro de 2024.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: 9 (Previsão de cumprimento em 02/2024)	31/12/2021
Meta Intermediária 02: 18 (Previsão de cumprimento em 06/2024)	30/12/2022
Meta final: 44 (Previsão de cumprimento em 10/2024)	31/12/2023

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 27: Indicadores de Resultado Intermediário – **CAGECE** – Nome do Indicador (15): Proposta de revisão da estrutura tarifária para serviços hídricos finalizada, aprovada pelo Conselho Administrativo e apresentada às agências reguladoras - CAGECE/ GECOR.

Subprojeto associado: 1. Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária	
Linha de base: Estrutura tarifária não revisada.	
Status: 1. Contrato nº 201/2021 – CAGECE – Concluído.	
Observação: Estudo apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração da Cagece.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.	31/12/2020
Meta Intermediária 02: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.	30/12/2022
Meta Intermediária 03: Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.	30/06/2023
Meta final: Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.	28/06/2024

Fonte: UGP/IPECE.

- Indicadores Intermediários - Componente III: Fortalecimento da Gestão do Setor Público

Quadro 28: Indicadores de Resultado Intermediário – **SEPLAG** – Nome do Indicador (16): Sistema de Gestão de Investimentos Públicos Implementado e em Operação – SEPLAG.

Subprojeto associado: 1. Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará; e 2. Aquisição de mobiliário e equipamentos de TIC para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	
Linha de base: Nenhum sistema	
Status: 1. Contrato nº 018/2022/SEPLAG em execução; 2. Aquisição de Equipamentos de TI: Contratos 02/2023 – DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e 03/2023 – TORINO INFORMÁTICA em Execução; Aquisição de Mobiliário: Contrato nº 022/2023 - ESL LICITA COMÉRCIO E SERVIÇOS em Execução; e Aquisição de equipamentos: Processo em análise na PGE, com posterior publicação do Edital de Pregão Eletrônico.	
Observação: 1. Até o presente momento o Consórcio procedeu a entrega dos produtos: - Plano de Gerenciamento do Projeto; - Plano de Revisão da Metodologia; - Relatório de Análise da Metodologia; - Documentação da Metodologia Revisada.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários. Previsão de cumprimento em 07/2024	30/12/2022
Meta Intermediária 02: 10% dos novos projetos da SDA analisados através do sistema.	31/12/2024
Meta final: 20% dos novos projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.	31/12/2025

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 29: Indicadores de Resultado Intermediário – **TCE** – Nome do Indicador (17): Percentagem de Obras Públicas Monitoradas.

Subprojeto associado: 1. Consultoria Técnica Especializada para desenvolver e Aplicar Estratégias e Instrumentos Tecnológicos de Informação e Comunicação para Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Obras para Atender às Necessidades e Procedimentos do Controle Externo no Âmbito das Obras Estaduais e Municipais; 2. Aquisição de mobiliário de equipamentos de TIC para estruturação da área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	
Linha de base: 0	
Status: 1. TCE concluiu o desenvolvimento do sistema de monitoramento de obras, denominado e-Obras em 23/06/2023; e 2. Contrato nº 018/2022 em Execução.	
Observação: 1. TCE concluiu o desenvolvimento do sistema de monitoramento de obras, denominado e-Obras em 23/06/2023.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.	30/06/2023
Meta Intermediária 02: 70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.	28/06/2024
Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.	30/06/2025

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 30: Indicadores de Resultado Intermediário – **ARCE** – Nome do Indicador (18): Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada.

Subprojeto associado: 1. Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	
Linha de base: 0	
Status: Contrato assinado. ARCE providenciando a publicação e posterior emissão da ordem de serviço.	
Observação: Considerando o atraso no processo de contratação é prudente indicar uma extensão de 15 (quinze) meses do referido prazo, fixando-o em 31 de dezembro de 2024.	
Metas	Prazo
Meta Final: 1. Previsão de cumprimento em 12/2024	30/06/2023

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 31: Indicadores de Resultado Intermediário – **IPECE** – Nome do Indicador (20): Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico para o desenho de políticas nos setores hídrico e de agronegócios, através de pesquisa mediante demanda.

Subprojeto associado: 1. Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB; 2. Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água; 3. Estudo inter- e intra-setorial de demanda utilizando o modelo de entrada e saída (input output).	
Linha de base: Nenhum índice	
Status: 1. Contrato nº 08/2022 - em Execução	
Observação: 1. Entregues os Produtos 1, 2 e 3. A Publicação dos estudos 1 e 2 está condicionada a atualização de Matriz Insumo-Produto do Ceará e das Contas Satélites do Agronegócio e da Agricultura Familiar, ambas contempladas na Consultoria Metodológica do Cálculo do PIB do agronegócio. Prazos das metas factíveis de acordo com IPECE; Foi acordado durante a Missão de Revisão de Meio Termo que o IPECE abrirá um processo seletivo de consultor individual para dar apoio à Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE na área relacionada aos Estudos propostos nas metas do referido Indicador.	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.	30/06/2021
Meta Intermediária 02: Estudo de cadeias produtivas com enfoque na produção de uso intenso da água finalizado. Previsão de cumprimento em 12/2023	29/12/2023
Meta final: Estudo inter- e intra-setorial de demanda utilizando o modelo de entrada e saída (input output) finalizado. Previsão de cumprimento em 12/2024	31/12/2024

Fonte: UGP/IPECE.

Quadro 32: Indicadores de Resultado Intermediário – **CGE** – Nome do Indicador (19): Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.

Subprojeto associado: 1. Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	
Linha de base: Nenhum índice	
Status: Contrato nº 07/2022 - em Execução	
Observação: 1. Foram entregues os seguintes Produtos: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 e 3.2. A partir da entrega do mapeamento das funcionalidades do sistema (2º produto) serão iniciados debates entre as equipes da CGE e Consultora para produção da Metodologia de cálculo (Meta 01).	
Metas	Prazo
Meta Intermediária 01: Metodologia de cálculo definida incluindo critérios de avaliação a serem estabelecidos pelas instituições que usarão o sistema conjuntamente com a empresa contratada. Previsão de cumprimento em 10/2023	30/06/2023
Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema. Previsão de cumprimento em 6/2025	30/06/2025

Fonte: UGP/IPECE.

VIII. PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ IPF

Alice Menezes (UGP/IPECE) – A próxima reunião do Comitê será realizada no dia 01 de novembro de 2023 no formato virtual.

XIX. ENCERRAMENTO

Alice Menezes (UGP/IPECE) – Finalizou a reunião, agradecendo a disponibilidade e presença de todos.

IX. ANEXOS E APÊNDICES

Apêndice 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações nas Reuniões.

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê Intersetorial de Segurança Hídrica e Governança de Janeiro/2020 a Agosto/2023

