







31ª REUNIÃO DO COMITÊ Projeto de Segurança Hídrica e Governança

26 de junho de 2025

Projeto de Apoio à Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará (2019 a 2026)

PAUTA DA REUNIÃO





- 1. Aprovação da Ata da 30ª Reunião do Comitê;
- 2. Informações Importantes;
- 3. Pontos Críticos da Execução Diagnóstico, Riscos e Recomendações;
- 4. Gerenciamento Financeiro;
- 5. Atividades de Assistência Técnica;
- 6. Indicadores; e
- 7. Apresentação dos Resultados.





1. APROVAÇÃO DA ATA

30ª Reunião do Comitê (24/04/2025)

E-mail enviado em: 04/06/2025





2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES





- 1. Solicitação de Nota Técnica Relatório de Desempenho IPF/CE (1º semestre de 2025):
 - Envio das informações até o dia 30/6/2025 (segunda-feira);
 - Envio das informações Socioambiental até o dia 11/7/2025 (sexta-feira).
- 2. Alteração dos Membros do Comitê;
- 3. Auditoria do TCE; e
- 4. Previsão da Missão do Banco Mundial: 20 a 24 de outubro de 2025.





3. PONTOS CRÍTICOS DA EXECUÇÃO

Diagnóstico, Riscos e Recomendações

PONTOS CRÍTICOS DA EXECUÇÃO

iPECE STORY 22



DIAGNÓSTICO, RISCOS E RECOMENDAÇÕES

Situação Atual do Projeto - Banco Mundial

Item	Avaliação (abr/2025)
Objetivo de Desenvolvimento (PDO)	Moderadamente Satisfatório
Implementação (IP)	Moderadamente Insatisfatório
Contrapartida	Moderadamente Insatisfatório
Gestão Financeira	Satisfatória
Salvaguardas	Moderadamente Satisfatório
Término do Projeto	31 de dezembro de 2026

PONTOS CRÍTICOS DA EXECUÇÃO





DIAGNÓSTICO, RISCOS E RECOMENDAÇÕES



• Foco do Comitê: Ações Corretivas, Mitigação de Riscos e Engajamento Institucional Reforçar o papel dos membros do Comitê como agentes estratégicos na definição e acompanhamento de ações mitigatórias e, sobretudo, no engajamento direto com os gestores responsáveis pela implementação das soluções;

• Alertar para as sanções financeiras e contratuais; e

• Apresentar os principais pontos críticos de execução do Projeto, com foco nos gargalos que podem comprometer o desempenho global e os desembolsos.





1. SRH / SEPLAG

1.1. Contrapartida Estadual – Ação Prioritária



PREVISÃO DE CONTRAPARTIDA

Valor total previsto para 2025 é de R\$ 90 milhões, sendo:

- R\$ 30 milhões já deliberados pelo COGERF.
- Existe nova solicitação de R\$ 40 milhões ao COGERF.



RISCO DE REBAIXAMENTO

O Banco Mundial alertou que a classificação do Projeto poderá ser rebaixada caso não haja avanço na alocação da contrapartida até o final de maio.





2. SRH

2.1. PGS - Setores 2 e 3



PRAZO DE ENVIO ACORDADO

30/05/2025.



AÇÕES REALIZADAS

Documento está sendo revisado pela Empreiteira após revisão do Engenheiro.



RECOMENDAÇÃO

Envio do Documento Revisado até 30/6/2025





2. SRH

2.2. PSRI – Setor 2 e 3



PENDÊNCIAS

SETOR 2:

Relatório de Implementação a ser enviado ao Banco.

SETOR 3:

Finalização do Documento.



RISCO

Impossibilidade legal de iniciar obras.



RECOMENDAÇÃO

Validar com PGE (Setor 3) e resolver pendências fundiárias (Setor 2).





3. COGERH

3.1. Contratação para Plano de Segurança das Barragens.



AÇÕES REALIZADAS

Edital de SDP aprovado pelo Banco em 25/5/2025, com previsão de lançamento pela PGE em 27/6/2025.



RISCO

Ações corretivas formais por parte do Banco Mundial devido ao descumprimento de cláusula do Acordo de Empréstimo.



RECOMENDAÇÃO

Acompanhar junto à PGE e garantir o cumprimento do plano de ação acordado com o Banco.





4. CAGECE

4.1. DMC



APORTE

Expectativas dos Próximos Pagamentos.



SOCIOAMBIENTAL

Atividades Pós Obra.



PAPER

Lições Aprendidas (lote 1).





5. IPECE

5.1. Pesquisas Domiciliares – SAB-SC



Agendar cronograma com o Banco e garantir execução da T2 (2025) e T3 (2026).



RISCO

Falha na avaliação de impacto e nos PDOs sociais.



RECOMENDAÇÃO

Licitar com antecedência; encerrar até dez/2026.





6. SCIDADES

6.1. PAAES



PRAZO DE EXECUÇÃO

Vigência do contrato (12/11/26) muito próxima do final do Acordo de Empréstimo.



RISCO

Devolução de Recursos.



RECOMENDAÇÃO

Acompanhamento estreito entre contratado e contratante; Celeridade na aprovação dos Produtos.





DESEMBOLSOS







Valor do Empréstimo USS

US\$139.880.000,00

Valor da Contrapartida


US\$ 34.970.000,00

Taxa Front-end Fee

US\$ 349.700,00

DESCRIÇÃO	DATA VALOR US\$		% DO EMPRÉSTIMO
VALOR DO EMPRÉSTIMO		139.880.000,00	100,00%
TAXA DE ABERTURA (FROM	NT-END FEE)	349.700,00	0,25%
DESEMBOLSOS REALIZADO	106.493.545,49	76,13%	
1º e 2º Desembolso	2020	1.539.864,78	1,10%
3º e 4º Desembolso	2021	2.390.035,96	1,71%
5º a 7º Desembolso	2022	16.388.752,65	11,72%
8º a 10º Desembolso	2023	12.955.690,21	9,26%
11º e 12º Desembolso	2024	66.892.888,79	47,82%
13º Desembolso	2025	6.326.313,10	4,52%
DESEMBOLSOS A RI	33.036.754,51	23,62%	

Desembolsos (US\$)

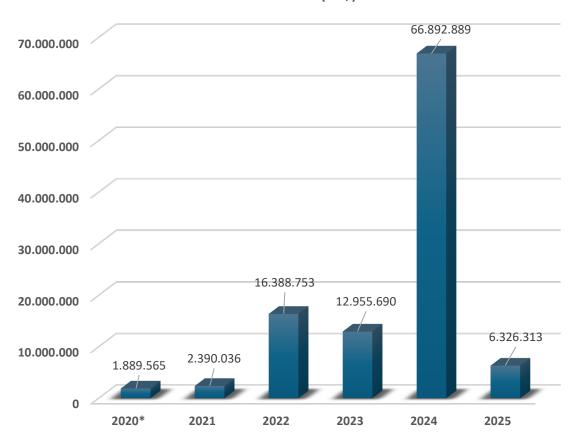

^{*} Inclui a Taxa de abertura (Front-end fee)

SALDO DA CONTA OPERATIVA


SALDO CONTA OPERATIVA EM ABRIL/2025 (US\$)						
VALOR DESEMBOLSADO	106.493.545,49					
VALOR EXECUTADO ATÉ 24/06/2025	104.800.147,41					
SALDO DESEMBOLSADO A EXECUTAR	1.693.398,08					

SALDO CONTA OPERATIVA EM ABRIL/2025 (R\$)						
VALOR DESEMBOLSADO EM REAIS	563.619.999,16					
VALOR EXECUTADO ATÉ 24/06/2025	553.815.224,27					
SALDO DESEMBOLSADO A EXECUTAR	9.804.774,88					





Desembolsado a Executar x Executado (R\$)

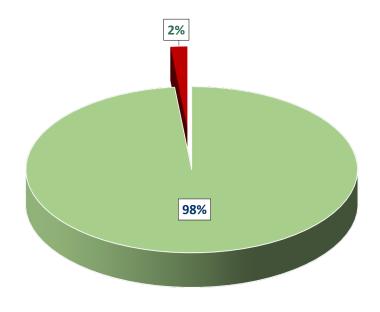

Valor Executado até 24/06/2025

■Saldo desembolsado a executar

DESEMBOLSO X EMPENHOS (R\$)





PERÍODO	DESEMBOLSADO	SALDO INTERNALIZAÇÃO	EMPENHADO	SALDO FINANCEIRO ACUMULADO				
2020	8.177.297,92	8.177.297,92	2.420.219,32	5.757.078,60				
2021	13.013.218,72	18.770.297,32	12.675.205,32	6.095.092,00				
2022	84.524.326,79	90.619.418,79	74.831.894,00	15.787.524,79				
2023	65.386.901,37	81.174.426,16	79.209.021,96	1.965.404,20				
2024	355.888.901,50	357.854.305,70	337.888.788,61	19.965.517,09				
2025	36.629.352,85	56.594.869,94	84.155.319,28	-27.560.449,34				
	AMORTIZAÇ	ÕES		34.711.768,46				
	SALDO LIVRE PRA EMPENHO							
V	VALORES EMPENHADOS E NÃO PAGOS							
	SALDO - CONTA BANCÁRIA							

SUMÁRIO – LOA, EMPENHOS E PAGAMENTOS 2025 EM R\$





SETORIAL	LEI + CRÉDITO (A)	VALOR EMPENHADO (B)	SALDO (A) – (B)	% (B)/(A)
ARCE	304.000,00	134.370,00	169.630,00	44,20%
CAGECE	15.718.711,26	823.713,91	14.894.997,35	5,24%
CGE	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
FUNCEME	115.000,00	34.669,05	80.330,95	30,15%
IPECE	2.277.530,71	1.696.911,59	580.619,12	74,51%
SCIDADES	2.010.132,00	-	2.010.132,00	0,00%
SEPLAG	57.932,00	-	57.932,00	0,00%
SRH	192.656.854,86	79.042.897,59	113.613.957,27	41,03%
COGERH	7.330.000,00	2.422.757,14	4.907.242,86	33,05%
TCE	-	-	-	
TOTAL	220.480.160,83	84.155.319,28	136.324.841,55	38,17%

RESTOS A PAGAR





SETORIAL	CONTRATOS	EMPENHADO	PAGO	SALDO
(\(\(\(\(\) \) \)	Engenheiro: Consórcio Igneo Ingeniería Sostenible, S.L., Nip Global Ltda e Concremat Engenharia E Tecnologia S.A	2.455.958,62	2.424.838,15	31.120,47
	Jean-Michel Marcel Albert Martinez	206.818,84	115.262,20	91.556,64
FUNCEME	Maestria Comunicação e Eventos Ltda	132.615,00	119.595,00	13.020,00
	Squitter Equipamentos Profissionais do Brasil Ltda	6.900.636,78	5.367.161,94	1.533.474,84
	TOTAL	9.696.029,24	8.026.857,29	1.669.171,95

LOA – PREVISÃO DE GASTOS 2025 – SUPLEMENTAÇÃO 2025 EM R\$





SETORIAL	nº	Total Previsto		Orçamento 2025		
SLIONIAL	"-	para 2025		Ação	LEI+CRÉDITO	Valor a Suplementar
ARCE	1	513.247,96	11788	Assistência Técnica E Estudos Regulatórios (IPF - Comp. III).		209.247,96
SCIDADES	2	2.593.459,12	11177	Elaboração de Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF - comp III).	2.010.132,00	583.327,12
TOTAL		3.106.707,08			2.314.132,00	792.575,08

EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS










EXECUÇÃO FINANCEIRA – 93 CONTRATOS

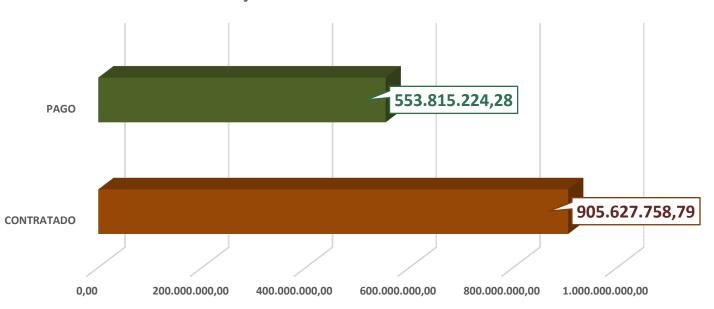

EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS





SI	ETORIAL	Nº DE ATIVIDADES	Nº DE CONTRATOS	Nº CONTRATOS EM EXECUÇÃO	CONTRATOS RESCINDIDOS	Nº CONTRATOS CONCLUÍDOS	VALOR CONTRATADO + PATRONAL FONTE BIRD (R\$)	VALOR PAGO (R\$) ATÉ 24/06/2025	VALOR PAGO CONTRAPARTIDA (R\$)	SALDO A PAGAR (R\$)	% PAGO SETORIAL
1	ARCE	3	3	1		2	3.991.382,50	3.612.504,55		378.877,95	90,51%
2	CAGECE	5	6	4		2	80.679.148,52	64.738.658,52		15.940.490,00	80,24%
3	CGE	1	1	0		1	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	100,00%
4	CIDADES	2	2	1		1	5.962.594,76	784.680,00		5.177.914,76	13,16%
5	COGERH	6	13	1		12	24.668.040,65	23.673.802,53		994.238,12	95,97%
6	FUNCEME	13	23	3		20	23.366.275,43	21.664.574,44		1.701.700,99	92,72%
7	IPECE	14	20	6	1	13	10.445.374,66	9.250.731,66		1.194.642,99	88,56%
8	SDE	3	3	0		3	5.780.028,94	5.780.028,94		0,00	100,00%
9	SEPLAG	2	7	0		7	2.433.078,35	2.433.078,35		0,00	100,00%
10	SRH	8	12	6	2	4	741.869.910,02	415.445.240,34	64.224.698,13	262.199.971,55	56,00%
11	TCE	2	3	0		3	2.431.924,95	2.431.924,95		0,00	100,00%
	TOTAL	59	93	22	3	68	905.627.758,78	553.815.224,28		287.587.836,36	61,15%

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA SRH





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ac Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	115.900,00	115.900,00	0,00	100%	Concluído
2	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú	PAULO TEIXEIRA DA CRUZ	109.657,86	109.657,86	0,00	100,00%	Rescindido
3	e Gavião: Especialista em Engenheiro Geotécnico.	MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR	293.607,72	196.494,21	97.113,51	66,92%	Em execução
4	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica.	JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA	354.866,04	175.438,52	179.427,52	49,44%	Em execução
5	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú	RONEI VIEIRA DE CARVALHO	178.413,77	178.413,77	0,00	100,00%	Rescindido
6	e Gavião: Especialista em Hidrologista.	PEDRO ANTÔNIO MOLINAS	285.426,62	54.948,84	230.477,78	19,25%	Em execução
	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central BIRD		544.808.132,50	398.152.195,28	146.655.937,22	73,08%	_ ~
7	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. CONTRAPARTIDA	abuiú - Sertão Central.	163.644.721,42	63.048.654,83	100.596.066,59	38,53%	Em execução

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA SRH





Nō	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
8	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.	CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL	30.986.397,14	30.986.397,14	15.492.104,90	50,00%	Em execução
9		R&T COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	43.586,97	43.586,97	0,00	100,00%	Concluído
10	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	E. R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	574.500,00	574.500,00	0,00	100,00%	Concluído
11		ENERGY TELECON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	59.499,99	59.499,99	0,00	100,00%	Concluído
	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO	415.200,00	292.500,00	122.700,00	70,45%	Em execução
	TOTAL		741.869.910,02	479.669.938,47	262.199.971,55	64.66%	

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA COGERH





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	LAMON PRODUTOS LTDA	654.900,00	654.900,00	0,00	100,00%	Concluído
2		NIVETEC INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA	1.509.999,90	1.509.999,90	0,00	100,00%	Concluído
3	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a universalização da Macromedição da COGERH.	ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	3.221.266,06	3.221.266,06	0,00	100,00%	Concluído
4	iviaciomedição da COGEKH.	LAMON PRODUTOS LTDA	1.481.999,95	1.481.999,95	0,00	100,00%	Concluído
5		SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	178.890,00	178.890,00	0,00	100,00%	Concluído
6		POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	13.803,66	13.803,66	0,00	100,00%	Concluído
7	Aquisição de equipamentos para uso	K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA	28.159,95	28.159,95	0,00	100,00%	Concluído
8	da Fiscalização de Recursos Hídricos.	GEO POSITION COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.380,00	48.380,00	0,00	100,00%	Concluído
9		NW DRONES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA	135.999,00	135.999,00	0,00	100,00%	Concluído
10		LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	197.019,00	197.019,00	0,00	100,00%	Concluído

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA COGERH





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
11	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA / REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA / IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA.	4.830.429,58	4.830.429,58	0,00	100,00%	Concluído
12	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas).	GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	95.131,62	95.131,62	0,00	100,00%	Concluído
	Instalação das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão.	CONSÓRCIO MLG E RC MEDIÇÕES	12.272.061,93	11.277.823,81	994.238,12	91,90%	Em execução
	TOTAL	24.668.040,65	23.673.802,53	994.238,12	95,97%		

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA FUNCEME





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	% Pago	STATUS
1	Aquisição de licença do ArcGis.	IMAGEM GEOSISTEMAS e COMÉRCIO LTDA	129.999,97	129.999,97	100,00%	Concluído
2		ALLCOMP COMP REP E IMPORTACAO AS	117.990,00	117.990,00	100,00%	Concluído
3		TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	48.900,00	48.900,00	100,00%	Concluído
4		J C DA SILVA & CIA LTDA	972.000,00	972.000,00	100,00%	Concluído
5	Aquisição de equipamentos para	ARBONNE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL DE ALTA TECNOLOGIA EIRELI	327.000,00	327.000,00	100,00%	Concluído
	instrumentação e monitoramento de bacias hidráulicas.	GEO ÁCQUA PRODUTOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA	12.000,00	12.000,00	100,00%	Concluído
6		J C DA SILVA & CIA LTDA	740.532,95	740.532,95	100,00%	Concluído
7		DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA EPP	949.799,88	949.799,88	100,00%	Concluído
8		FLOPTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	9.600,00	9.600,00	100,00%	Concluído
	Aquisição e Instalação de Plataforma: Automáticas de Coleta de Dado: Agrometeorológico.	SCAMPBELL SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	4.568.757,79	4.568.757,79	100,00%	Concluído
11	Monitoramento utilizando técnicas de modelagem hidrológica e de sensoriamento remoto dos pequenos açudes visando sua incorporação na estimativa de aporte aos reservatórios estratégicos do Estado.	SUP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	1.822.425,54	1.822.425,54	100,00%	Concluído

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA FUNCEME





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago	STATUS
12	Serviços de engenharia para instalação de estações meteorológicas.	CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA -ME	310.680,55	310.680,55	0,00	100,00%	Concluído
	Assessoria técnica à implementação do monitoramento da qualidade de água por sensoriamento remoto.	EJEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ	401.726,56	256.440,41	145.286,15	63,83%	Em execução
14	Capacitação e Treinamento de Técnicos da Funceme.	MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LDTA	256.345,00	233.405,00	22.940,00	91,05%	Em execução
15	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao	TORINO INFORMÁTICA	92.400,00	92.400,00	0,00	100,00%	Concluído
16	Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	440.410,00	440.410,00	0,00	100,00%	Concluído
17		GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT LTDA	509.350,00	509.350,00	0,00	100,00%	Concluído
18	Aquisição de Drones e desistemas (softwares) de processamento de imagens.	G DRONES COMERCIO E SERVICOS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS LTDA	32.800,00	32.800,00	0,00	100,00%	Concluído
19		SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00%	Concluído

COMPONENTE I – AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA FUNCEME





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago	STATUS
	, '	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	484.008,12	484.008,12	0,00	100,00%	Concluído
21	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluências aos principais reservatórios do Estado.	VERSATUS HPC	3.258.450,51	3.258.450,51	0,00	100,00%	Concluído
22	Pequenos serviços de engenharia para instalação dos equipamentos de monitoramento de bacias hidráulicas.	CONSTRUTORA ALVES SANTIAGO LTDA	192.724,36	192.724,36	0,00	100,00%	Concluído
23	Aquisição de Radar Polarimétrico de Banda SQUITTER EQUIPAMENTOS X. PROFISSIONAIS DO BRASIL LTDA		7.667.374,20	6.133.899,36	1.533.474,84	80,00%	Em execução
	TOTAL		23.366.275,43	21.664.574,44	1.701.700,99	92,72%	

COMPONENTE II – MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - CAGECE





Nō	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS	
1	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. QUANTUM DO BRASIL LTDA		1.054.474,31	1.054.474,31	0,00	100,00%	Concluído	
2	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão INSTITUTO PUBLIX PARA O		1.080.000,00	732.000,00	348.000,00	67,78%	Em execução	
3	Serviços de Engenharia Consultiva para CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e Técnica da Obra de Controle de Perdas no CONCREMAT ENGENHARIA E município de Fortaleza. TECNOLOGIA S.A		5.627.302,08	3.631.713,91	1.995.588,17	64,54%	Em execução	
4	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).	LOTE I - CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS (RESTOR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICA LTDA E ENOPS ENGENHARIA S/A)	35.968.278,07	I		13.596.901,83	81,10%	Em execução
5		LOTE II - CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL	35.968.278,07				Em execução	
6	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE. CONSÓRCIO FALCONI CONSULTORES S.A e EFFICO SANEAMENTO LTDA		980.816,00	980.816,00	0,00	100,00%	Concluído	
	TOTAL	80.679.148,52	64.738.658,52	15.940.490,00	80,24%			

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - ARCE





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	843.951,43	843.951,43	0,00	100,00%	Concluído
2	Elaboração de Manual de Controle Patrimonia Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	KROLL BRASIL LTDA	2.768.553,12	2.768.553,12	0,00	100,00%	Concluído
3	Melhoria de processos de controle, fiscalização e certificação de informações para regulação dos serviços de saneamento básico.	MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA	378.877,95	0,00	378.877,95	0,00%	Em execução
	TOTAL	3.991.382,50	3.612.504,55	378.877,95	90,51%		

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - CGE





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Controle de Instrumentos Contratuais	CONSÓRCIO: CONFIDERE INFORMÁTICA E	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	Concluído
	TOTAL		4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - IPECE





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.		7.068.152,07	6.030.750,38	1.037.401,69	85,32%	Em Execução
2	Aquisição de Licença FIDIC.		3.012,85	3.012,85	0,00	100,00%	Concluído
3	Consultor Individual para Serviço de Tradução do Edital Tipo "Turnkey" da Obra do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central	MARCO TULIO VASCONCELLOS REZENDE	58.651,66	58.651,66	0,00	100,00%	Concluído
4	Serviços Técnicos de Tradução para Documentos de Aquisições.	BRAZIL TRADUÇÕES, SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	967,08	967,08	0,00	100,00%	Concluído
5	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos Com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.		1.797.780,00	1.797.780,00	0,00	100,00%	Concluído
6	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional Do Instituto De Pesquisa E Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Inteligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV	1.180.490,00	1.023.248,69	157.241,31	86,68%	Em execução

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - IPECE





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
7		SPENCER COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	7.796,00	7.796,00	0,00	100,00%	Concluído
8		FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%	Concluído
9	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento	TORINO INFORMÁTICA	3.960,00	3.960,00	0,00	100,00%	Concluído
10	de Projetos.	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	51.780,00	51.780,00	0,00	100,00%	Concluído
11		NBR TELECOM LTDA	12.594,00	12.594,00	0,00	100,00%	Concluído
12		PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	6.236,00	6.236,00	0,00	100,00%	Concluído
13	Contratação de empresa especializada para realização de pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central	INSTITUTO OLHAR PESQUISA E INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA.	93.955,00	93.955,00	0,00	100,00%	Concluído
14	Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.		120.000,00	120.000,00	0,00	100,00%	Concluído
	TOTAL	10.445.374,67	9.250.731,66	1.194.643,00	88,56%		

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SCIDADES





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	Saldo a Pagar R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO	219.360,00	219.360,00	0,00	100,00%	Concluído
2	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	COBRAPE COMPANHIA BRAS DE PROJ E EMPREEN	5.743.234,76	565.320,00	5.177.914,76	9,84%	Em Execução
	TOTAL		5.962.594,76	784.680,00	5.177.914,76	13,16%	

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SDE





Nō	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Fornecimento e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR).		1.640.484,94	1.640.484,94	100,00%	Concluído
2	Levantamento cadastral de irrigantes e determinação de demanda hídrica para o setor agropecuário das bacias do baixo, médio e alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado.		2.339.544,00	2.339.544,00	100,00%	Concluído
3	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).		1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	Concluído
	TOTAL		5.780.028,94	5.780.028,94	100,00%	

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SEPLAG





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	% Pago Setorial	STATUS
1	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	CONSÓRIO MTC: MACROPLAN – PROSPECTIVA, ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA. / TRANSPLAN – PLANEJAMENTO E PROJETOS S.A. / J C M FREITAS–SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (CHERRY IT)	2.317.264,82	2.317.264,82	100,00%	Concluído
2		TORINO INFORMÁTICA	6.600,00	6.600,00	100,00%	Concluído
3		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.500,00	39.500,00	100,00%	Concluído
	Aquisição de equipamentos para estruturação da área de Gestão de	ESL LICITACOMPERCIO E SERVIÇO	51.749,56	51.749,56	100,00%	Concluído
5	Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	NBR TELECOM (PEDRO HENRIQUE TENANI)	13.994,00	13.994,00	100,00%	Concluído
6		R.A SOLUCOES LTDA	3.220,00	3.220,00	100,00%	Concluído
7	FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA		749,97	749,97	100,00%	Concluído
	TO	ΓAL	2.433.078,35	2.433.078,35	100,00%	

COMPONENTE III – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - TCE





Nº	Atividade	Nome do Fornecedor / Consultor	Valor Contratado + Patronal R\$	Valor Pago R\$	% Pago Setorial	STATUS
	Aquisição de equipamentos (Vant's), software e treinamento para auditoria e monitoramento de obras	EMPRESA DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	52.740,00	52.740,00	100,00%	Concluído
	de infraestrutura hídrica.	DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS ELRELI	12.980,00	12.980,00	100,00%	Concluído
	Aquisições de Equipamentos para desenvolver solução de monitoramento de obras de engenharia que consiste na elaboração de uma base analítica composta de mecanismo de coleta de dados e painéis de monitoramento de obras de engenharia por meio da tecnologia de Business Intelligence e aplicação de modelos de Machine Learning.	LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A	2.366.204,95	2.366.204,95	100,00%	Concluído
	TOTAL	2.431.924,95	2.431.924,95	100,00%		





5. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA









02 OBRAS



32 CONSULTORIAS



08 SERVIÇOS



17 BENS



59 ATIVIDADES

TEMPO DISPONÍVEL ATÉ ENCERRAMENTO DO IPF = 31/12/2026

Total



18 meses





09	Baixo – até 06 meses
11	Médio - de 07 a 12 meses
06	Alto - acima 12

ATIVIDADES A CONTRATAR - RISCO





	Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividade	Previsão de Assinatura	RISCO
COMPONENTE 1	1	COGERH	i (nncilitaria	Serviços Especializados de Engenharia para Complementação dos Planos de Segurança das Barragens Gavião e Arrojado Lisboa.	Set/25	
COMPONENTE 3	2	IPECE		Serviços para Realização de duas Pesquisas Domiciliares na área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	Nov/25	

Baixo – até 06 meses
Médio - de 07 a 12 meses
Alto - acima 12

ATIVIDADES CONTRATADAS - RISCO





	Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividades					
11	1	SRH	Obra	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.					
COMPONENTE	2	SRH	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central.					
CON	3	COGERH	Serviços	Instalação das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão.					
NENTE 2	4	CAGECE	Obra	ontrole e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 5).					
COMPONENTE	5	CAGECE	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza.					
COMPONENTE 3	6	SCIDADES	Consultoria	erviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento anitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.					

Baixo – até 06 meses

Médio - de 07 a 12 meses


Alto - acima 12

NÚMERO DE ATIVIDADE X ATIVIDADES CONTRATADOS





	SRH	COGERH	FUNCEME	CAGECE	CIDADES	ARCE	CGE	IPECE	SDE	SEPLAG	TCE	TOTAL
Nº DE ATIVIDADES	8	6	13	5	2	3	1	14	3	2	2	59
ATIVIDADES CONTRATADAS	8	5	13	5	2	3	1	13	3	2	2	57

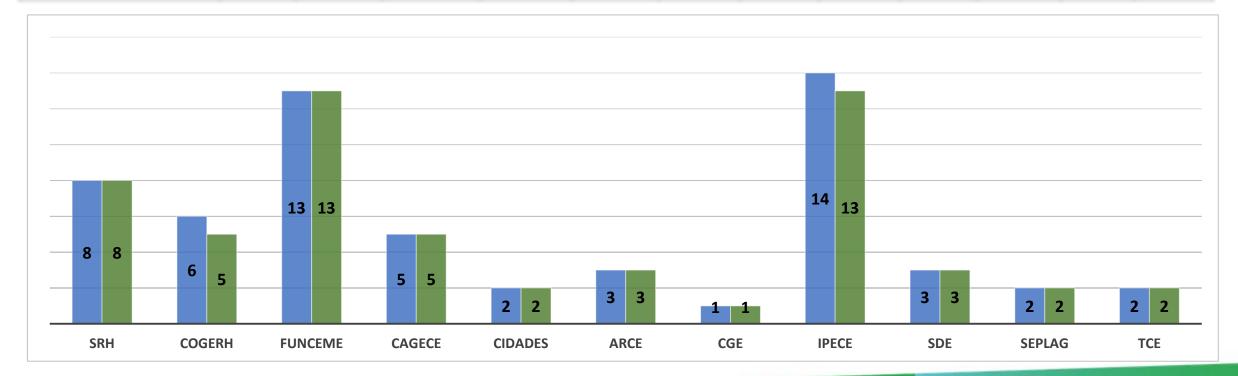


ATIVIDADES

CONSULTORIA DE EMPRESA E INDIVIDUAL





Nº de Atividades	Quantidade	Status
	00	A Iniciar
	02	Em Atividades Preparatórias
32 Consultorias (Empresa e Individual)	00	Remetidos para "Não Objeção Técnica" via Sistema STEP
individual)	00	Em Licitação / Assinando Contrato
	30	Contratos / Concluídos




ATIVIDADES

OBRAS, BENS E SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA





Nº de Atividades	Quantidade	Status
	00	A Iniciar
	00	Em Atividades Preparatórias
27 Obras, Bens e Serviços de Não Consultoria	00	Remetidos para "Não Objeção Técnica" via Sistema STEP
Nao Consultoria	00	Em Licitação / Assinando Contrato
	27	Contratos / Concluídos







Componente I: Aumento da Segurança Hídrica









01 OBRA



05 CONSULTORIAS



02 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - SRH





Nο	Método	Atividades	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador</i> associado	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.
3		Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Contrato nº 01/PSHG/SRH/CE/2024 em Execução – WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO
4		Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023 em Execução – MANOEL DE SOUZA FREITAS JÚNIOR
5		Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução − JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA
6		Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologia. <i>Há</i> <i>Indicador associado</i>	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2024 em Execução - PEDRO ANTÔNIO MOLINAS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - SRH





Nō	Método	Atividades	Status
7	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos nº 07, 08 e 09/2022 – Concluídos.
8	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 – Concluído .

VÍDEO OBRA SAB-SC










Mapa de Avanço Físico





Realizado: 0/47 LOCALIDADES 0/280 mil POPULAÇÃO JÁ ATENDIDA

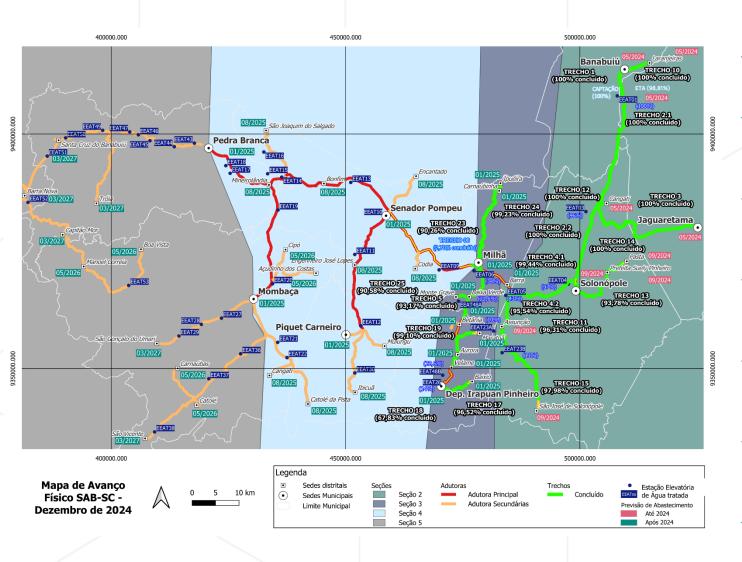

Seção	Descrição	Marcos Iniciais	Marcos Jun/23	Prazo Proposto
1	1ª etapa da ETA e Captação de Água Bruta.	Jun/23	Mai/24	Mai/25
2	Trechos parte Inicial do Setor 1.	Ago/23	Set/24	Abr/25
3	Trechos parte complementar do Setor 1.	Dez/23	Jan/25	Jun/25
4	2ª etapa da ETA e trechos Setor 2.	Ago/25	Ago/25	Fev/26
5	3ª etapa da ETA e trechos Setor 3.	Mar/27	Mar/27	Mar/27









02 CONSULTORIAS



01 SERVIÇO



03 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - COGERH





Nο	Método	Atividades	Status
1	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão. <i>Há Indicador</i> <i>associado</i>	Contrato nº 010/2023/COGERH em Execução — CONSÓRCIO MLG E RC MEDIÇÕES 25º medição aprovada.
3	I (onsultoria	(Salvaguardas). <i>Há Indicador associado</i>	 Contrato nº 072/2022/COGERH – Encerrado com apenas 4/14 produtos entregues e pagos; e Edital de SDP aprovado pelo Banco em 25/5/2025, com previsão de lançamento pela PGE em 27/6/2025.

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - COGERH





No	Método	Atividades	Status
3	Rens	Hídricos.	1— Equipamentos de TI: Concluído ; 2— Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH — Concluído; e 3— Contrato nº 048/2024/COGERH — Concluído
4	KANC	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a Universalização da Macromedição da COGERH. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 014, 015 e 016/2021/COGERH – Concluídos.
5	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH – Concluído .
6	Consultoria	Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 066/2022/COGERH em Concluído.









02 CONSULTORIAS



04 SERVIÇOS



07 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME





Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado do Ceará.	Contrato nº 07/2022 em Execução — JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ.
2	Bens	Donnier de Dunia Polarização Ortogonal	Contrato nº 14/2023 em Execução – SQUITTER EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DO BRASIL LTDA.
3	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em Execução — MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA.

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME





Nº	Método	Atividades	Status
4	Serviços	Serviços de Laboratório para Análises Físico-químicas e Biológicas em Amostras de Água Bruta de Corpos Hídricos Superficiais localizados no Ceará.	Contrato nº 06/2023 – Concluído
5	RANG	Aquisição de Equipamentos para Instrumentação e Monitoramento de Bacias Hidráulicas.	Contratos: 04/2021, 05/2021, 06/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 – Concluídos.
6	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 – Concluído .
7	Serviços	Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações Linimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará.	
8	Kens	Aquisição de 3 (três) Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT's (drones), com Acessórios, e de 2 (dois) S istemas (softwares) de Processamento de Imagens.	Contratos nº 02/2023, nº 03/2023 e nº 08/2023 – Concluídos .
9	Consultoria	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	Contrato nº 14/2021 – Concluído.
10	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato nº 08/2021 – Concluído.
11	Serviços	Serviços de Engenharia para Instalação de Estações Meteorológicas.	Contrato nº 16/2021 – Concluído .
12	RANC	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Contratos nº 17/2022 e nº 19/2022 – Concluídos.
13	Rens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão Climática e de Afluências aos Principais Reservatórios do Estado. <i>Há Indicador associado</i>	Contratos nº 10/2023 – Concluído.





Componente II:

Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água









01 OBRA



04 CONSULTORIAS

COMPONENTE II

MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - CAGECE





Nº	Método	Atividades	Status
1	l ()hras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). <i>Há Indicador associado</i>	Lote I: Contrato nº 0093/2023 em Execução — CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS.
1			Lote II: Contrato 0059/2023 em Execução — CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL.
2	Consultoria	Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de	Contrato nº 051/2023 em Execução — CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
3	(Angliitaria	,	Contrato nº 145/2022 em Execução — INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PUBLICA S/S LTDA.

VÍDEO DMC's





COMPONENTE II

MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - CAGECE





Nº	Método	Atividades	Status
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 201/2021 – Concluído .
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	Contrato 98/2023 – Concluído.





Componente III:

Fortalecimento da Gestão do Setor Público









03 CONSULTORIAS

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - ARCE





Nº	Método	Atividades	Status
1			Contrato nº 25/2024/ARCE em Execução − MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA.

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - ARCE





Nº	Método	Atividades	Status
2	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/ARCE/2023 - Concluído .
3	l (nncilitaria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Contrato nº 04/ARCE/2023 – Concluído .









10 CONSULTORIAS



03 SERVIÇOS



01 BEM

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - IPECE





Nō	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Inteligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	Contrato nº 10/2022 em Execução – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.
2	Serviço	Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. <i>Há Indicador associado</i>	 Contrato nº 05/2023 – Concluído; Termo de Referência revisado previamente pelo Banco Mundial. Equipe técnica do IPECE em tratativas com a UGP, a fim de verificar o inicio do processo licitatório.
3	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 09/2020, 02/2021 e 09/2023 em Execução.

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - IPECE





Nº	Método	Atividades	Status
4	Consultoria Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.		Contrato nº 06/2024 – Concluído.
5	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 08/2022 – Concluído.
6	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos	1. Contratos nº 13/2022; nº 14/2022; nº 16/2022 e 17/2022 – Concluídos; e 2. Equipamentos de Videoconferência: Contratos 01/2025 e 02/2025 - Concluídos.









01 CONSULTORIA



01 CONSULTORIA



01 BEM

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SDE





Nō	Método	Método Atividades Status		
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SDE/IPECE	Contrato nº 12/2022 – Concluído.	
2	Levantamento Cadastral de Irrigantes e Determinação de Demanda Hídrica para o Consultoria Setor Agropecuário das Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SDE/FUNCEME		Contrato nº 12/2022 – Concluído.	
3	Bens Fornecimento e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SDE/FUNCEME		Contrato nº 06/2020 – Concluído .	









02 CONSULTORIAS

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SCIDADES





Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria		Contrato nº 26/2024 em Execução — COBRAPE — CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS.

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SCIDADES





Nº	Método	Atividades	Status
1	Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Contrato nº 20/2022 – Concluído.









01 CONSULTORIA

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - CGE





Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/2022 – Concluído.









01 CONSULTORIA



01 BEM

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SEPLAG





Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	
2	Bens	Aquisição de Mobiliário de Equipamentos de TIC para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	 Aquisição de Equipamentos de TI: Contratos nº 02/2023 e 03/2023 – Concluídos; Aquisição de Mobiliário: Contrato nº 022/2023 – Concluído; e Aquisição de equipamentos: Contratos nº 011/2024, 012/2024 e 013/2024 - Concluídos.









02 BENS

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - TCE





Nº	Método	Atividades	Status	
1	KANC	Aquisição de Equipamentos (Vant's), Software e Treinamento para Auditoria e Monitoramento de Obras de Infraestrutura Hídrica.	Contratos nº 35 e 36/2021 – Concluídos.	
2	Bens	Aquisições de Equipamentos para Desenvolver Solução de Monitoramento de Obras de Engenharia que Consiste na Elaboração de uma Base Analítica Composta de Mecanismo de Coleta de Dados e Painéis de Monitoramento de Obras de Engenharia por Meio da Tecnologia de <i>Business Intelligence</i> e Aplicação de Modelos de <i>Machine</i> <i>Learning</i> . <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 44/2022 – Concluído.	





6. INDICADORES

SUMÁRIO DE METAS





CUMPRIDAS	A CUM	TOTAL*	
	2025	2026	
22	2	13	37

^{*} Espera-se que 65% das metas estejam cumpridas até dezembro de 2025;

^{**} As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central que serão cumpridas apenas no último ano do Projeto.

METAS CUMPRIDAS





SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
			Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.
FUNCEME	Sistema de Previsão Climática fortalecido.	2	Previsão de afluência da água para os reservatórios estratégicos do Estado gerada duas vezes ao mês, no período de dezembro a abril, com base em dois modelos climáticos globais (ECHAM e CAM).
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	3	Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.
		4	Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.
		5	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.
CAGECE	Proposta de revisão da estrutura tarifária.	6	 Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada. Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE. Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.
		7	
			09 DMCs.
CAGECE	Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza.	9	18 DMCs.
		10	44 DMCs.
		11	Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.
SEPLAG	Sistema GIP implementado e em operação – SEPLAG.	12	10% dos novos Projetos da SDA analisados através do sistema.
			20% dos novos Projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.

METAS CUMPRIDAS





SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
			Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.
TCE	Percentagem de obras públicas monitoradas.	15	70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.
			Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.
	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	17	Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.
IPECE		18	Estudo de Cadeias Produtivas com enfoque na produção de uso interno da água finalizado.
		19	Meta final: Estudo inter- e intra-setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado.
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	20	Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada.
COGERH	Percentagem de usuários estratégicos da água regularizados	21	Meta final: 80%
COGERH	Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição	22	Meta final: 75%

METAS A CUMPRIR EM 2025





SETORIAL	INDICADOR	METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida.
ARCE	Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada.	Meta Final: Resolução Publicada.

SISTEMAS DESENVOLVIDOS





CGE

Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais SDE / IPECE

Sistema
Estratégico para o
Assessoramento à
Irrigação - SEAI

SEPLAG

Gestão de Investimento Público - GIP TCE

e-Obras





7. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS





SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTAÇÃO
TCE	Sistema de monitoramento de obras (e-Obras).	-	ОК
CAGECE	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA	ОК
FUNCEME	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	ОК
ARCE	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	ОК
IPECE	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	08/2022 - QUADRANTE	ОК
FUNCEME SDE	Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará.		
IPECE SDE	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA ITDA	OK

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS





SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	SUGESTÃO DE DATA
COGERH	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	066/2022/COGERH - CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA / REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA / IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA.	ОК
IPECE	Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	06/2024 - ROGÉRIO BARBOSA SOARES	ОК
CAGECE	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE.	0098/2023 - CONSÓRCIO MELHORIAS DE GESTÃO FALCONI CONSULTORES S.A E EFFICO SANEAMENTO LTDA	AGOSTO 2025
SEPLAG	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	018/2022 - CONSÓRIO MTC: MACROPLAN – PROSPECTIVA, ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA. / TRANSPLAN – PLANEJAMENTO E PROJETOS S.A. / J C M FREITAS–SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (CHERRY IT)	OUTUBRO 2025
ARCE	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.		DEZEMBRO 2025

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS





SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	SUGESTÃO DE DATA
	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.		FEVEREIRO 2026

PRÓXIMAS REUNIÕES DO COMITÊ





ANO 2025			
MÊS	DIA		
FEVEREIRO	27		
ABRIL	24		
JUNHO	26		
AGOSTO	28		
OUTUBRO	30		
DEZEMBRO	18		







