

iPECE INSTITUTO
DE PESQUISA
E ESTRATÉGIA
ECONÔMICA
DO CEARÁ

22
ANOS



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO



IPF-CEARÁ

30ª REUNIÃO DO COMITÊ

Projeto de Segurança

Hídrica e Governança

24 de abril de 2025

*Projeto de Apoio à Segurança Hídrica e
Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do
Estado do Ceará (2019 a 2026)*

PAUTA DA REUNIÃO

1. Aprovação da Ata da 29ª Reunião do Comitê;
2. Informações Importantes;
3. Gerenciamento Financeiro;
4. Atividades de Assistência Técnica;
5. Indicadores; e
6. Apresentação dos Resultados.

1. APROVAÇÃO DA ATA

29ª Reunião do Comitê (27/02/2025)

E-mail enviado em: 01/04/2025

2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Revisão da Ajuda Memória até o dia 05/05;
2. Manter a participação nas reuniões do Comitê;
3. Atribuições dos membros do Comitê, conforme Portaria nº 20, de 09 de outubro de 2020 (DOE 16 de outubro de 2020);
4. Alteração dos Membros do Comitê;
5. Auditoria do TCE; e
6. Previsão da Missão do Banco Mundial: 20 a 24 de outubro de 2025.

AVALIAÇÃO DA MISSÃO

BONS RESULTADOS

- ✓ Volume de recursos do empréstimo totalmente comprometido e **76,38% desembolsados**;
- ✓ Atividades contratadas;
- ✓ Contínuo comprometimento das setoriais e UGP;
- ✓ Maior parte dos **contratos concluídos** e outros em fase final de conclusão;
- ✓ **Bons resultados** das atividades contratadas/concluídas; e
- ✓ **Avanços** na execução dos contratos do SAB-SC e controle de perdas.

AValiação da Missão

RESSALVAS

- ✓ **Urgente** necessidade de **aporte dos recursos de contrapartida** para execução do contrato obras SAB-SC;
- ✓ Atenção permanente aos **contratos do SAB-SC**: cumprimento de procedimentos e cláusulas do contrato, desempenho do Empreiteiro e acompanhamento do Programa (prazos);
- ✓ **Energização** para operação do SAB-SC insuficiente e necessidade de **avanços rápidos**;
- ✓ 2 de 4 **indicadores** de Objetivo de Desenvolvimento do Projeto com risco de não cumprimento;
- ✓ **Cláusulas contratuais** em descumprimento (Arranjo Institucional SAB-SC e Segurança de Barragens); e
- ✓ **Atividades de segurança das barragens** estão atrasadas.

AVALIAÇÃO DA MISSÃO

CLASSIFICAÇÕES DO PROJETO

- ✓ ODP - Objetivos de desenvolvimento

Classificação permanece **Moderadamente Satisfatória**. Reflete algum risco na probabilidade de alcance das metas dos indicadores dentro do prazo de encerramento.

- ✓ Performance de Implementação

Moderadamente Satisfatória: risco de rebaixamento pela não alocação de contrapartida, falta de solução formal para O&M do SAB-SC e risco de não conclusão das atividades de segurança de barragens.

- ✓ Alocação da **contrapartida** conforme necessidades do contrato SAB-SC e acordado com o Banco Mundial;
- ✓ Formalização do **arranjo institucional do SAB-SC** (cláusula Acordo de Empréstimo) urgente – plano de ação acordado; e
- ✓ **Agilidade** na contratação das atividades de **Segurança das Barragens** (cláusulas Acordo de Empréstimo).

3. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

SALDO DA CONTA OPERATIVA


SALDO CONTA OPERATIVA EM ABRIL/2025 (US\$)

VALOR DESEMBOLSADO	106.493.545,49
VALOR EXECUTADO ATÉ 22/04/2025	98.479.685,82
SALDO DESEMBOLSADO A EXECUTAR	8.013.859,67

SALDO CONTA OPERATIVA EM ABRIL/2025 (R\$)

VALOR DESEMBOLSADO EM REAIS	563.619.999,16
VALOR EXECUTADO ATÉ 22/04/2025	517.481.105,80
SALDO DESEMBOLSADO A EXECUTAR	46.184.241,56

Desembolsado a Executar x Executado (R\$)

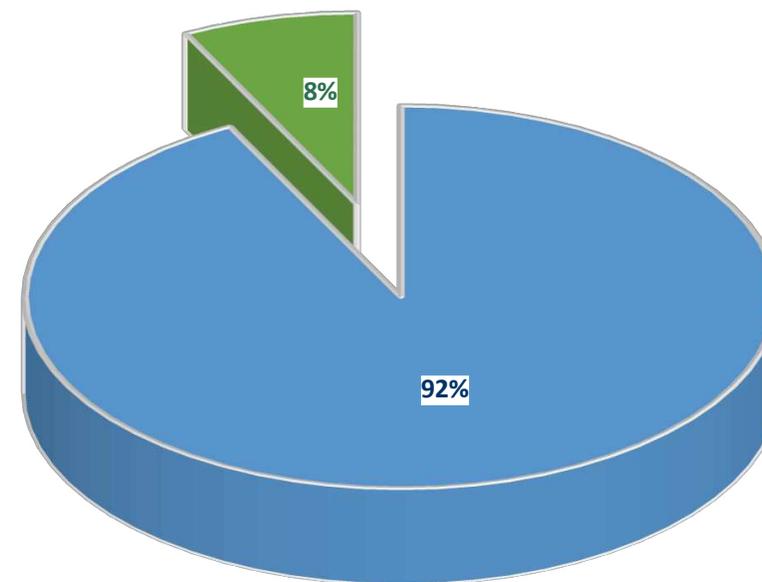

■ Valor Executado até 22/04/2025 ■ Saldo desembolsado a executar

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

DESEMBOLSO X EMPENHOS (R\$)

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

22
ANOS

 **CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

PERÍODO	DESEMBOLSADO	SALDO INTERNALIZAÇÃO	EMPENHADO	SALDO FINANCEIRO ACUMULADO
2020	8.177.297,92	8.177.297,92	2.420.219,32	5.757.078,60
2021	13.013.218,72	18.770.297,32	12.675.205,32	6.095.092,00
2022	84.524.326,79	90.619.418,79	74.831.894,00	15.787.524,79
2023	65.386.901,37	81.174.426,16	80.144.486,60	1.029.939,56
2024	355.888.901,50	356.918.841,06	337.897.099,64	19.021.741,42
2025	36.629.352,85	55.651.094,27	46.776.279,40	8.874.814,87

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

SUMÁRIO – LOA, EMPENHOS E PAGAMENTOS 2025 EM R\$

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

22
ANOS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SETORIAL	LEI + CRÉDITO (A)	VALOR EMPENHADO (B)	SALDO (A) – (B)	% (B)/(A)
ARCE	304.000,00	-	304.000,00	0,00%
CAGECE	15.718.711,26	139.689,69	15.579.021,57	0,89%
CGE	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
FUNCEME	115.000,00	4.150,17	110.849,83	3,61%
IPECE	2.277.530,71	1.382.429,02	895.101,69	60,70%
SCIDADES	2.010.132,00	-	2.010.132,00	0,00%
SEPLAG	57.932,00	-	57.932,00	0,00%
SRH	192.656.854,86	43.730.346,56	148.926.508,30	22,70%
COGERH	7.330.000,00	1.519.663,96	5.810.336,04	20,73%
TCE	-	-	-	-
TOTAL	220.480.160,83	46.776.279,40	173.703.881,43	21,22%

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

SETORIAL	CONTRATOS	EMPENHADO	PAGO	SALDO
CAGECE	Engenheiro: Consórcio Igneo Ingeniería Sostenible, S.L., Nip Global Ltda e Concremat Engenharia E Tecnologia S.A	2.455.958,62	2.424.838,15	31.120,47
FUNCEME	Jean-Michel Marcel Albert Martinez	206.818,84	42.016,89	164.801,95
	Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda	284.311,90	276.000,87	8.311,03
	Maestria Comunicação e Eventos Ltda	132.615,00	112.895,00	19.720,00
	Squitter Equipamentos Profissionais do Brasil Ltda	6.900.636,78	3.066.949,68	3.833.687,10
IPECE	Consultores UGP	1.321.914,85	1.319.313,28	2.601,57
TOTAL		11.302.255,99	7.242.013,87	4.060.242,12

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

LOA – PREVISÃO DE GASTOS 2025 – SUPLEMENTAÇÃO 2025 EM R\$

ipece INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ


22
ANOS

 **CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO


SETORIAL	nº	Total Previsto para 2025	Orçamento 2025			
			Ação		LEI+CRÉDITO	Valor a Suplementar
ARCE	1	513.247,96	11788	Assistência Técnica E Estudos Regulatórios (IPF - Comp. III).	304.000,00	209.247,96
SCIDADES	2	2.593.459,12	11177	Elaboração de Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF - comp III).	2.010.132,00	583.327,12
TOTAL		3.106.707,08			2.314.132,00	792.575,08

EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

CONTRATOS POR FASE – 93 CONTRATOS ASSINADOS

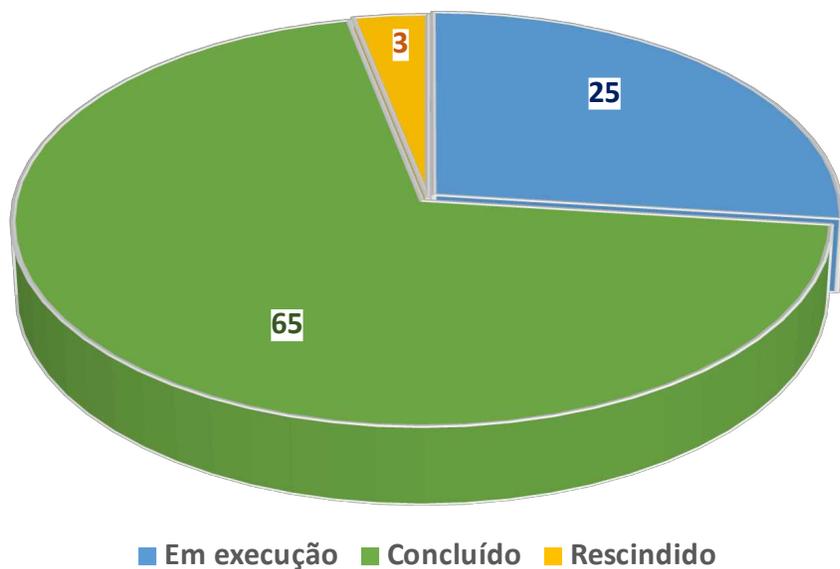

EXECUÇÃO FINANCEIRA – 93 CONTRATOS

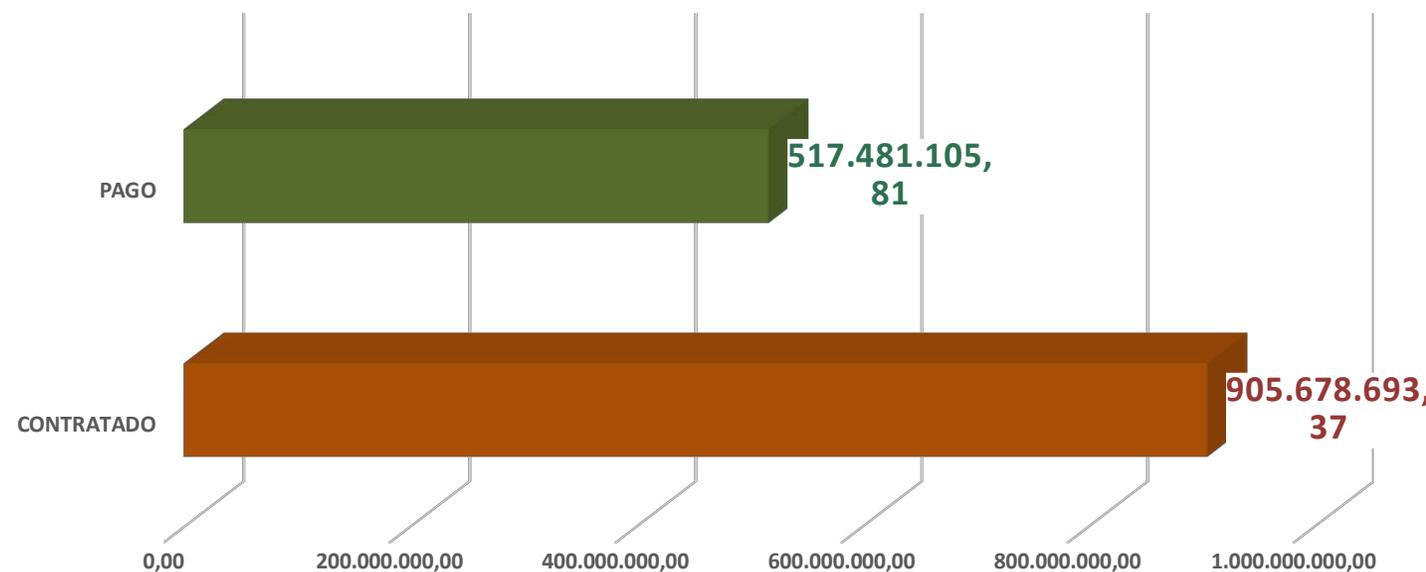

4. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



02 OBRAS



32 CONSULTORIAS



08 SERVIÇOS



17 BENS



59 ATIVIDADES

ATIVIDADES A CONTRATAR - RISCO

	Nº	Setorial	Categoria de Gastos	Atividade	Previsão de Assinatura	RISCO
COMPONENTE 1	1	COGERH	Consultoria	Serviços Especializados de Engenharia para Complementação dos Planos de Segurança das Barragens Gavião e Arrojado Lisboa.	Ago/25	Alto
COMPONENTE 3	2	IPECE	Serviço	Serviços para Realização de Duas Pesquisas domiciliares na área de abrangência dos municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	Out/25	Médio

	Baixo – até 08 meses
	Médio - de 09 a 14 meses
	Alto - acima 14

SRH |  **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



01 OBRA



05 CONSULTORIAS



02 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - SRH

Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em Execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.
3	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Contrato nº 01/PSHG/SRH/CE/2024 em Execução - WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO
4	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. Há Indicador associado	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023 em Execução - MANOEL DE SOUZA FREITAS JÚNIOR
5	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. Há Indicador associado	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em Execução - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologia. Há Indicador associado	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2024 em Execução - PEDRO ANTÔNIO MOLINAS

VÍDEO OBRA SAB-SC





02 CONSULTORIAS



01 SERVIÇO



03 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - COGERH

Nº	Método	Atividades	Status
1	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e Pequenos Serviços de Engenharia para Instalação de Medidores de Vazão. Há Indicador associado	Contrato nº 010/2023/COGERH em Execução – CONSÓRCIO MLG E RC MEDIÇÕES . - Até o final de fevereiro de 2025 o consórcio realizou a instalação de 212 (duzentos e doze) medidores de vazão (93,0%); - 23ª medição aprovada.
2	Bens	Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1– Equipamentos de TI: Concluído ; 2– Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH – Concluído ; e 3– Contrato nº 048/2024/COGERH em Execução - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA .
3	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). Há Indicador associado	1- Contrato nº 072/2022/COGERH – Encerrado com apenas 4/14 produtos entregues e pagos ; e 2- UGP e COGERH em tratativas para seleção e/ou contratação da nova empresa.

FUNCEME |  FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS



02 CONSULTORIAS



04 SERVIÇOS




07 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME

Nº	Método	Atividades	Status
1	Serviços	Serviços de Laboratório para Análises Físico-químicas e Biológicas em Amostras de Água Bruta de Corpos Hídricos Superficiais localizados no Ceará.	Contrato nº 06/2023 em Execução – CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA. Realizada a 16ª campanha.
2	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado do Ceará.	Contrato nº 07/2022 em Execução – JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ. Executado 70% e conclusão prevista para junho/2025.
3	Bens	Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com Instalação e Treinamento.	Contrato nº 14/2023 em Execução – SQUITTER EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DO BRASIL LTDA. Fornecimento e instalação concluídos. Testes em campo e treinamento em andamento. Aceitação final prevista para julho/2025.
4	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em Execução – MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA. Executado 93% e conclusão prevista para maio/2025.

Radar Meteorológico de Precipitação de Banda X

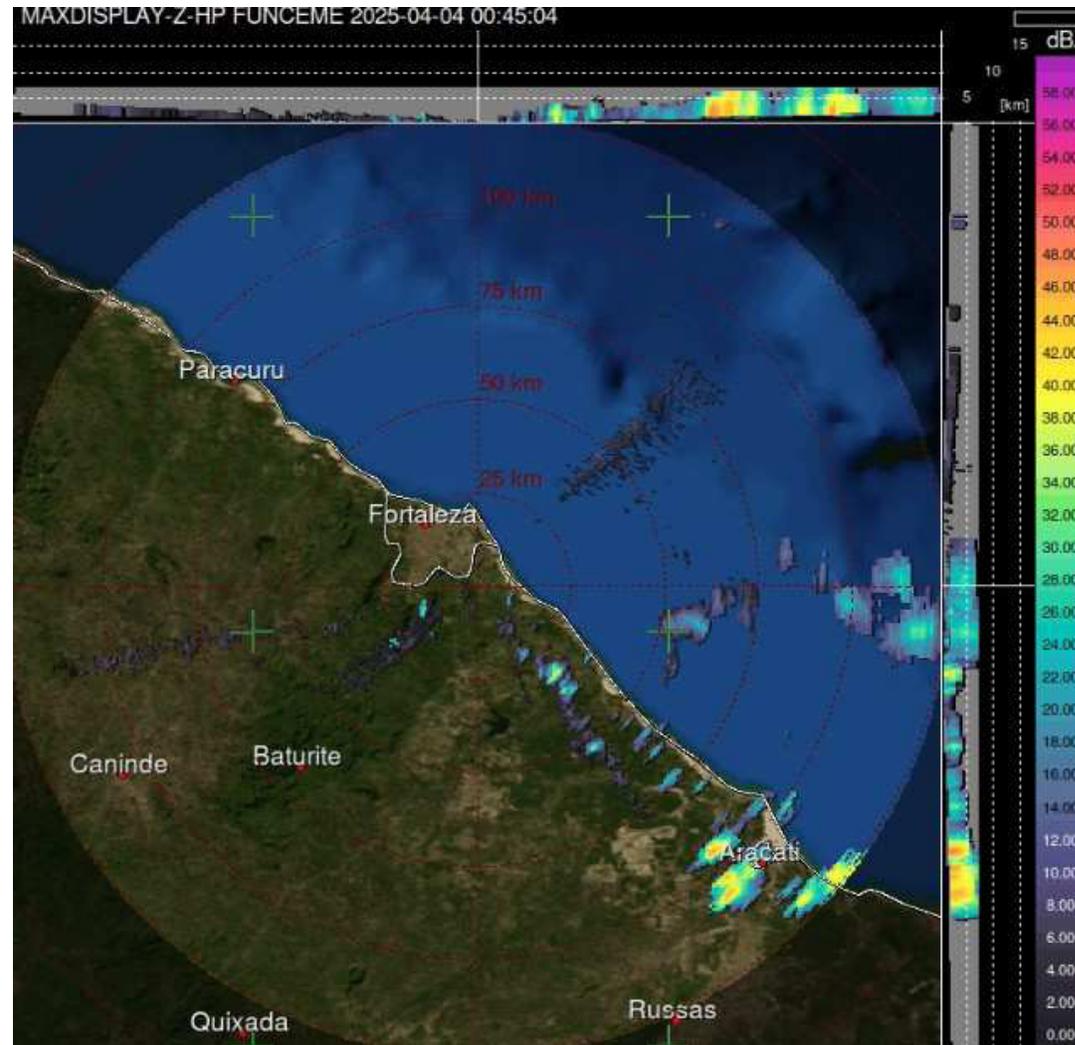

Imagens do Radar do Eusébio em 04/04/2025

Componente II: Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água



01 OBRA



04 CONSULTORIAS

COMPONENTE II

MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - CAGECE


Nº	Método	Atividades	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). Há Indicador associado	Lote I: Contrato nº 0093/2023 em Execução – CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS.
			Lote II: Contrato 0059/2023 em Execução – CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL.
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. Há Indicador associado	Contrato nº 051/2023 em Execução – CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Contrato nº 145/2022 em Execução – INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA.
			Os Produtos 7, 8, 9 e 10 foram aprovados e estão em processo de pagamento. Os Produtos 11.2 e 12 estão em análise, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2025.

VÍDEO DMC's

ipece INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

22
ANOS

 **CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO



Componente III: Fortalecimento da Gestão do Setor Público

ARCE



**AGÊNCIA REGULADORA
DO ESTADO DO CEARÁ**



03 CONSULTORIAS

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - ARCE

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. <i>Há Indicador associado</i>	Contrato nº 07/ARCE/2023 em Execução – KROLL BRASIL LTDA. Produto 7 está em conclusão e é composto pelo Relatório de Esclarecimentos aos Questionamentos Submetidos à Audiência Pública e Produtos Ajustados aos Resultados da Participação Social, principalmente em relação aos serviços prestados pela Cagece.
2	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	Contrato nº 25/2024/ARCE em Execução – MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA. Previsão da entrega e pagamento do produto 01? A equipe já iniciou as entrevistas e visitas em campo. A apresentação dos resultados dos levantamentos iniciais que integram a primeira parte do P1, estava prevista para março de 2025.



10 CONSULTORIAS



03 SERVIÇOS



01 BEM

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - IPECE

IPECE

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

22

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no “Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Intelligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas”.	Contrato nº 10/2022 em Execução – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV . Cursos 8, 9, 10 e 14 previstos até agosto/2025.
2	Serviço	Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. Há Indicador associado	1. Contrato nº 05/2023 – Concluído ; 2. Termo de Referência revisado previamente pelo Banco Mundial. Equipe técnica do IPECE em tratativas com a UGP, a fim de verificar o início do processo licitatório.
3	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 09/2020, 02/2021 e 09/2023 em Execução .
4	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1. Contratos nº 13/2022; nº 14/2022; nº 16/2022 e 17/2022 – Concluídos ; e 2. Equipamentos de Videoconferência: Contratos 01/2025 e 02/2025 - Concluídos .

SCIDADES



**SECRETARIA
DAS CIDADES**
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



02 CONSULTORIAS

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SCIDADES

ipece INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

22
ANOS

 **CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Nº	Método	Atividades	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Contrato nº 26/2024 em Execução – COBRAPE – CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. Previsão da entrega e pagamento do produto 02?

5. INDICADORES

SUMÁRIO DE METAS

CUMPRIDAS	A CUMPRIR		TOTAL*
	2025	2026	
21	4	12	37

* Espera-se que 68% das metas estejam cumpridas até dezembro de 2025;

** As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central que serão cumpridas apenas no último ano do Projeto.

METAS CUMPRIDAS

SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
FUNCEME	Sistema de Previsão Climática fortalecido.	1	Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.
		2	Previsão de afluência da água para os reservatórios estratégicos do Estado gerada duas vezes ao mês, no período de dezembro a abril, com base em dois modelos climáticos globais (ECHAM e CAM).
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	3	Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.
CAGECE	Proposta de revisão da estrutura tarifária.	4	Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.
		5	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.
		6	Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.
		7	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.
CAGECE	Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza.	8	09 DMCs.
		9	18 DMCs.
		10	44 DMCs.

METAS CUMPRIDAS

SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
SEPLAG	Sistema GIP implementado e em operação – SEPLAG.	11	Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.
		12	10% dos novos Projetos da SDA analisados através do sistema.
		13	20% dos novos Projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.
TCE	Percentagem de obras públicas monitoradas.	14	Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.
		15	70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.
		16	Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	17	Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.
		18	Estudo inter- e intra- setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado.
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	19	Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada.
COGERH	Percentagem de usuários estratégicos da água regularizados	20	Meta final: 80%
COGERH	Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição	21	Meta final: 75%

METAS A CUMPRIR EM 2025

SETORIAL	INDICADOR	METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida.
ARCE	Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada.	Meta Final: Resolução Publicada.
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema.
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	Meta final: Estudo inter- e intra-setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado.

6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ATIVIDADES

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTAÇÃO
TCE	Sistema de monitoramento de obras (e-Obras).	-	OK
CAGECE	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA	OK
FUNCEME	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	OK
ARCE	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	OK
IPECE	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	08/2022 - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA	OK
FUNCEME SDE	Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará.	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.	OK
IPECE SDE	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.	

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

SETORIAL	ATIVIDADE	FORNECEDOR	SUGESTÃO DE DATA
COGERH	Prestação de serviços de consultoria, contemplando as ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	066/2022/COGERH - CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA / REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA / IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA.	OK
IPECE	Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	06/2024 - ROGÉRIO BARBOSA SOARES	JUNHO 2025
CAGECE	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão De Empreendimentos da CAGECE.	0098/2023 - CONSÓRCIO MELHORIAS DE GESTÃO FALCONI CONSULTORES S.A E EFFICO SANEAMENTO LTDA	AGOSTO 2025
SEPLAG	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	018/2022 - CONSÓRCIO MTC: MACROPLAN – PROSPECTIVA, ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA. / TRANSPLAN – PLANEJAMENTO E PROJETOS S.A. / J C M FREITAS–SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (CHERRY IT)	OUTUBRO 2025

PRÓXIMAS REUNIÕES DO COMITÊ

ANO 2025	
MÊS	DIA
FEVEREIRO	27
ABRIL	24
JUNHO	26
AGOSTO	28
OUTUBRO	30
DEZEMBRO	18

iPECE | INSTITUTO
DE PESQUISA
E ESTRATÉGIA
ECONÔMICA
DO CEARÁ

22
ANOS



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO
