

**38ª REUNIÃO DO COMITÊ**  
**Projeto de Segurança Hídrica**  
**e Governança**  
**27 de agosto de 2026**



*Projeto de Apoio à Segurança Hídrica e  
Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública  
do Estado do Ceará (2019 a 2026)*

# PAUTA DA REUNIÃO

**01**

---

## **Aprovação da Ata**

Revisão e aprovação da Ata da 37ª Reunião do Comitê

**02**

---

## **Informações Importantes**

Atualizações e comunicados relevantes

**03**

---

## **Gerenciamento Financeiro**

Análise de desembolsos e execução orçamentária

**04**

---

## **Assistência Técnica**

Atividades técnicas em andamento

**05**

---

## **Indicadores**

Acompanhamento dos resultados

**06**

---

## **Apresentação dos Resultados CAGECE**

# 1. APROVAÇÃO DA ATA



## 37ª Reunião do Comitê

A ata da última reunião ordinária, realizada em **25 de junho de 2026**, foi distribuída aos membros do Comitê para análise e considerações.

**DATA DE ENVIO: 24/7/2026**



## 2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES



**Relatório de Desempenho**  
Enviado ao Banco em 14/08  
**Relatório Financeiro - IFR**  
Enviado ao Banco em 25/08



**Auditoria TCE 2025**  
Relatório Final em  
Andamento)



**Missão de Supervisão do Banco**  
Participação exclusiva das  
Setoriais com atividades em  
execução



**Prorrogação de Prazo do Projeto**  
Pleito de Solicitação de 12 meses  
adicionais (12/2027)



**PLOA 2027**  
Envio à UGP dos valores  
até 31/08/2026



### 3. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

# GERENCIAMENTO FINANCEIRO

## PANORAMA GERAL DO PROJETO

US\$ 139,88M

Valor do Empréstimo

US\$ 34,97M

Contrapartida Estadual

92,31%

Desembolsado

US\$ 10,76M

A Desembolsar

59

Atividades do Projeto

01

Atividade a Contratar

15

Atividades em Execução

4

Meses para encerramento do Projeto  
Pleito para prorrogação por mais 12 meses

4/6

Reuniões do Comitê realizadas em 2026

# GERENCIAMENTO FINANCEIRO

## ATIVIDADES A CONTRATAR

|              | Setorial | Categoria de Gastos | Atividade                                                                                                                                  | Previsão de Assinatura |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| COMPONENTE 3 | IPECE    | Serviço             | Serviços para Realização de duas Pesquisas Domiciliares na área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central. | Novembro/26            |

# GERENCIAMENTO FINANCEIRO

## SALDO DA CONTA OPERATIVA

Posição em Dólares (US\$)

128,77M

Valor Desembolsado

Total de recursos disponibilizados

128,11M

Valor Executado

Recursos efetivamente utilizados até 26/8/2026

660 MIL

Saldo a Executar

Recursos aplicados disponíveis

Posição em Reais (R\$)

683,51M

Valor Desembolsado

Total de recursos disponibilizados

680,09M

Valor Executado

Recursos efetivamente utilizados até 26/8/2026

3,42M

Saldo a Executar

Recursos aplicados disponíveis

Taxa de execução atual: 99,50% dos recursos desembolsados.

# GERENCIAMENTO FINANCEIRO

SUMÁRIO – LOA E EMPENHOS 2026 EM R\$

| SETORIAL        | LEI + CRÉDITO<br>(A) | VALOR EMPENHADO<br>(B) | SALDO<br>(A) – (B) | %<br>(B)/(A) |
|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| CAGECE          | 714.765,00           | 351.673,79             | 363.091,21         | 49,20%       |
| FUNCEME         | 10.000,00            | -                      | 10.000,00          | 0,00%        |
| IPECE           | 2.204.419,18         | 1.386.298,82           | 818.120,36         | 62,89%       |
| SCIDADES        | 2.584.456,00         | 574.323,48             | 2.010.132,52       | 22,22%       |
| SRH             | 111.218.991,22       | 16.779.131,28          | 94.439.859,94      | 15,09%       |
| COGERH (APORTE) | 100.000,00           | -                      | 100.000,00         | 0,00%        |
| TOTAL           | 116.832.631,40       | 19.091.427,37          | 97.741.204,03      | 16,34%       |

# EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

## 94

**Contratos Totais**

Distribuídos entre  
11 setoriais

## 78

**Contratos Concluídos**

## 16


**Em Execução**

## 92,50%

**Execução Financeira**

Dos R\$ 896,41 milhões foram  
pagos R\$ 829,17 milhões

## EXECUÇÃO FINANCEIRA – 94 CONTRATOS

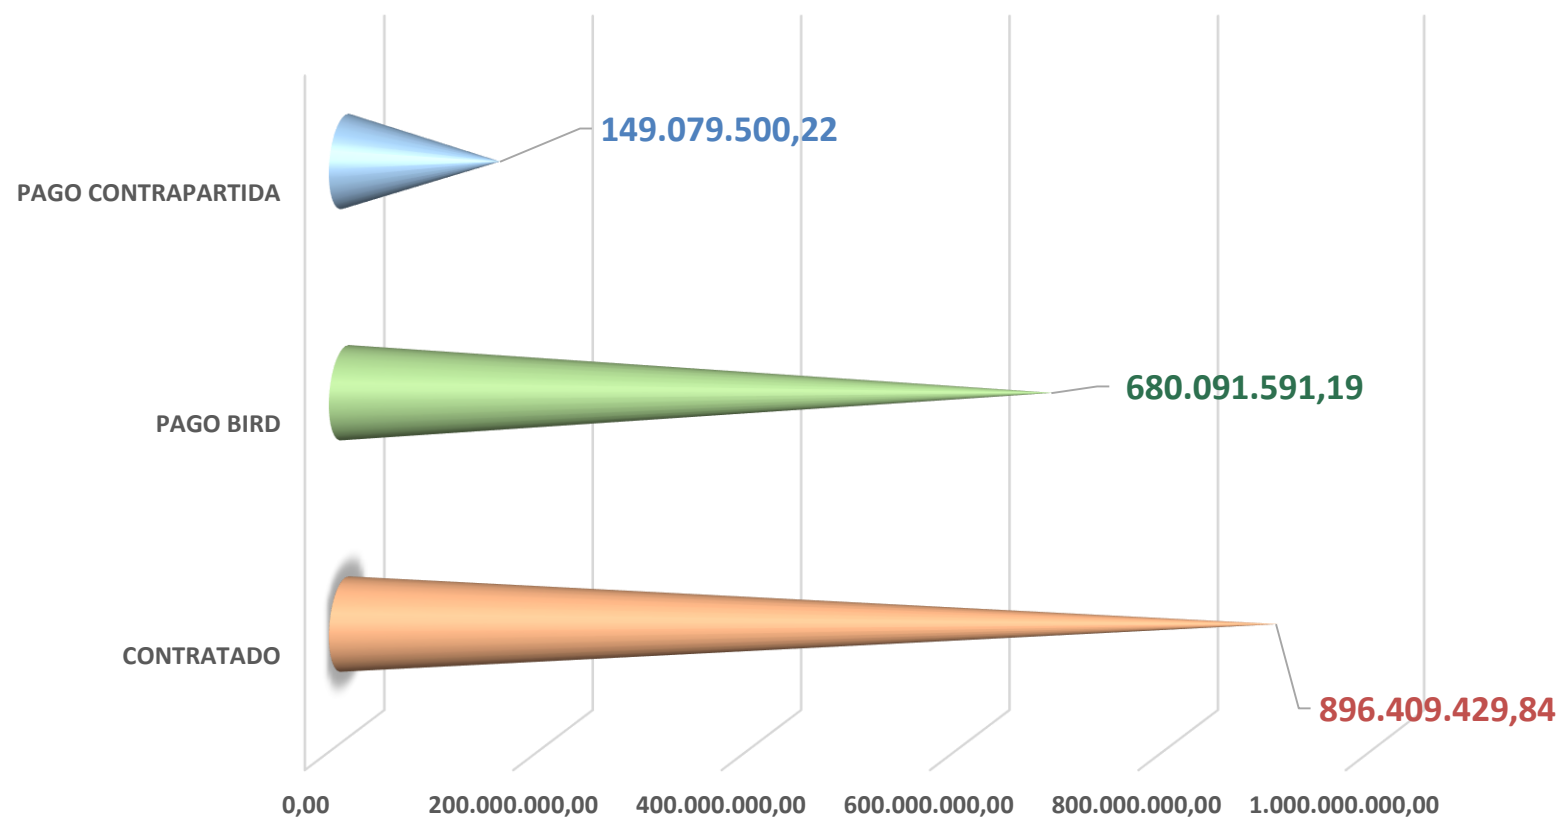



## 4. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



**02 OBRAS**



**32 CONSULTORIAS**



**08 SERVIÇOS**



**17 BENS**



**59 ATIVIDADES**

# **Componente I:**

## **Aumento da Segurança Hídrica**



**01 OBRA**



**05 CONSULTORIAS**



**02 BENS**

# COMPONENTE I

## AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA – SRH EM EXECUÇÃO

1

### Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central

**Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022**  
Consórcio Águas do Sertão. Principal obra de infraestrutura hídrica com indicador de resultado associado.

2

### Gerenciamento e Fiscalização do SAB-SC

**Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022**  
Consórcio TPF Engenharia/KL Serviços para assessoria técnica integral da obra.

3

### Modelo de Gestão do SAB-SC

**Contrato nº 01/PSHG/SRH/CE/2024**  
Consultor Individual: Wladimir Antônio Ribeiro para proposição do Arranjo Institucional do SAB-SC.  
**NUP nº 29001.000.854/2025-24 (Normativos)**  
**NUP nº 290001.001621/2025-49 (Subsídios)**

4

### Painel de Especialistas - Geotecnia

**Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023**  
Consultoria Individual: Manoel de Souza Freitas Júnior.

5

### Painel de Especialistas - Hidromecânica

**Contrato nº 03/SRH/CE/2020**  
Consultoria Individual: João Carlos Brito de Souza.

6

### Painel de Especialistas - Hidrologia

**Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2024**  
Consultoria Individual: Pedro Antônio Molinas.



**02 CONSULTORIAS**




**01 SERVIÇO**



**03 BENS**

# COMPONENTE I

## AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA – COGERH EM EXECUÇÃO

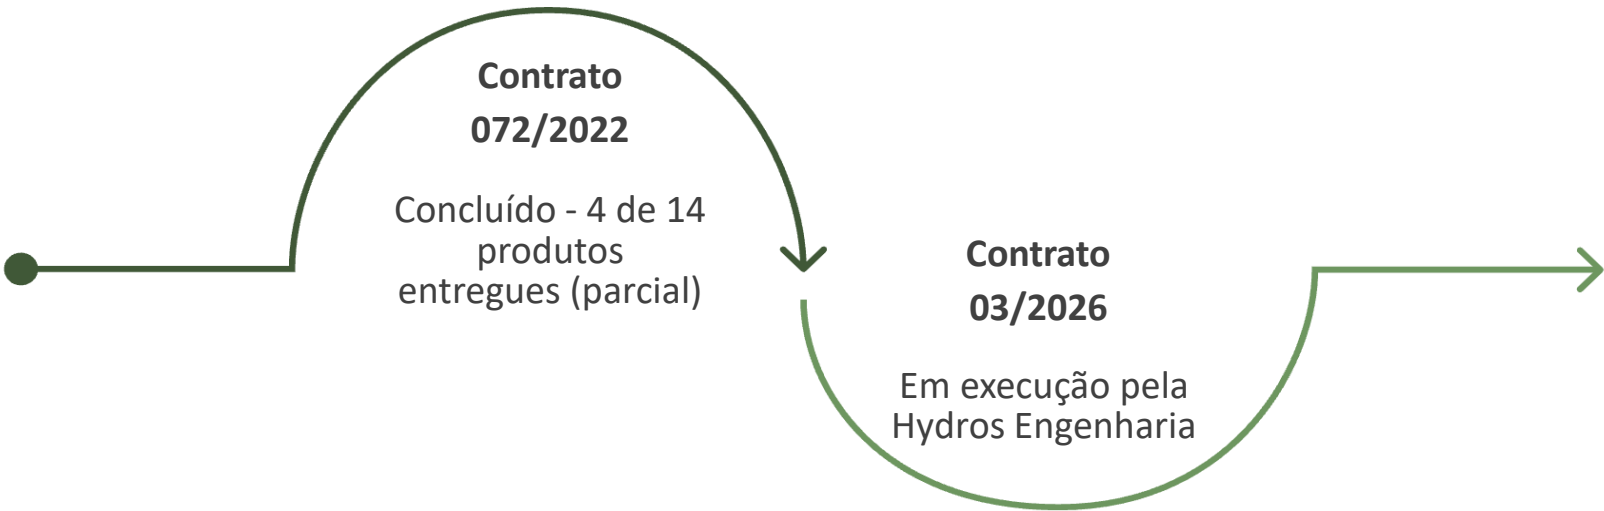

**Planos de Segurança das Barragens**  
**Atividade Crítica com Indicador Associado**

---

**Contrato nº 072/2022/COGERH:** Encerrado com entrega parcial de apenas 4 dos 14 produtos previstos e pagos. Necessidade de nova licitação identificada.

---

**Contrato nº 003/2026/COGERH:** Em execução a partir de janeiro/2026 com a empresa Hydros Engenharia Ltda.  
Dos 26 Produtos, apenas 4 produtos foram entregues, validados e pagos.



**02 CONSULTORIAS**



**04 SERVIÇOS**



**07 BENS**



## **Componente II:**

# **Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água**



**01 OBRA**




**04 CONSULTORIAS**

# COMPONENTE II

## MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA – CAGECE EM EXECUÇÃO


**Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06).** *Há Indicador associado*



### **Lote I - Obras**

Contrato 0093/2023

Consórcio Floresta e Expedicionários




### **Lote II - Obras**

Contrato 0059/2023

Consórcio Telar-Enorsul-BBL

**Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza.** *Há Indicador associado*



Contrato 051/2023

**Consórcio Igneo-NIP-Concremat**

# **Componente III:**

## **Fortalecimento da Gestão do Setor Público**





**AGÊNCIA REGULADORA  
DO ESTADO DO CEARÁ**



**03 CONSULTORIAS**





**10 CONSULTORIAS**



**03 SERVIÇOS**



**01 BEM**

# COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO – IPECE  
LICITAÇÃO

EM EXECUÇÃO

## Pesquisas Domiciliares SAB-SC

1

Abertura do processo em 16/06/2026, sob NUP: 46032.000213/2026-11. Processo em análise pela CELIC/PGE após esclarecimentos prestados pela equipe do IPECE. Contratação será por Pregão Eletrônico.

2

## Suporte à UGP

Equipe de consultores individuais prestando suporte técnico contínuo à Unidade de Gerenciamento de Projetos através de seis contratos ativos.

Contratos:

02/2020; 03/2020; 04/2020; 09/2020; 02/2021; 09/2023

**SDE**

**FUNCEME**

**SDE**

**iPECE** INSTITUTO  
DE PESQUISA  
E ESTRATÉGIA  
ECONÔMICA  
DO CEARÁ



**01 CONSULTORIA**



**01 CONSULTORIA**



**01 BEM**



**SCIDADES**



**SECRETARIA  
DAS CIDADES**  
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ



**02 CONSULTORIAS**

# COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO – SCIDADES  
EM EXECUÇÃO

## Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.





# 01 CONSULTORIA





**01 CONSULTORIA**



**01 BEM**






## 02 BENS




# SISTEMAS DESENVOLVIDOS



## 5. INDICADORES



# SUMÁRIO DE METAS

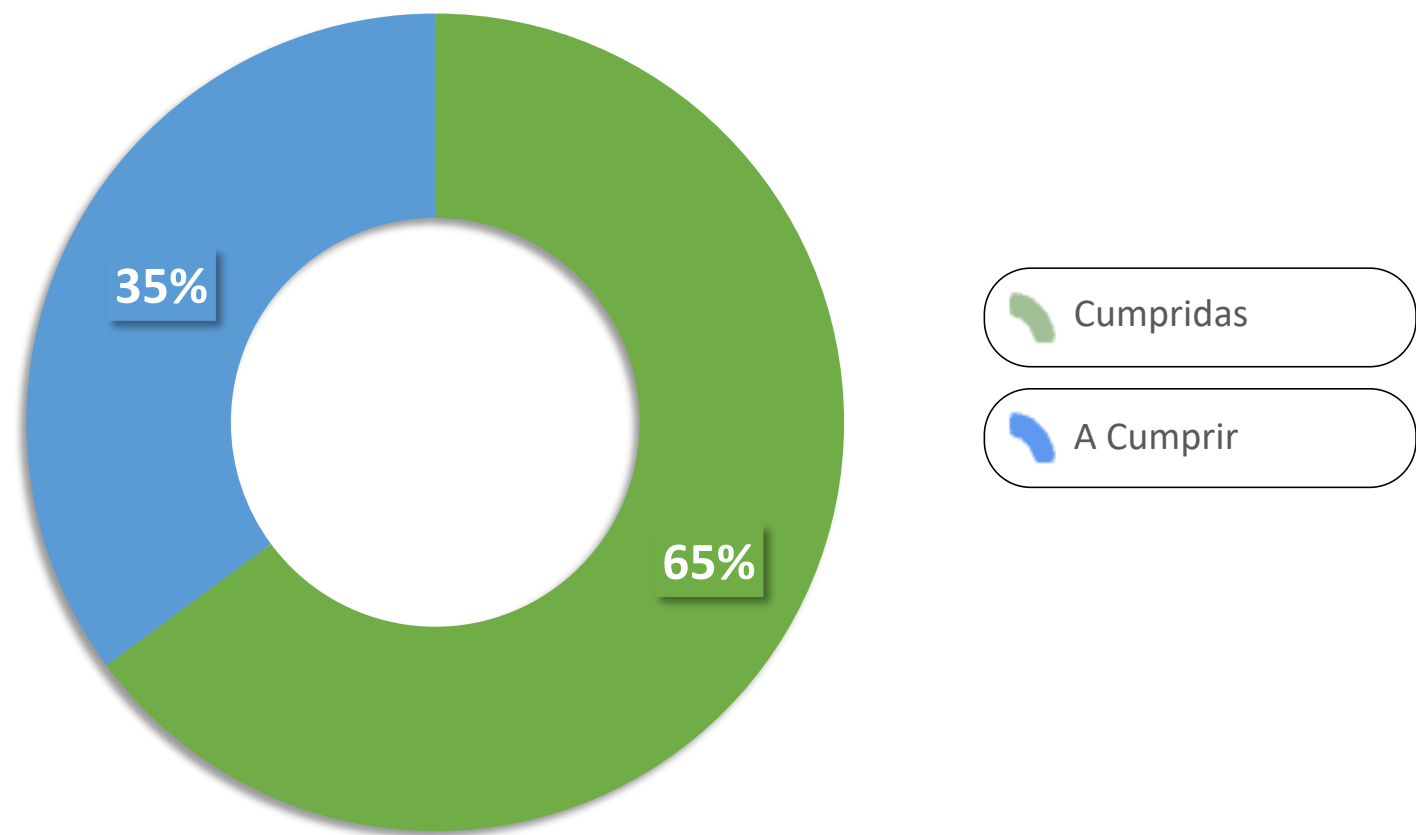

**24**  
**Metas Atingidas**  
das 37 metas totais do Projeto

**13**  
**Metas Pendentes**  
A serem cumpridas até dezembro/2026

## Panorama de Desempenho 2026

**Ponto de Atenção:** As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central e poderão ser cumpridas em 2026.

# METAS CUMPRIDAS

| SETORIAL | INDICADOR                                                            | METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNCEME  | Sistema de Previsão Climática fortalecido.                           | 1 Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.                                                                                                                            |
|          |                                                                      | 2 Previsão de afluência da água para os reservatórios estratégicos do Estado gerada duas vezes ao mês, no período de dezembro a abril, com base em dois modelos climáticos globais (ECHAM e CAM). |
| COGERH   | Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião. | 3 Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.                                                                                                                                   |
| CAGECE   | Proposta de revisão da estrutura tarifária.                          | 4 Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.                                                                                                                                  |
|          |                                                                      | 5 Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.                                                                                                                                  |
|          |                                                                      | 6 Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.                                                                                                             |
| CAGECE   | Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza.      | 7 Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.                                                                                          |
|          |                                                                      | 8 09 DMC's.                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                      | 9 18 DMC's.                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                      | 10 44 DMC's.                                                                                                                                                                                      |
| SEPLAG   | Sistema GIP implementado e em operação – SEPLAG.                     | 11 Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.                                                                                                                                    |
|          |                                                                      | 12 10% dos novos Projetos da SDA analisados através do sistema.                                                                                                                                   |
|          |                                                                      | 13 20% dos novos Projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.                                                                                                                     |

# METAS CUMPRIDAS

| SETORIAL |                                                                                             | INDICADOR | METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL) |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCE      | Percentagem de obras públicas monitoradas.                                                  |           | 14                             | Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.                                                         |
|          |                                                                                             |           | 15                             | 70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.                                                         |
|          |                                                                                             |           | 16                             | Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R\$50 milhões) monitorados.                                            |
| IPECE    | Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.                               |           | 17                             | Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.                                                                                                    |
|          |                                                                                             |           | 18                             | Estudo de Cadeias Produtivas com enfoque na produção de uso interno da água finalizado.                                                                             |
|          |                                                                                             |           | 19                             | Meta final: Estudo inter e intra-setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado.                                                 |
| CGE      | Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.                                        |           | 20                             | Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada. |
| COGERH   | Percentagem de usuários estratégicos da água regularizados                                  |           | 21                             | Meta final: 80%                                                                                                                                                     |
| COGERH   | Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição                                |           | 22                             | Meta final: 75%                                                                                                                                                     |
| ARCE     | Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada. |           | 23                             | Meta final: Resoluções Arce n.º 20/2025, e Arce n.º 23/2025 publicadas.                                                                                             |

# METAS A CUMPRIR EM 2026


| SETORIAL               |  | INDICADOR                                                                                                                                 | METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL) |                                   | PREVISÃO DE CUMPRIMENTO |
|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| CAGECE                 |  | Continuidade dos sistemas hídricos abastecidos com água do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central – CAGECE.                             | 1                              | Meta: 90                          | 12/2026                 |
| IPECE                  |  | Pessoas beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis – CAGECE.                                                                      | 2                              | Meta: 118.490                     | 12/2026                 |
| IPECE                  |  | Mulheres beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis – IPECE.                                                                      | 3                              | Meta: 61.615                      | 12/2026                 |
| CAGECE                 |  | Redução da Água Não geradora de Receita na cidade de Fortaleza (litros/conexões/dia) (número) – CAGECE.                                   | 4                              | Meta: 317                         | 12/2026                 |
| CAGECE                 |  | Maior capacidade de tratamento da água na região do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central - SRH / CAGECE.                                | 5                              | Meta: 1.900 m3/h                  | 12/2026                 |
| IPECE<br>SRH<br>CAGECE |  | Redução do tempo perdido de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água - IPECE, SRH, CAGECE.          | 6                              | Meta: Redução da diferença em 20% | 12/2026                 |
| IPECE<br>SRH<br>CAGECE |  | Redução do tempo dedicado a tarefas domésticas (Incluindo a busca de água para o domicílio) - IPECE, SRH, CAGECE.                         | 7                              | Meta: Redução da diferença em 10% | 12/2026                 |
| IPECE<br>SRH<br>CAGECE |  | Nível de satisfação dos beneficiários com o fornecimento de serviços hídricos - IPECE, SRH, CAGECE.                                       | 8                              | Meta: 70%                         | 12/2026                 |
| OUIDORIA<br>GERAL/UGP  |  | Queixas e consultas recebidas através do Mecanismo de Reparação de Queixas registradas e solucionadas – OUIDORIA GERAL/ UGP/ SRH/ CAGECE. | 9                              | Meta Final: 90                    | 12/2026                 |

# METAS A CUMPRIR EM 2026

| SETORIAL      |                                                                                     | INDICADOR | METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVISÃO DE CUMPRIMENTO |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SRH<br>COGERH | Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião - SRH / COGERH. | 10        | Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida. | 03/2026                 |
|               |                                                                                     | 11        | Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados.          | 06/2026                 |
|               |                                                                                     | 12        | Meta Intermediária 04: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú Finalizados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas.                                                                      | 12/2026                 |
|               |                                                                                     | 13        | Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas.                                                                                                                                                                                                                                   | 12/2026                 |
| CGE           | Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido – CGE.                          | 14        | Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema.                                                                                                                                                                                                                 | 06/2026                 |

# CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO COMITÊ

## 2026

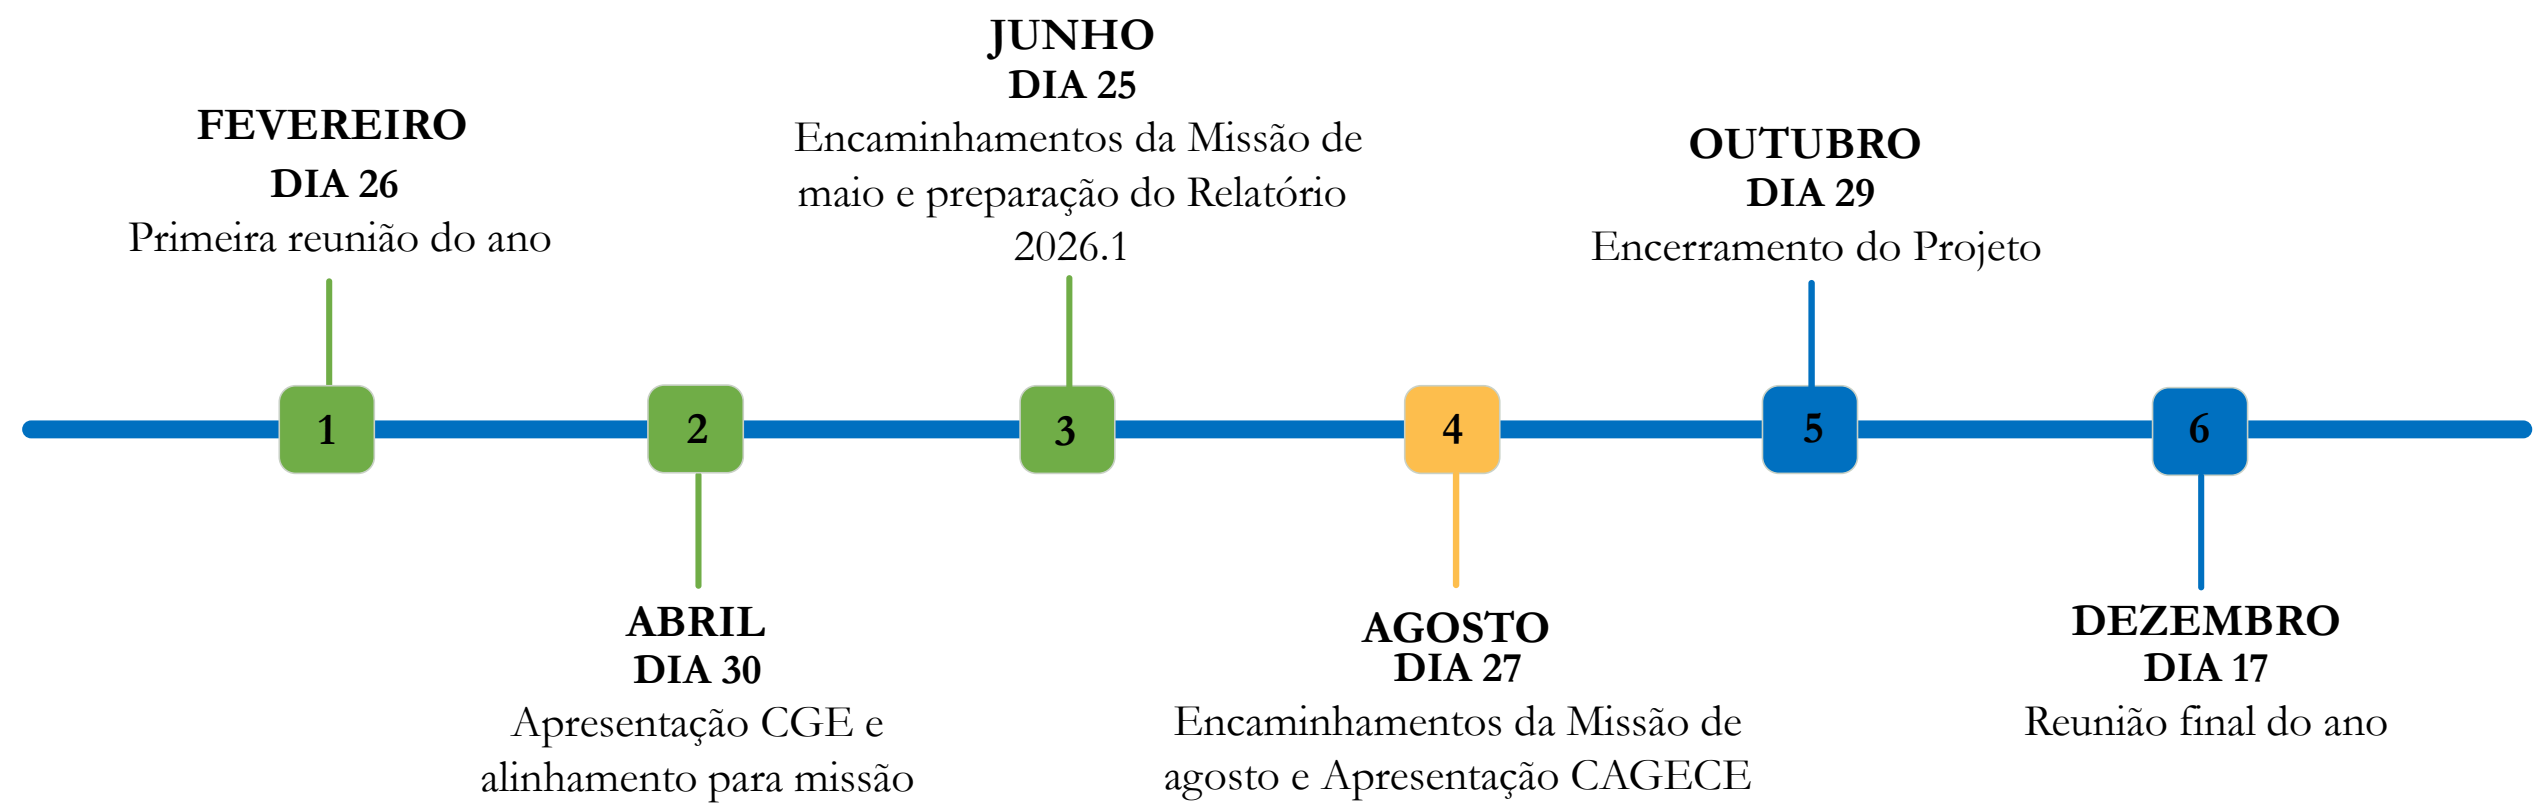

Total de 6 (seis) reuniões programadas ao longo do ano para acompanhamento das atividades.



## 6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

# APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

| SETORIAL    |   | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                                                             | FORNECEDOR                                               | APRESENTAÇÃO |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| TCE         | 1 | Sistema de monitoramento de obras (e-Obras).                                                                                                                                                                                                                          | -                                                        | OK           |
| CAGECE      | 2 | Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.                                                                                                                         | CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA                    | OK           |
| FUNCEME     | 3 | Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.                                                                   | 14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM  | OK           |
| ARCE        | 4 | Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.                                                                                                                                            | 04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA | OK           |
| IPECE       | 5 | Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.                    | 08/2022 - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA           | OK           |
| FUNCEME SDE | 6 | Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará.                                  | 12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA                            | OK           |
| IPECE SDE   | 7 | Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). | 12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA                            | OK           |

# APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

| SETORIAL |    | ATIVIDADE                                                                                                                                                                                | FORNECEDOR                                                                                                                                                                              | APRESENTAÇÃO |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| COGERH   | 8  | Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.                             | 066/2022/COGERH - CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA / REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA / IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA | OK           |
| IPECE    | 9  | Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.                                                                         | 06/2024 - ROGÉRIO BARBOSA SOARES                                                                                                                                                        | OK           |
| CAGECE   | 10 | Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.                                                                            | 0098/2023 - CONSÓRCIO MELHORIAS DE GESTÃO FALCONI CONSULTORES S.A E EFFICO SANEAMENTO LTDA                                                                                              | OK           |
| ARCE     | 11 | Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. | 0007/2023/ARCE - KROLL BRASIL LTDA                                                                                                                                                      | OK           |

# APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

| SETORIAL |    | ATIVIDADE                                                                                                                                    | FORNECEDOR                                                                                                                                                                      | APRESENTAÇÃO |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SEPLAG   | 12 | Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.     | 018/2022 - CONSÓRIO MTC: MACROPLAN – PROSPECTIVA, ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA. / TRANSPLAN – PLANEJAMENTO E PROJETOS S.A. / J C M FREITAS– SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (CHERRY IT) | OK           |
| CGE      | 13 | Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. | 07/2022 - CONSÓRCIO: CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. E CANIX SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA                                                                     | OK           |
| ARCE     | 14 | Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico               | CO/PRJ/025/2024 - MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA                                                                                                                               | OK           |
| CAGECE   | 15 | Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.                                         | 145/2022 - INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA S/S LTDA                                                                                                   | AGOSTO       |

