21ª REUNIÃO DO COMITÊ

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

Projeto de Apoio à Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará (2019 a 2026)

SEJAM BEM-VINDOS

COMEÇAREMOS EM INSTANTES

PAUTA DA REUNIÃO

1. Aprovação da Ata da 20ª Reunião do Comitê;
2. Informações importantes;
3. Acordos e Recomendações do Banco Mundial na Missão de Supervisão;
4. Gerenciamento Financeiro;
5. Projetos de Assistência Técnica a contratar; e
6. Indicadores.

1. APROVAÇÃO DA ATA

20ª Reunião do Comitê (31/08/2023)

E-mail enviado em: 16/10/2023

2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Resultado da Missão de Supervisão;
- ✓ Resultado da Revisão de Carteira – 25 a 27 de outubro de 2023;
- ✓ Apresentação dos resultados dos contratos concluídos a partir de 2024;
- ✓ Atualização dos Membros do Comitê;
- ✓ Dúvidas e entraves favor remeter, preferencialmente, por e-mail (ugp.ipf@ipece.ce.gov.br);
- ✓ Ao término dos contratos enviar Termo de Encerramento, no caso de bens enviar Termo de Recebimento Definitivo;
- ✓ Quaisquer ajustes aos contratos devem ser analisados previamente pela UGP; e
- ✓ Substituição de Especialistas Principais.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Recomendações do TCE na auditoria do Projeto:
  - Orientar pregoeiros a evitar negociação no Pregão Eletrônico, a fim de estimular os participantes a ofertarem as melhores propostas na fase de lances;
  - Anexar aos processos de pagamentos, as comprovações das atividades desenvolvidas para cada produto, decorrente de contratação de consultorias a fim de comprovar sua efetiva realização, por exemplo quando da realização de workshop, treinamentos e cursos;
  - Em serviços de consultoria, definir adequadamente os requisitos mínimos de profissionais que atendam o perfil exigido no Termo de Referência a fim de assegurar a adequada elaboração do produto; e
  - Em futuros serviços de consultoria, discutir em reunião de negociação a disponibilidade de servidores públicos para participar de serviço de consultoria, a fim de evitar o atraso nas entregas dos produtos e o descumprimento dos objetivos da contratação.

3. ACORDOS E RECOMENDAÇÕES DO BANCO MUNDIAL

NA ÚLTIMA MISSÃO

ACORDOS E RECOMENDAÇÕES DO BM MISSÃO DE SUPERVISÃO

	Encaminhamentos e Acordos	Responsável	Data acordada
1	Enviar atualização sobre o contrato da empresa Deloitte.	ARCE	30/11/2023
2	Solicitar Nota Explicativa a ser adicionada ao MOP para destacar o que significa exatamente o alcance da meta final do Indicador (Proposta da revisão da estrutura tarifária).	CAGECE	14/11/2023
3	Lançar MI de contratação do consultor para elaborar estudos relacionados à água.	IPECE	30/11/2023
4	Celeridade na Contratação do Plano de Saneamento (envio do RAT)	SCIDADES	14/11/2023
5	Atualização sobre o Contrato do Consultor Wladimir.	SCIDADES	14/11/2023
6	Reunião virtual com SRH, Banco Mundial e Engenheiro para verificar os avanços ocorridos.	SRH	05/12/2023
7	Resultados qualitativos a serem reportados pelos executores a cada produto/serviço/bens entregues.	UGP	Mensalmente

4. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

DESEMBOLSOS

Valor do Empréstimo	US$139.880.000,00
Valor da Contrapartida	US$ 34.970.000,00
Taxa Front-end Fee	US$ 349.700,00

Descrição	Data	Valor US$	% do Empréstimo
VALOR DO EMPRÉSTIMO		**139.880.000,00**	**100,00%**
TAXA DE ABERTURA (FRONT-END FEE)		**349.700,00**	**0,25%**
DESEMBOLSOS REALIZADOS		**31.897.438,31**	**22,80%**
1º e 2º Desembolsos	2020	1.539.864,78	1,10%
3º e 4º Desembolsos	2021	2.390.035,96	1,71%
5º a 7º Desembolsos	2022	16.388.752,65	11,72%
8º e 9º Desembolsos	2023	11.578.784,92	8,28%
SALDO A DESEMBOLSAR		**107.632.861,69**	**76,95%**

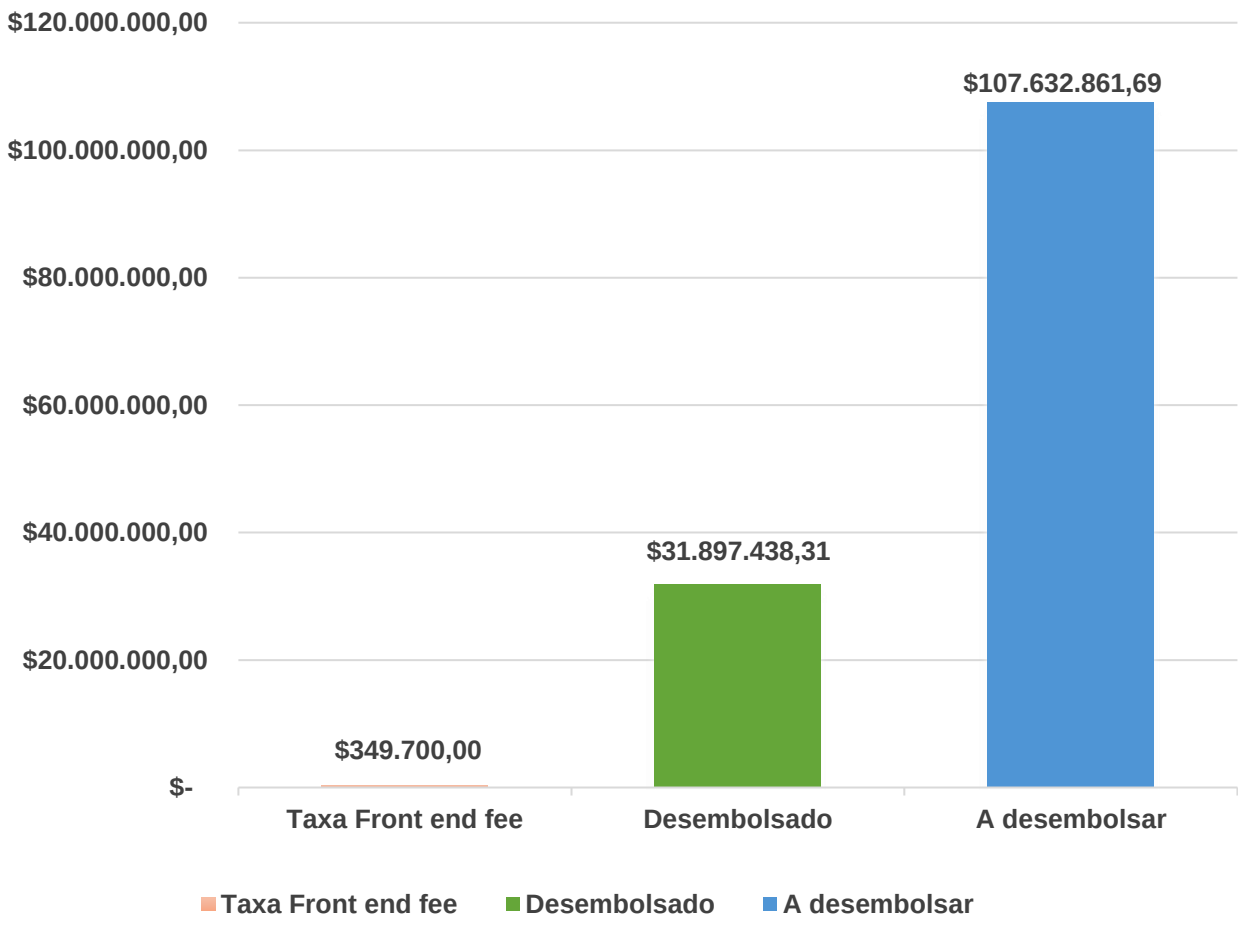

SALDO DA CONTA OPERATIVA

Saldo Conta Operativa em Outubro/2023 (US$)	
Valor Desembolsado	31.897.438,31
Valor Executado até 30/10/2023	26.255.854,28
Saldo desembolsado a Executar	**5.641.584,03**

Saldo Conta Operativa em Outubro/2023 (R$)	
Valor Desembolsado em Reais	164.338.386,02
Valor Executado até 30/10/2023	136.610.000,54
Saldo desembolsado a Executar	**27.728.385,48**

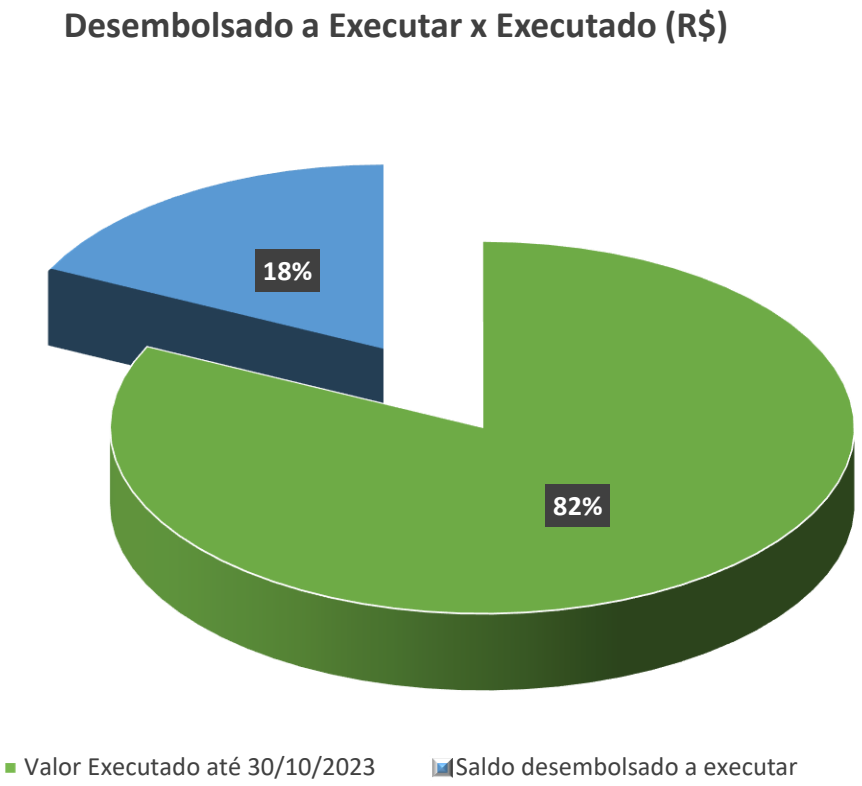

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

CONCILIAÇÃO DESEMBOLSO X EMPENHO (R$)

Ano	Desembolsos	Empenhos	Pagamentos			Saldo da Conta
			Orçamento	Restos a pagar	Total	
2020	8.177.297,92	2.420.219,32	824.905,89	-	824.905,89	7.352.392,03
2021	13.013.218,72	12.677.021,55	8.632.583,45	1.595.313,43	10.227.896,88	10.137.713,87
2022	84.524.326,79	74.955.949,05	69.963.059,00	4.042.621,87	74.005.680,87	20.656.359,79
2023	58.623.542,59	52.153.614,01	46.732.681,84	4.818.835,00	51.551.516,84	27.728.385,54
Total	**164.338.386,02**	**142.206.803,93**	**126.153.230,18**	**10.456.770,30**	**136.610.000,48**	

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

DESEMBOLSO X EMPENHOS (R$)

Período	Desembolsado	Saldo Internalização	Empenhado	Saldo Financeiro Acumulado
2020	8.177.297,92	8.177.297,92	2.420.219,32	5.757.078,60
2021	13.013.218,72	18.770.297,32	12.677.021,55	6.093.275,77
2022	84.524.326,79	90.617.602,56	74.955.949,05	15.661.653,51
2023	58.623.542,59	74.287.012,33	52.153.614,01	22.133.398,32

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

SETORIAL	CONTRATADO/FORNECEDOR	Valor Executado em R$		
		2022		2023
		Total Empenhado	Total pago	Restos a Pagar
SCIDADES	WLADIMIR ANTÔNIO RIBEIRO	50.000,00	-	50.000,00

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

SUMÁRIO – LOA, EMPENHOS E PAGAMENTOS 2023 EM R$

Execução Orçamentária 2023							
SETORIAL	Lei +Crédito	Valor empenhado 2023	Valor pago 2023	Saldo (Lei + crédito- valor empenhado)	Saldo Valor Empenhado/pago	Empenhado/LOA	Pago/ Empenhado
ARCE	4.676.400,00	33.758,06	33.758,06	4.642.641,94	-	1%	100%
CAGECE	44.007.980,00	2.018.801,17	2.018.801,17	41.989.178,83	-	5%	100%
CGE	1.920.000,00	1.680.000,00	1.360.000,00	240.000,00	320.000,00	88%	81%
FUNCEME	10.050.000,00	5.722.913,42	1.507.750,44	4.327.086,58	4.566.094,58	57%	26%
IPECE	5.939.022,00	2.924.915,00	2.039.145,81	3.014.107,00	885.769,19	49%	70%
SCIDADES	675.000,00	-	-	675.000,00	-	0%	0%
SEPLAG	1.275.000,00	613.829,88	613.829,88	661.170,12	-	48%	100%
SRH	171.907.116,30	34.755.928,20	34.755.928,20	137.151.188,10	-	20%	100%
COGERH	22.626.757,00	4.403.468,28	4.403.468,28	18.223.288,72	-	19%	100%
TCE	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	0%	0%
TOTAL GERAL	**265.577.275,30**	**52.153.614,01**	**46.732.681,84**	**213.423.661,29**	**5.420.932,17**	**20%**	**90%**

RECOMENDAÇÕES A SEREM SEGUIDAS
DESEMBOLSOS POR EMPENHO

❑ **Critérios a serem seguidos pelos órgãos executores quanto aos empenhos dos contratos adjudicados:**

i. Enviar para a UGP (Financeiro) à cada assinatura de contrato (seja de qualquer modalidade) o **cronograma de execução física e financeira** com a estimativa de necessidade de recursos;

ii. É vedada a realização de **despesa sem prévio empenho**;

iii. Evitar **empenhos globais que ultrapassem o exercício vigente** sobre os valores contratados;

iv. **Contratos de Obra:** Empenho deverá ser **equivalente ao valor total das estimativas das medições** a serem entregues pela construtora, dentro do que foi planejado pela setorial a desembolsar no período de até seis meses;

v. **Contratos de serviços distintos de consultoria:** Empenho deverá ser **equivalente ao valor estimado dos serviços** a serem executados pelas empresas, dentro do que foi estimado a desembolsar no período de até seis meses;

vi. **Contratos de serviços de consultoria:** Empenho deverá ser **equivalente ao valor estimado dos produtos\serviços** a serem entregues pela empresa, dentro do que foi estimado a desembolsar no período de até seis meses; e

vii. **Aquisição de bens:** Empenho deverá ser **equivalente ao valor estimado do bem** a ser entregue pelo fornecedor.

EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

STATUS	Nº CONTRATOS	CONTRATADO		PAGO	
		R$	US$	R$	US$
Em execução	34	861.037.745,05	171.431.231,37	111.714.693,70	21.556.184,87
Concluído Financeiramente, mas em execução física	13	9.292.256,86	1.756.381,87	9.292.256,86	1.756.381,87
Concluído	31	15.219.427,09	2.869.916,29	15.219.427,09	2.869.916,29
Rescindido	3	383.622,89	73.371,25	383.622,89	73.371,25
TOTAL	**81**	**885.933.051,89**	**176.130.900,78**	**136.610.000,54**	**26.255.854,28**

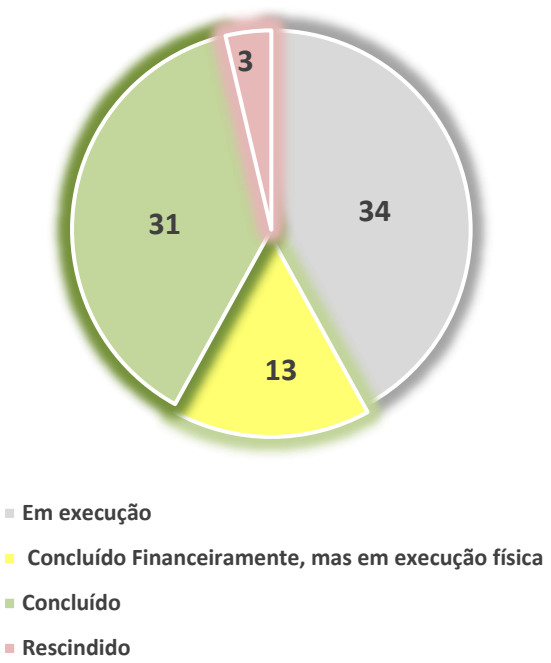

EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

Setorial		Nº de Subprojetos	Nº de Contratos	Nº Contratos Em Execução (Vigente)	Contratos Rescindidos	Nº Contratos Concluídos	Valor Contratado + Patronal FONTE BIRD (R$)	Valor Pago (R$) Até 30/10/2023	Saldo a Pagar (R$)	% Pago Setorial	% Pago Total
1	ARCE	3	2	2	0	0	3.478.133,96	33.758,06	3.444.375,90	0,97%	0,00%
2	CAGECE	5	6	5	0	1	79.793.374,52	2.756.933,18	77.036.441,34	3,46%	0,31%
3	CGE	1	1	1	0	0	4.000.000,00	1.680.000,00	2.320.000,00	42,00%	0,19%
4	CIDADES	2	1	1	0	0	217.800,00	0,00	217.800,00	0,00%	0,00%
5	COGERH	6	13	6	1	6	27.667.645,41	11.676.866,87	15.990.778,54	42,20%	1,32%
6	FUNCEME	13	22	8	0	14	15.922.433,87	11.348.383,92	4.574.049,95	71,27%	1,28%
7	IPECE	14	16	12	1	3	7.625.925,14	4.874.259,91	2.751.665,23	63,92%	0,55%
8	SDE	4	3	2	0	1	5.780.028,94	3.895.030,30	1.884.998,64	67,39%	0,54%
9	SEPLAG	2	4	4	0	0	2.415.114,42	961.419,60	1.453.694,82	39,81%	0,11%
10	SRH	8	10	5	1	4	736.600.670,68	96.951.423,75	639.649.246,93	13,16%	10,94%
11	TCE	2	3	1	0	2	2.431.924,95	2.431.924,95	0,00	100,00%	0,27%
TOTAL		**60**	**81**	**47**	**3**	**31**	**885.933.051,89**	**136.610.000,54**	**749.323.051,35**	**-**	**15,42%**

5. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

IPF-CEARÁ

IPECE 20 ANOS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

02 OBRAS

33 CONSULTORIAS

08 SERVIÇOS

17 BENS

60 ATIVIDADES

ATIVIDADES A CONTRATAR

	Nº	SETORIAL	CATEGORIA DE GASTOS	ATIVIDADE	Previsão de Assinatura
COMPONENTE 1	1	SRH	Consultor Individual	Prestação de Serviços de Consultoria para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Dez/23
	2	FUNCEME	Bens	Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com instalação e treinamento.	Nov/23
	3	COGERH	Bens	Aquisição de 11 (onze) Estações Gráficas (Workstation) para Processamento de Nuvem de Pontos.	Fev/24
COMPONENTE 3	4	IPECE	Consultor Individual	Consultor Individual Especialista em Gestão Socioambiental para prestar suporte técnico a Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP.	Nov/23
	5	IPECE	Consultor Individual	Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	Mar/24
	6	SCIDADES	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	Fev/24
	7	FUNCEME SDE	Consultoria	Contratação de Serviços para Transferência de Conhecimento e Tecnologia com Orientação Técnica Especializada e Treinamento Extensivo na Metodologia Surface Renewal (Fundação).	Dez/23
	8	SEPLAG	Bens	Aquisição de Imagem e Som para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	Dez/23
	9	ARCE	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	Fev/24

SUBPROJETOS

CONSULTORIA DE EMPRESA E INDIVIDUAL

Nº de Subprojetos	Quantidade	Status
33 Consultorias (Empresa e Individual)	00	A Iniciar
	03	Em Atividades Preparatórias
	00	Remetidos para “Não Objeção Técnica” via Sistema STEP
	02	Em Licitação / Assinando Contrato
	28	Contratos / Concluídos

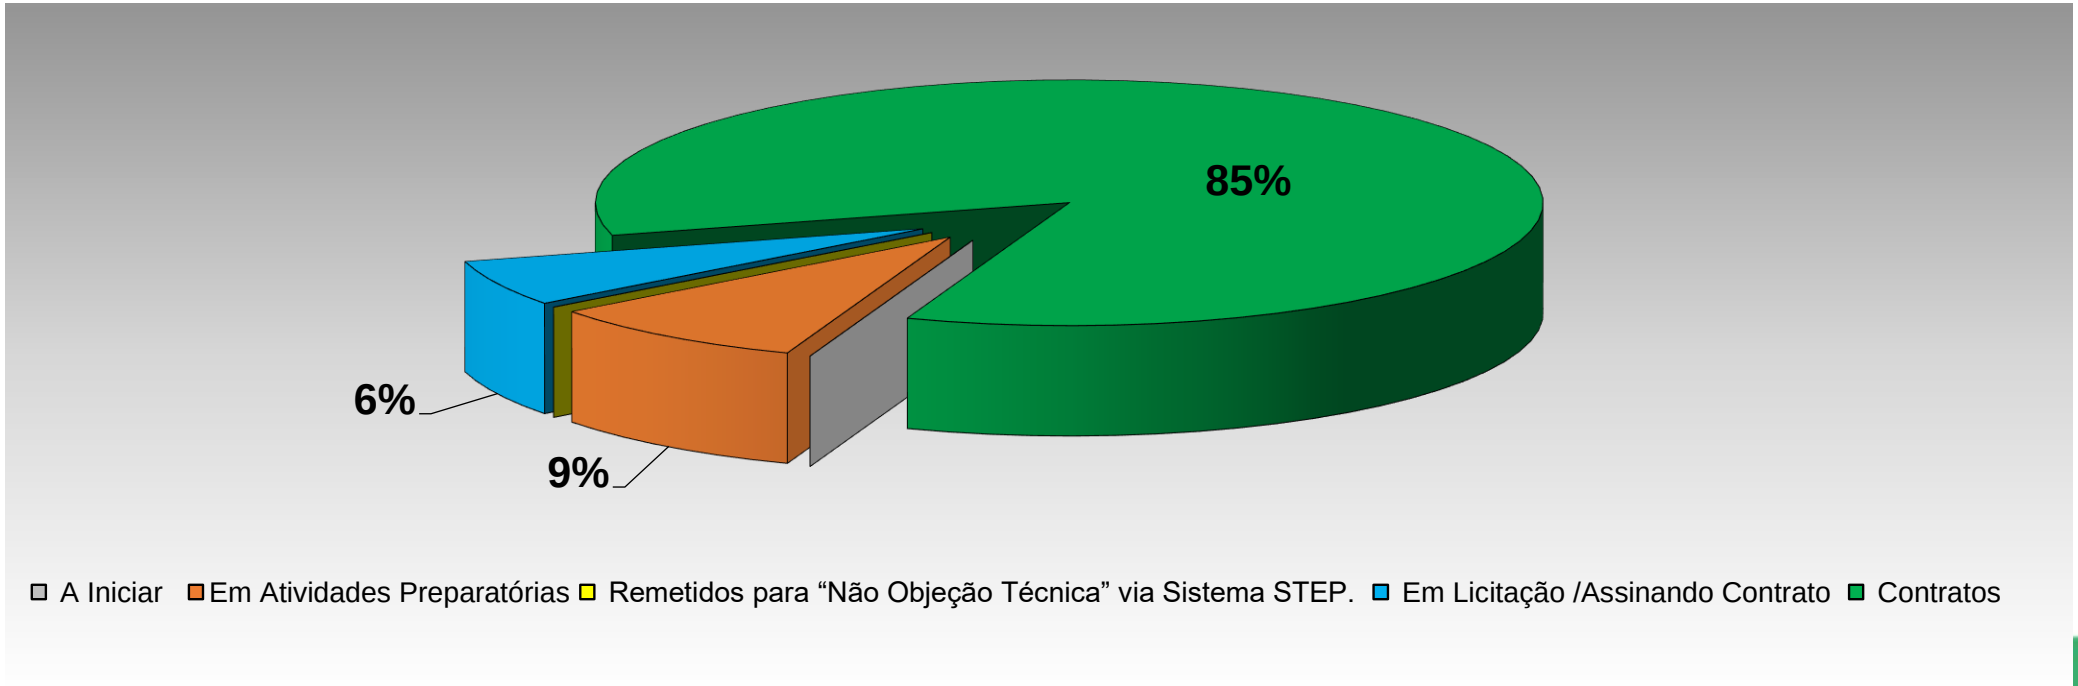

SUBPROJETOS

OBRAS, BENS E SERVIÇOS DE NÃO CONSULTORIA

Nº de Subprojetos	Quantidade	Status
27 Obras, Bens e Serviços de Não Consultoria	00	A Iniciar
	00	Em Atividades Preparatórias
	00	Remetidos para “Anuência Técnica” da UGP
	01	Em Licitação / Assinando Contrato
	26	Contratos / Concluídos

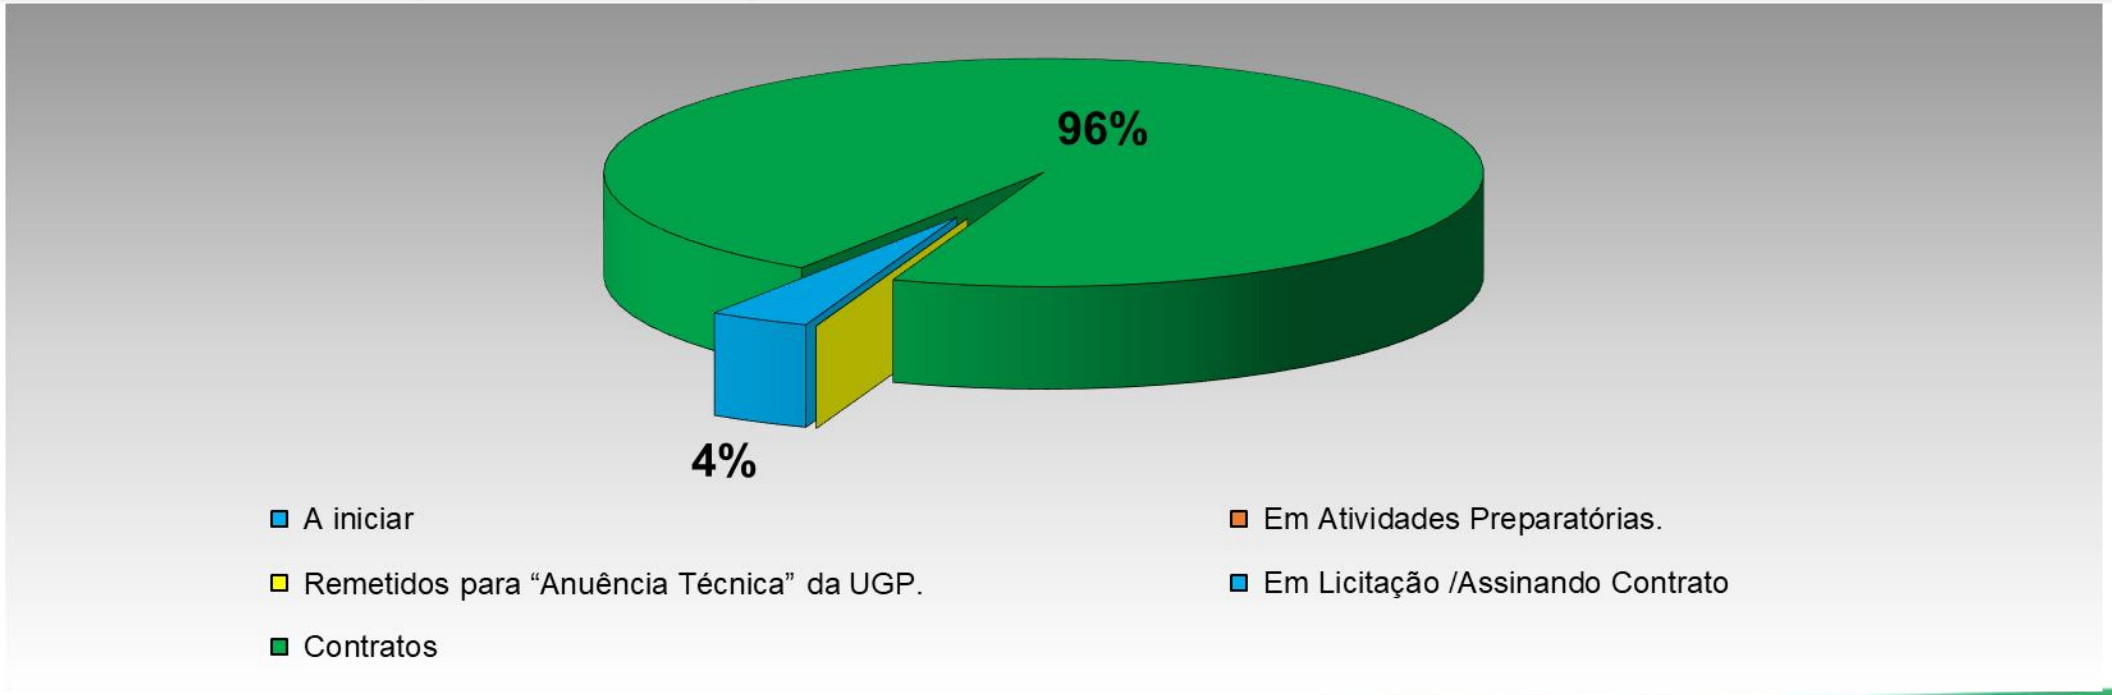

NÚMERO DE SUBPROJETOS X SUBPROJETOS CONTRATADOS

Nº de Subprojetos	SRH	COGERH	FUNCEME	CAGECE	CIDADES	ARCE	CGE	IPECE	SDE	SEPLAG	TCE	TOTAL
Nº DE PROJETOS	8	6	13	5	2	3	1	14	4	2	2	60
PROJETOS CONTRATADOS	7	6*	12	5	1	2	1	13*	3	2*	2	54

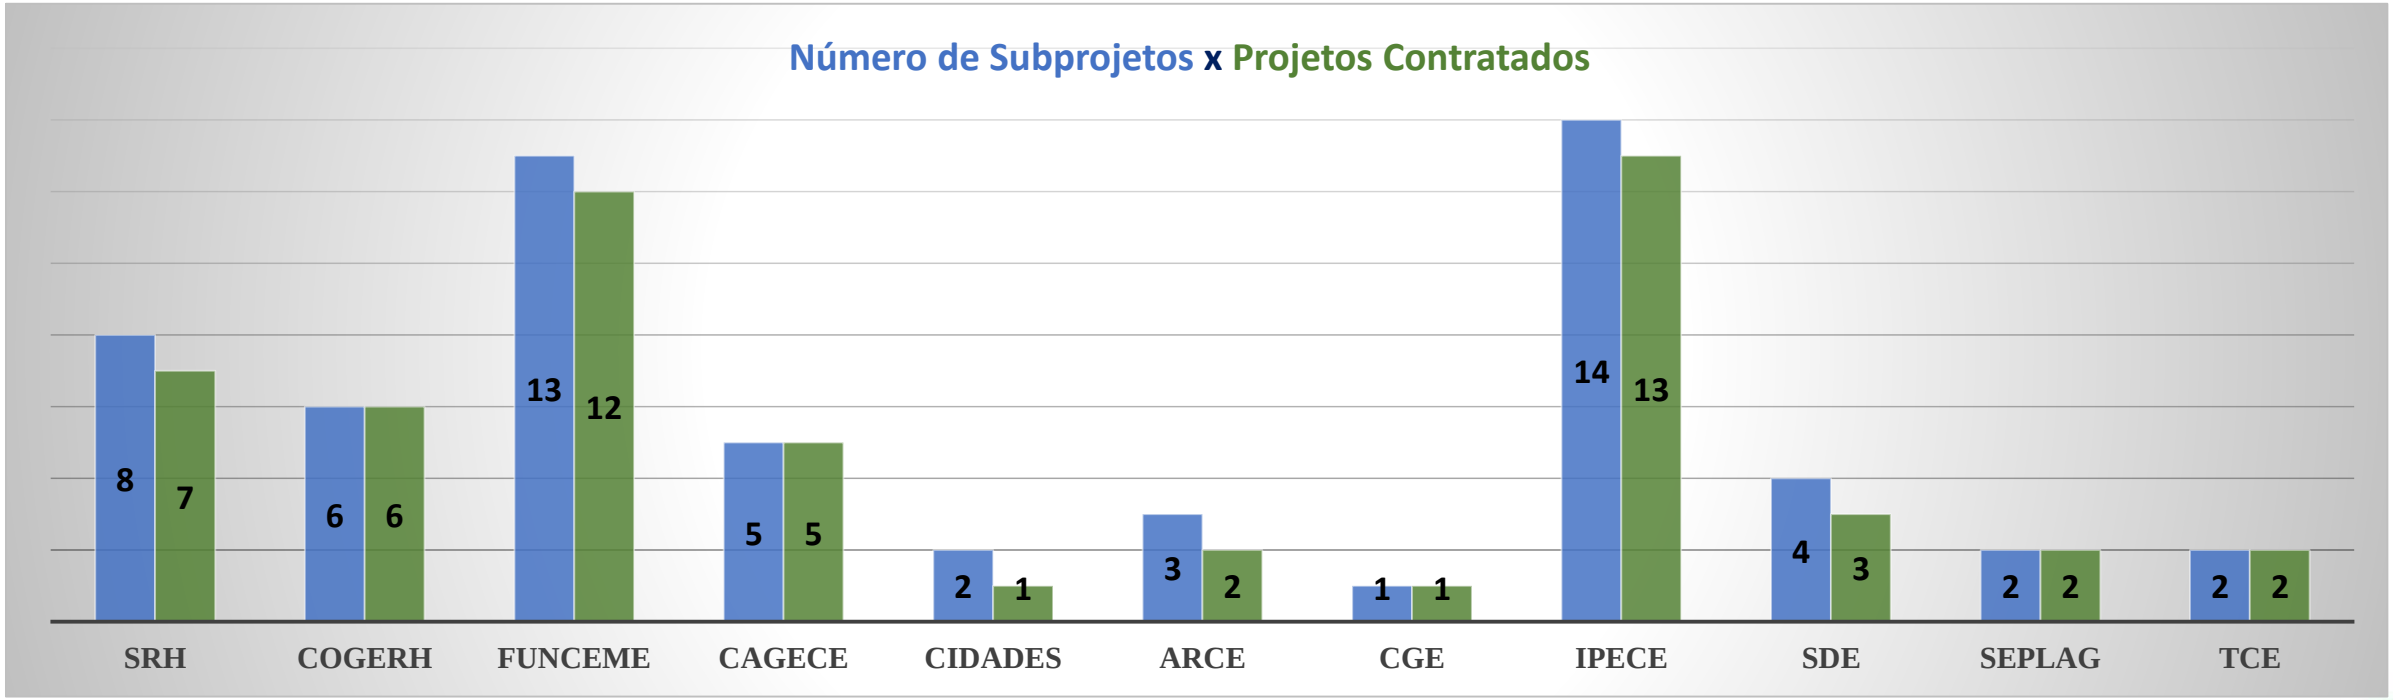

* Aguardando finalização do último contrato.

Componente I:
Aumento da Segurança Hídrica

SRH | SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

01 OBRA

05 CONSULTORIAS

02 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - SRH

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. **Há Indicador associado**	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022 em **Execução - CONSÓRCIO ÁGUAS DO SERTÃO.**
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Implantação do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. **Há Indicador associado**	Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022 em **Execução - CONSÓRCIO TPF ENGENHARIA LTDA / KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A.**
3	Bens	Aquisição de equipamentos de TI para suporte ao Projeto Malha D'Água.	Contratos nº 07, 08 e 09/2022 - **Concluídos.**
4	Bens	Aquisição de GPS Geodésico para suporte ao Projeto Malha D'Água e às ações de regulação de uso.	Contrato nº 04/SRH/CE/2020 - **Concluído**.
5	Consultoria Individual	Prestação de Serviços de Pessoa Física para Proposição de um Modelo de Gestão para o Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central (SAB-SC).	Negociando o contrato com o consultor, com expectativa de conclusão até o dia 10/11.
6	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Geotecnia. **Há Indicador associado**	Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023 em **Execução - MANOEL DE SOUZA FREITAS JUNIOR**
7	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidromecânica. **Há Indicador associado**	Contrato nº 03/SRH/CE/2020 em **Execução - JOÃO CARLOS BRITO DE SOUZA**
8	Consultoria Individual	Painel de Especialistas para as Barragens Banabuiú e Gavião: Especialista em Hidrologista. **Há Indicador associado**	Contrato nº 01/SRH/CE/2020 em **Execução - RONEI VIEIRA DE CARVALHO**

COGERH Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos

02 CONSULTORIAS

01 SERVIÇO

03 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - COGERH

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisições de Estações de Medição Fixas, visando a Universalização da Macromedição da COGERH. ***Há Indicador associado***	Contratos nº 014, 015 e 016/2021/COGERH. **Concluído Financeiramente, mas em execução física.**
2	Bens	Aquisições de Estações de Medição Portáteis.	Contrato nº 039/2020/COGERH - **Concluído**.
3	Serviços	Instalações das Estações de Medição Fixas e pequenos serviços de engenharia para instalação de medidores de vazão. ***Há Indicador associado***	Contrato nº 010/2023/COGERH - em **Execução** - **CONSÓRCIO MLG E RC MEDIÇÕES**.
4	Consultoria	Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará. ***Há Indicador associado***	Contrato nº 066/2022/COGERH em **Execução** - **CONSÓRCIO HYDROS / REGEA / IRRIGART.**
5	Bens	Aquisição de Equipamentos para uso da Fiscalização de Recursos Hídricos.	1– Equipamentos de TI: **Concluído**; 2 – Aquisição de Drones: Contrato nº 071/2022/COGERH. **Concluído Financeiramente, mas em execução física; e** 3 – Aquisição de Workstations: Processo de Pregão Eletrônico em análise na PGE com posterior lançamento.
6	Consultoria	Planos de Segurança das Barragens Banabuiú e Gavião (Salvaguardas). ***Há Indicador associado***	Contrato nº 072/2022/COGERH em **Execução** - **GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.**

FUNCEME | FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

02 CONSULTORIAS

04 SERVIÇOS

07 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de Equipamentos para Instrumentação e Monitoramento de Bacias Hidráulicas.	Contratos: 04/2021, 05/2021, 06/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022 e 05/2022 - **Concluídos.**
2	Bens	Aquisição de licença do ArcGis.	Contrato nº 04/2020 - **Concluído**.
3	Serviços	Serviço de Implantação das Estruturas de Base e Proteção das Estações Meteorológicas e Estações linimétricas em Áreas próximas a 13 (treze) Reservatórios no Estado do Ceará.	Contrato nº 11/2023 em **Execução** - **CONSTRUTORA ALVES SANTIAGO LTDA.**
4	Serviços	Serviços de Laboratório para Análises Físico-químicas e Biológicas em Amostras de Água Bruta de Corpos Hídricos Superficiais localizados no Ceará.	Contrato nº 06/2023 em **Execução** - **CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA.**
5	Consultoria Individual	Assessoria Técnica do Monitoramento da Qualidade de Água, por Satélite, em Reservatórios do Estado Do Ceará.	Contrato nº 07/2022 em **Execução** - **JEAN-MICHEL MARCEL ALBERT MARTINEZ.**
6	Bens	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Agrometeorológico.	Contrato nº 08/2021 – **Concluído.**

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA - FUNCEME

Nº	Método	Subprojetos	Status
7	Serviços	Serviços de Engenharia para Instalação de Estações Meteorológicas.	Contrato nº 16/2021 - **Concluído**.
8	Bens	Aquisição de sistema de Radar Meteorológico de Precipitação, Banda X, Doppler de Dupla Polarização Ortogonal Simultânea, com instalação e treinamento.	Pregão Eletrônico nº 20230005-FUNCEME/NUMON realizado em 04/10/2023. UGP emitiu anuência para parecer conclusivo em 20/10/2023.
9	Bens	Aquisição de 3 (três) Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT's (drones), com acessórios, e de 2 (dois) sistemas (softwares) de processamento de imagens.	01 – Drones e Software - Contratos em **Execução**: Contratos nº 02/2023 **- GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT LTDA;** e nº 03/2023 **- G DRONES COMERCIO E SERVICOS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS LTDA - Concluído Financeiramente, mas em execução física.** 02 – Contratos nº 08/2023 em **Execução** - **SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**
10	Consultoria	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	Contrato nº 14/2021 - **Concluído**
11	Bens	Aquisição de Equipamentos de Informática para Suporte ao Monitoramento e Previsão Hidroambiental.	Contratos nº 17/2022 e nº 19/2022 **- Concluídos.**
12	Bens	Cluster para modernização do Sistema de Previsão climática e de afluências aos principais reservatórios do Estado. ***Há Indicador associado***	Contratos nº 10/2023 em **Execução** - **VERSATUS HPC, INC.**
13	Serviços	Capacitação e Treinamento de Técnicos da FUNCEME.	Contrato nº 21/2022 em **Execução** - **MAESTRIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA.**

Componente II:
Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

Cagece

01 OBRA

04 CONSULTORIAS

COMPONENTE II

MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA - CAGECE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Obras	Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). ***Há Indicador associado***	Lote I: Contrato nº 0093/2023 - OS: 06/06/2023 **CONSÓRCIO FLORESTA E EXPEDICIONÁRIOS**
			Lote II: Contrato 0059/2023 – OS: 06/05/2023 **CONSÓRCIO TELAR-ENORSUL-BBL**
2	Consultoria	Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. ***Há Indicador associado***	Contrato nº 051/2023 – OS: 06/05/2023 **CONSÓRCIO IGNEO INGENIERÍA SOSTENIBLE, S.L., NIP GLOBAL LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**
3	Consultoria	Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da CAGECE.	Contrato nº 145/2022 em **Execução - INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PUBLICA S/S LTDA.**
4	Consultoria	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. ***Há Indicador associado***	Contrato nº 201/2021 – **Concluído**.
5	Consultoria	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	Contrato 98/2023 - Assinado dia 23/05/2023 - **CONSÓRCIO FALCONI CONSULTORES S.A e EFFICO SANEAMENTO LTDA.** **Aguardando a emissão da Ordem de Serviço.** **Acordado na missão a emissão até o final de outubro/2023.**

Componente III:
Fortalecimento da Gestão do Setor Público

ARCE | AGÊNCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARÁ

03 CONSULTORIAS

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - ARCE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará. ***Há Indicador associado***	Contrato nº 07/ARCE/2023 em **Execução - KROLL BRASIL LTDA**.
2	Consultoria	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	Contrato nº 04/ARCE/2023 em **Execução - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA**.
3	Consultoria	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico.	ARCE instruindo o processo de Edital de Solicitação de Proposta, com posterior envio a Cel04/PGE. **Acordado na Reunião do Comitê: Assinatura do contrato em Fevereiro/2024.**

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

10 CONSULTORIAS

03 SERVIÇOS

01 BEM

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - IPECE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Contratação de Empresa de Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado Do Ceará e Atualização dos Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará. - ***Há Indicador associado***	Contrato nº 08/2022 em **Execução - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA.**
2	Consultoria	Empresa Especializada para Realização de Treinamentos com Foco no "Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Através da Capacitação em Análise de Dados, Ferramentas de Business Inteligence (BI) e Avaliação de Políticas Públicas".	Contrato nº 10/2022 em **Execução - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.**
3	Serviço	Realização de Pesquisas Domiciliares na Área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central. ***Há Indicador associado***	Contrato nº 05/2023 em **Execução** – **INSTITUTO OLHAR PESQUISA E INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA**
4	Consultoria Individual	Consultor Individual Especialista em Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela De Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	IPECE ajustando o Termo de Referência e elaborando a Estimativa de Custo.
5	Consultoria Individual	Suporte Técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1 - Contratos nº 02/2020, 03/2020, 04/2020, 09/2020 e 02/2021 em **Execução; e** 2- Consultora Socioambiental – IPECE elaborado o Relatório de Avaliação Curricular.
6	Bens	Suporte em Aquisições de Bens para Unidade de Gerenciamento de Projetos.	1. Contratos nº 13/2022; nº 14/2022; nº 16/2022 e 17/2022 - C**oncluídos Financeiramente, mas em execução física.**

SDE **FUNCEME**

03 CONSULTORIAS

01 BEM

SDE **IPECE** INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

01 CONSULTORIA

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SDE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado). SDE/IPECE	Contrato nº 12/2022 em **Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.**
2	Consultoria	Levantamento Cadastral de Irrigantes e Determinação de Demanda Hídrica para o Setor Agropecuário das Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado. SDE/FUNCEME	Contrato nº 12/2022 em **Execução - 3V3 TECNOLOGIA LTDA.**
3	Consultoria	Contratação de Serviços para Transferência de Conhecimento e Tecnologia com Orientação Técnica Especializada e Treinamento Extensivo na Metodologia Surface Renewal (Fundação). SDE/FUNCEME	Banco validou a contratação da Fundação. Será realizada reunião de negociação contratual com a Fundação. **Acordado na Missão de outubro: Assinatura do contrato em dezembro/2023.**
4	Bens	Fornecimento e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados para Metodologia Surface Renewal (SR). SDE/FUNCEME.	Contrato nº 06/2020 - **Concluído**.

SCIDADES | SECRETARIA DAS CIDADES
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

02 CONSULTORIAS

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SCIDADES

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.	SCIDADES avaliando as propostas (06 Propostas recebidas). Acordado o envio do Relatório de Avaliação Técnica para análise da UGP até o dia 14/11. **Acordado na Reunião do Comitê: Assinatura do contrato em fevereiro/2024.**
2	Consultoria Individual	Consultor Jurídico Individual, Especialista em Saneamento Básico, para Adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	Contrato nº 20/2022 em **Execução - WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO.**

CGE | CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

01 CONSULTORIA

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - CGE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. ***Há Indicador associado***	Contrato nº 07/2022 em **Execução - CONSÓRCIO CONFIDERE E CANIX.**

SEPLAG | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

01 CONSULTORIA

01 BEM

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - SEPLAG

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Consultoria	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará. **Há Indicador associado**	Contrato nº 018/2022 em **Execução - CONSÓRIO MTC: MACROPLAN / TRANSPLAN / J C M Freitas–serviços de Informática (CHERRY IT).**
			1) Aquisição de Equipamentos de TI: Contratos nº 02/2023 – **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA** e 03/2023 – **TORINO INFORMÁTICA** - **Concluído Financeiramente, mas em execução física;**
2	Bens	Aquisição de Mobiliário de Equipamentos de TIC para Estruturação da Área de Gestão de Investimento Público da Secretaria do Planejamento e Gestão.	**2) Aquisição de Mobiliário**: Contrato nº 022/2023 - **ESL LICITA COMÉRCIO E SERVIÇOS - Aguardando a emissão da Ordem de Fornecimento;** e **3) Aquisição de equipamentos**: (07 itens) de Imagem e Som: Sessão de Disputa no dia 15/09/2023. Dos 07 itens, 02 foram emitidos Pareceres favoráveis para assinatura do contrato. Serão analisados as propostas dos demais itens para verificar a proposta com posterior emissão de Parecer.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

02 BENS

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO - TCE

Nº	Método	Subprojetos	Status
1	Bens	Aquisição de Equipamentos (Vant's), Software e Treinamento para Auditoria e Monitoramento de Obras de Infraestrutura Hídrica.	Contratos nº 35 e 36/2021 – **Concluídos.**
2	Bens	Aquisições de Equipamentos para Desenvolver Solução de Monitoramento de Obras de Engenharia que Consiste na Elaboração de uma Base Analítica Composta de Mecanismo de Coleta de Dados e Painéis de Monitoramento de Obras de Engenharia por Meio da Tecnologia de Business Intelligence e Aplicação de Modelos de Machine Learning. **Há Indicador associado**	Contrato nº 44/2022 - **LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.** **Concluído Financeiramente, mas em execução física**

6. INDICADORES

SUMÁRIO DE METAS

CUMPRIDAS	A CUMPRIR			TOTAL*
	2024	2025	2026	
9	12	5	11	37

*81% das metas tem alta probabilidade de serem atingidas dentro dos prazos originais. As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central.

METAS CUMPRIDAS

Setorial	Indicador	Metas (Intermediárias e Final)
FUNCEME	Sistema de Previsão Climática fortalecido	Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião	Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.
CAGECE	Proposta de revisão da estrutura tarifária	Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.
		Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.
		Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.
		Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.
TCE	Percentagem de obras públicas monitoradas	Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico	Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada.

Próxima Reunião do Comitê

14/12/2023

PRESENCIAL

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ 20 ANOS

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO
