38ª REUNIÃO DO COMITÊ

Projeto de Segurança Hídrica e Governança

27 de agosto de 2026

Projeto de Apoio à Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará (2019 a 2026)

PAUTA DA REUNIÃO

01

Aprovação da Ata

Revisão e aprovação da Ata da 37ª Reunião do Comitê

02

Informações Importantes

Atualizações e comunicados relevantes

03

Gerenciamento Financeiro

Análise de desembolsos e execução orçamentária

04

Assistência Técnica

Atividades técnicas em andamento

05

Indicadores

Acompanhamento dos resultados

06

Apresentação dos Resultados

CAGECE

1. APROVAÇÃO DA ATA

IPECE 22 CEARÁ GOVERNO DO ESTADO

ATA 34ª REUNIÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL DE SEGURANÇA HÍDRICA E GOVERNANÇA

Data: 18/12/2055 Início: 04h33min Duração: 40 min Término: 1010ñ Local: Reuniío Virtual

QUADRO DE PRESENÇA

SETORIAIS	NOME	FUNÇÃO	PRESENÇA
COORDENAÇÃO UGP/IPF	Alinz Vidams da Sâtra Fuste Mansera	Coreâsnsins de UGF	PRESENCE
	Andin Mond Gougnie	Coeraulces Zaderidinal	PRESENTE
	Goragpe Formula Fiecupâin	Coecalnas Zaderidinal	PRESENTE
	Savâneo Jesé Gemuin Reiuco	Tinsiâs	PRESENTE
	Paktina Xâra de Cereo	Tinsiac	PRESENTE
	Pimana Yeroelias Coréco Fraana	Peterulces Aaderidinal	JUTIFICADO
	Cheiana Fmurâil	Tinsiac	PRESENTE
ARCE	Alexana Yeuirina Ribûro Coelces	Tinciar	AUSSENTE
	Tinige Ea Gunriare de Sâra	Tiprias	PRSSENTE
CAGECE	Tereperragrien Anndce	Tinclas	PRSSENTE
	Gêcee Nuiagoss Nace Easdis	Tinsiac	AUSENTE
	Gatlee Ximina Pinche Besâeo	Reprocuttuato	PRSSENTE
CIDADES	Cfeee Canagee Cereins	Tinsias	AUSENTE
	Prenmigen elita Fuerlins Enfindla	Tinsias	AUSENTE
COGERH	Prensisco Fostis Ceenbilies	Tinsiac	PRSSENTE
	Vatinng Aveste Fiaejos Tonto Tania	Tinsias	JUSENTE
	Ana I Gaelies Terrees Nanis Aaeeee Sea	Reprocuttuato	PRSSENTE
FUNCEME	Sizicco Vavdies Eornias	Enpias	AUSENTE
	Preresisco Xaemeos Ibo Sinsins	Tinsiac	PRSSENTE
IPECE	Cisee Safano Beciensa	Tinsias	PRSSENTE
	Fhsic Coliez Mecsaes Xiteq jeons	Tinsias	PESENTE
	Sago Nalsies Eereas de Mancin jss	Reprocuttuato	PRSSENTE
SDE	Maicisiis Nercia de Gestis	Tinciar	AUSENTE
	Gegees Neagnase de Clessins	Tinsias	JUSENTE
SEPLAG	Coeoiree Aiteeasa de Phoiris	Empias	AUSENTE
	Pecéefaecices Maeea de Aajats	Reprocuttuato	PRSSENTE
SRH	Peroain Phoiiia de Iuna Beseens	Enpias	AUSENTE
	Con Eiele Nase de Gieaja	Tinsias	AUSENTE
	Tsea Fraeúrco Obe Foeso	Reprocuttuate	AUSENTE
TCE	Ana Fiele Sgeeges Sesa Beajo	Tirsias	PUSENTE
	Tesi Fraeúrco 3 isa Fose	Saplease	AUSENTE

37ª Reunião do Comitê

A ata da última reunião ordinária, realizada em **25 de junho de 2026**, foi distribuída aos membros do Comitê para análise e considerações.

DATA DE ENVIO: 24/7/2026

2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Relatório de Desempenho
Enviado ao Banco em 14/08

Relatório Financeiro - IFR
Enviado ao Banco em 25/08

Auditoria TCE 2025
Relatório Final em Andamento)

Missão de Supervisão do Banco
Participação exclusiva das Setoriais com atividades em execução

Prorrogação de Prazo do Projeto
Pleito de Solicitação de 12 meses adicionais (12/2027)

PLOA 2027
Envio à UGP dos valores até 31/08/2026

3. GERENCIAMENTO FINANCEIRO

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

PANORAMA GERAL DO PROJETO

US$ 139,88M
Valor do Empréstimo

US$ 34,97M
Contrapartida Estadual

92,31%
Desembolsado

US$ 10,76M
A Desembolsar

59
Atividades do Projeto

01
Atividade a Contratar

15
Atividades em Execução

4
Meses para encerramento do Projeto
Pleito para prorrogação por mais 12 meses

4/6
Reuniões do Comitê realizadas em 2026

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

ATIVIDADES A CONTRATAR

	Setorial	Categoria de Gastos	Atividade	Previsão de Assinatura
COMPONENTE 3	IPECE	Serviço	Serviços para Realização de duas Pesquisas Domiciliares na área de Abrangência dos Municípios do Sistema Adutor Banabuiú – Sertão Central.	Novembro/26

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

SALDO DA CONTA OPERATIVA

Posição em Dólares (US$)

128,77M
Valor Desembolsado
Total de recursos disponibilizados

128,11M
Valor Executado
Recursos efetivamente utilizados até 26/8/2026

660 MIL
Saldo a Executar
Recursos aplicados disponíveis

Posição em Reais (R$)

683,51M
Valor Desembolsado
Total de recursos disponibilizados

680,09M
Valor Executado
Recursos efetivamente utilizados até 26/8/2026

3,42M
Saldo a Executar
Recursos aplicados disponíveis

Taxa de execução atual: **99,50%** dos recursos desembolsados.

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

SUMÁRIO – LOA E EMPENHOS 2026 EM R$

SETORIAL	LEI + CRÉDITO (A)	VALOR EMPENHADO (B)	SALDO (A) – (B)	% (B)/(A)
CAGECE	714.765,00	351.673,79	363.091,21	49,20%
FUNCEME	10.000,00	-	10.000,00	0,00%
IPECE	2.204.419,18	1.386.298,82	818.120,36	62,89%
SCIDADES	2.584.456,00	574.323,48	2.010.132,52	22,22%
SRH	111.218.991,22	16.779.131,28	94.439.859,94	15,09%
COGERH (APORTE)	100.000,00	-	100.000,00	0,00%
TOTAL	**116.832.631,40**	**19.091.427,37**	**97.741.204,03**	**16,34%**

EXECUÇÃO ACUMULADA DOS CONTRATOS

94

Contratos Totais

Distribuídos entre
11 setoriais

78

Contratos Concluídos

16

Em Execução

92,50%

Execução Financeira

Dos R$ 896,41 milhões foram
pagos R$ 829,17 milhões

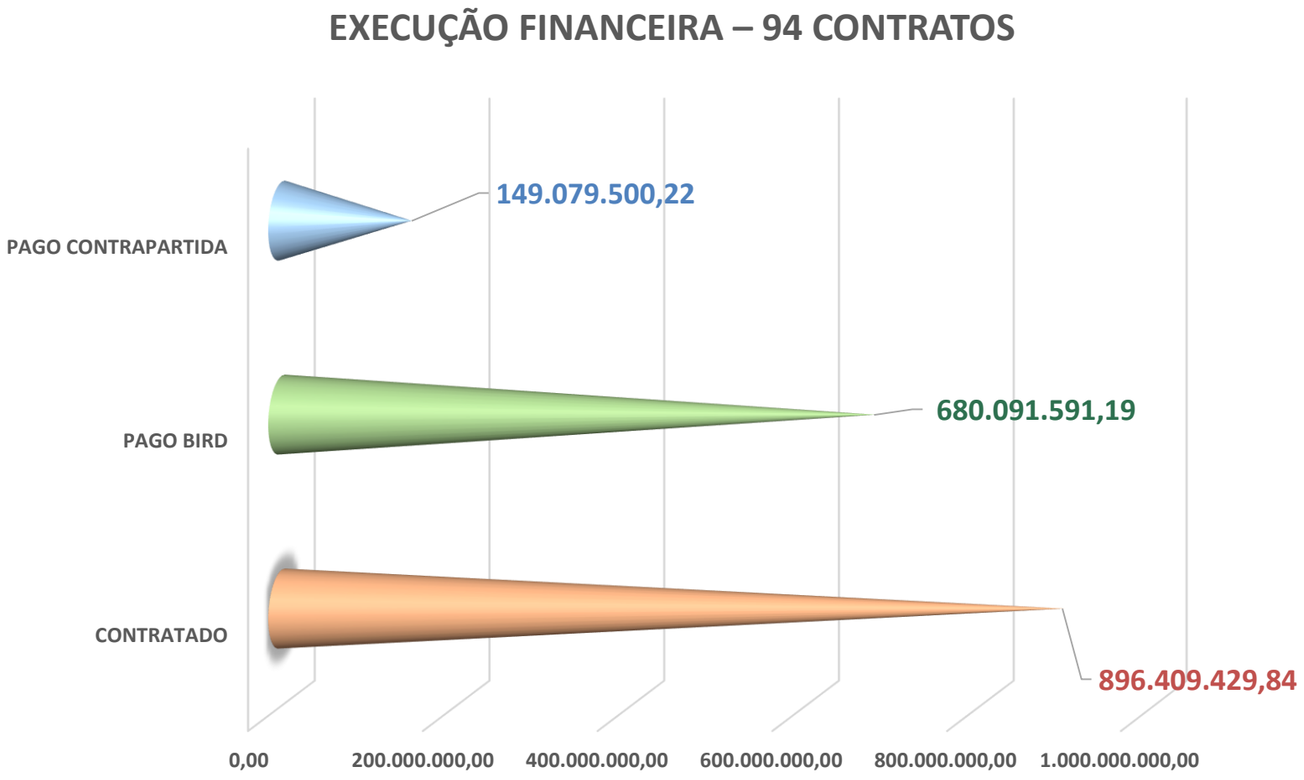

4. ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

IPF-CEARÁ

02 OBRAS

32 CONSULTORIAS

08 SERVIÇOS

17 BENS

---

59 ATIVIDADES

Componente I:
Aumento da Segurança Hídrica

SRH | SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

01 OBRA

05 CONSULTORIAS

02 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA – SRH

EM EXECUÇÃO

1

Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central

Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2022

Consórcio Águas do Sertão. Principal obra de infraestrutura hídrica com indicador de resultado associado.

2

Gerenciamento e Fiscalização do SAB-SC

Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2022

Consórcio TPF Engenharia/KL Serviços para assessoria técnica integral da obra.

3

Modelo de Gestão do SAB-SC

Contrato nº 01/PSHG/SRH/CE/2024

Consultor Individual: Wladimir Antônio Ribeiro para proposição do Arranjo Institucional do SAB-SC.

NUP nº 29001.000.854/2025-24 (Normativos)
NUP nº 290001.001621/2025-49 (Subsídios)

4

Painel de Especialistas - Geotecnia

Contrato nº 01/PSGH/SRH/CE/2023

Consultoria Individual: Manoel de Souza Freitas Júnior.

5

Painel de Especialistas - Hidromecânica

Contrato nº 03/SRH/CE/2020

Consultoria Individual: João Carlos Brito de Souza.

6

Painel de Especialistas - Hidrologia

Contrato nº 02/PSGH/SRH/CE/2024

Consultoria Individual: Pedro Antônio Molinas.

COGERH Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos

02 CONSULTORIAS

01 SERVIÇO

03 BENS

COMPONENTE I

AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA – COGERH

EM EXECUÇÃO

Planos de Segurança das Barragens

Atividade Crítica com Indicador Associado

Contrato nº 072/2022/COGERH: Encerrado com entrega parcial de apenas 4 dos 14 produtos previstos e pagos. Necessidade de nova licitação identificada.

Contrato nº 003/2026/COGERH: Em execução a partir de janeiro/2026 com a empresa Hydros Engenharia Ltda.
Dos 26 Produtos, apenas 4 produtos foram entregues, validados e pagos.

FUNCEME | FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

02 CONSULTORIAS

04 SERVIÇOS

07 BENS

Componente II:
Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água

01 OBRA

04 CONSULTORIAS

COMPONENTE II

MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA – CAGECE

EM EXECUÇÃO

Controle e Redução de Perdas na Região Metropolitana de Fortaleza por Setores Hidráulicos (01 a 06). *Há Indicador associado*

Lote I - Obras

Contrato 0093/2023

Consórcio Floresta e Expedicionários

Lote II - Obras

Contrato 0059/2023

Consórcio Telar-Enorsul-BBL

Serviços de Engenharia Consultiva para Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no município de Fortaleza. *Há Indicador associado*

Contrato 051/2023

Consórcio Igneo-NIP-Concremat

Componente III:
Fortalecimento da Gestão do Setor Público

ARCE | AGÊNCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARÁ

03 CONSULTORIAS

IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

10 CONSULTORIAS

03 SERVIÇOS

01 BEM

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO – IPECE

LICITAÇÃO

Pesquisas Domiciliares SAB-SC — 1

Abertura do processo em 16/06/2026, sob NUP: 46032.000213/2026-11. Processo em análise pela CELIC/PGE após esclarecimentos prestados pela equipe do IPECE. Contratação será por Pregão Eletrônico.

EM EXECUÇÃO

Suporte à UGP — 2

Equipe de consultores individuais prestando suporte técnico contínuo à Unidade de Gerenciamento de Projetos através de seis contratos ativos.

Contratos:

02/2020; 03/2020; 04/2020; 09/2020; 02/2021; 09/2023

SDE FUNCEME

01 CONSULTORIA

01 BEM

SDE IPECE INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

01 CONSULTORIA

SCIDADES | SECRETARIA DAS CIDADES
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

02 CONSULTORIAS

COMPONENTE III

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO – SCIDADES

EM EXECUÇÃO

Serviços Especializados para Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Ceará (PAAES) e Planos Correlatos.

Contrato 26/2024

Executor

COBRAPE – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos

Execução: 15/12/2026

Vigência: 31/12/2026

Produtos

Dos 15 Produtos, apenas 3 produtos foram entregues, validados e pagos.

CGE | CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

01 CONSULTORIA

SEPLAG | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

01 CONSULTORIA

01 BEM

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

02 BENS

SISTEMAS DESENVOLVIDOS

CGE	SDE / IPECE	SEPLAG	TCE
Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais	Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI	Gestão de Investimento Público - GIP	e-Obras

5. INDICADORES

SUMÁRIO DE METAS

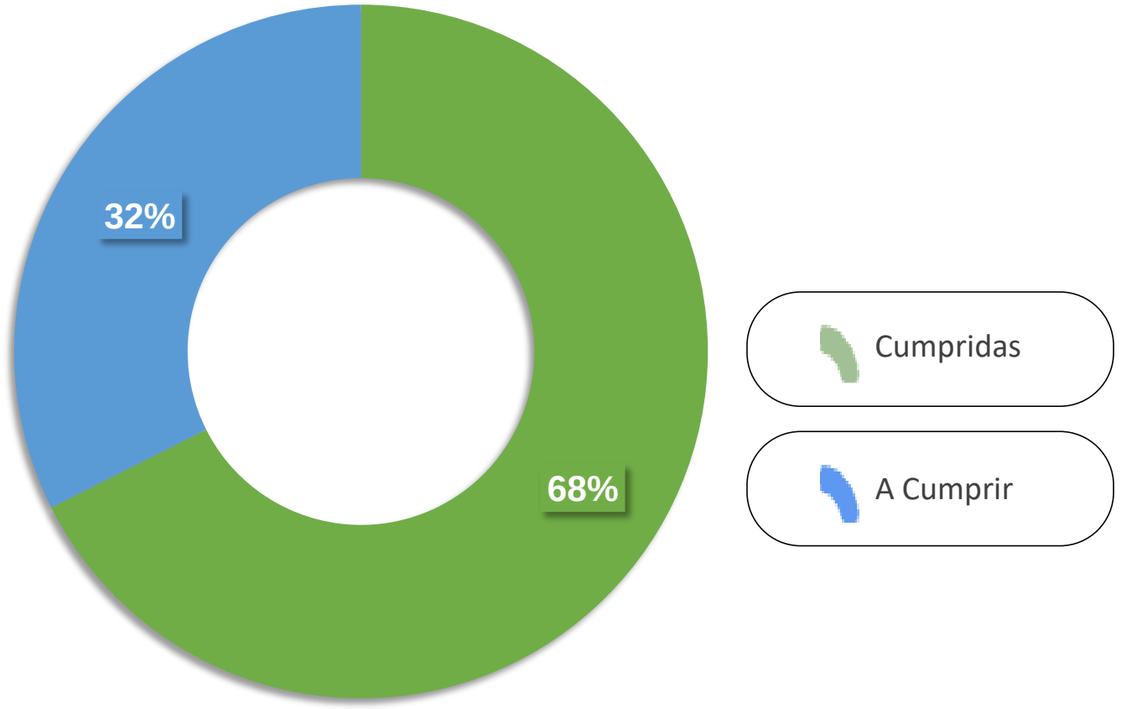

Panorama de Desempenho 2026

25

Metas Atingidas
das 37 metas totais do Projeto

12

Metas Pendentes
A serem cumpridas até dezembro/2026

Ponto de Atenção: As metas com maior risco de atraso estão relacionadas ao Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central e poderão ser cumpridas em 2026.

METAS CUMPRIDAS

SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)
FUNCEME	Sistema de Previsão Climática fortalecido.	1	Informações do Sistema de Previsão Climática disponíveis ao público.
		2	Previsão de afluência da água para os reservatórios estratégicos do Estado gerada duas vezes ao mês, no período de dezembro a abril, com base em dois modelos climáticos globais (ECHAM e CAM).
COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião.	3	Painel de especialistas em segurança de barragens contratado.
		4	Meta Intermediária 02: Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares para a Barragem do Banabuiú contratados. Base de dados para armazenamento de dados de instrumentação das barragens operadas pela COGERH, incluindo alertas automatizados, desenvolvida.
		5	Meta final: Obras de reabilitação de Banabuiú finalizadas.
CAGECE	Proposta de revisão da estrutura tarifária.	6	Estudo para revisão da estrutura tarifária da água contratado.
		7	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água finalizada.
		8	Estudo de revisão da estrutura tarifária da água aprovado pela Diretoria da CAGECE.
		9	Proposta de revisão da estrutura tarifária da água apresentada e aprovada pelas agências regulatórias.
CAGECE	Número de Distritos de Medição e Controle criados em Fortaleza.	10	09 DMC’s.
		11	18 DMC’s.
		12	44 DMC’s.
SEPLAG	Sistema GIP implementado e em operação – SEPLAG.	13	Sistema 100% implementado e disponível a todos os usuários.
		14	10% dos novos Projetos da SDA analisados através do sistema.
		15	20% dos novos Projetos de recursos hídricos analisados através do sistema.

METAS CUMPRIDAS

SETORIAL	INDICADOR	METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)	
TCE	Percentagem de obras públicas monitoradas.	16	Sistema de monitoramento de obras desenvolvido e operacional, com drone e sala de situação interconectados.
		17	70% das obras do Projeto monitoradas. 50% das grandes obras do Estado (acima de R$50 milhões) monitorados.
		18	Meta final: 100% das obras do Projeto monitoradas. 80% das grandes obras do Estado (acima de R$50 milhões) monitorados.
IPECE	Grupo dedicado criado no IPECE para fornecer suporte técnico.	19	Grupo criado dentro da Diretoria de Estudos Econômicos do IPECE.
		20	Estudo de Cadeias Produtivas com enfoque na produção de uso interno da água finalizado.
		21	Meta final: Estudo inter e intra-setorial de demanda utilizando o modelo entrada e saída (input output) finalizado.
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido.	22	Metodologia de cálculo definida, incluindo critérios de avaliação a serem determinados pelas instituições que usarão o sistema juntamente com a empresa contratada.
COGERH	Percentagem de usuários estratégicos da água regularizados	23	Meta final: 80%
COGERH	Percentagem de usuários registrados que possuem macromedição	24	Meta final: 75%
ARCE	Resolução para regulação do controle patrimonial dos ativos de água e saneamento publicada.	25	Meta final: Resoluções Arce n.º 20/2025, e Arce n.º 23/2025 publicadas.

METAS A CUMPRIR EM 2026

SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)	PREVISÃO DE CUMPRIMENTO
CAGECE	Continuidade dos sistemas hídricos abastecidos com água do Sistema Adutor Banabuiú - Sertão Central – CAGECE.	1	Meta: 90	12/2026
IPECE	Pessoas beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis – CAGECE.	2	Meta: 118.490	12/2026
IPECE	Mulheres beneficiadas com serviços hídricos mais confiáveis – IPECE.	3	Meta: 61.615	12/2026
CAGECE	Redução da Água Não geradora de Receita na cidade de Fortaleza (litros/conexões/dia) (número) – CAGECE.	4	Meta: 317	12/2026
CAGECE	Maior capacidade de tratamento da água na região do Sistema Adutor Banabuiú-Sertão Central - SRH / CAGECE.	5	Meta: 1.900 m3/h	12/2026
IPECE SRH CAGECE	Redução do tempo perdido de atividades de rotina devido a doenças gastrointestinais transmitidas pela água - IPECE, SRH, CAGECE.	6	Meta: Redução da diferença em 20%	12/2026
IPECE SRH CAGECE	Redução do tempo dedicado a tarefas domésticas (Incluindo a busca de água para o domicílio) - IPECE, SRH, CAGECE.	7	Meta: Redução da diferença em 10%	12/2026
IPECE SRH CAGECE	Nível de satisfação dos beneficiários com o fornecimento de serviços hídricos - IPECE, SRH, CAGECE.	8	Meta: 70%	12/2026
OUVIDORIA GERAL/UGP	Queixas e consultas recebidas através do Mecanismo de Reparação de Queixas registradas e solucionadas – OUVIDORIA GERAL/ UGP/ SRH/ CAGECE.	9	Meta Final: 90	12/2026

METAS A CUMPRIR EM 2026

SETORIAL	INDICADOR		METAS (INTERMEDIÁRIAS E FINAL)	PREVISÃO DE CUMPRIMENTO
SRH COGERH	Melhoria das condições de segurança das barragens Banabuiú e Gavião - SRH / COGERH.	10	Meta Intermediária 03: Planos de Segurança para as Barragens de Gavião e Banabuiú contratados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Análise Periódica de Segurança da Barragem do Gavião e Estudos Complementares do Banabuiú finalizados.	06/2026
		11	Meta Intermediária 04: Planos de Segurança das Barragens de Gavião e Banabuiú Finalizados (plano de instrumentação, plano de O&M, Plano de Preparação para Emergências). Obras de reabilitação de Banabuiú contratadas.	12/2026
CGE	Índice médio de avaliação de contratos desenvolvido – CGE.	12	Meta Final: Metodologia aplicada para contratos registrados no novo sistema.	06/2026

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO COMITÊ

2026

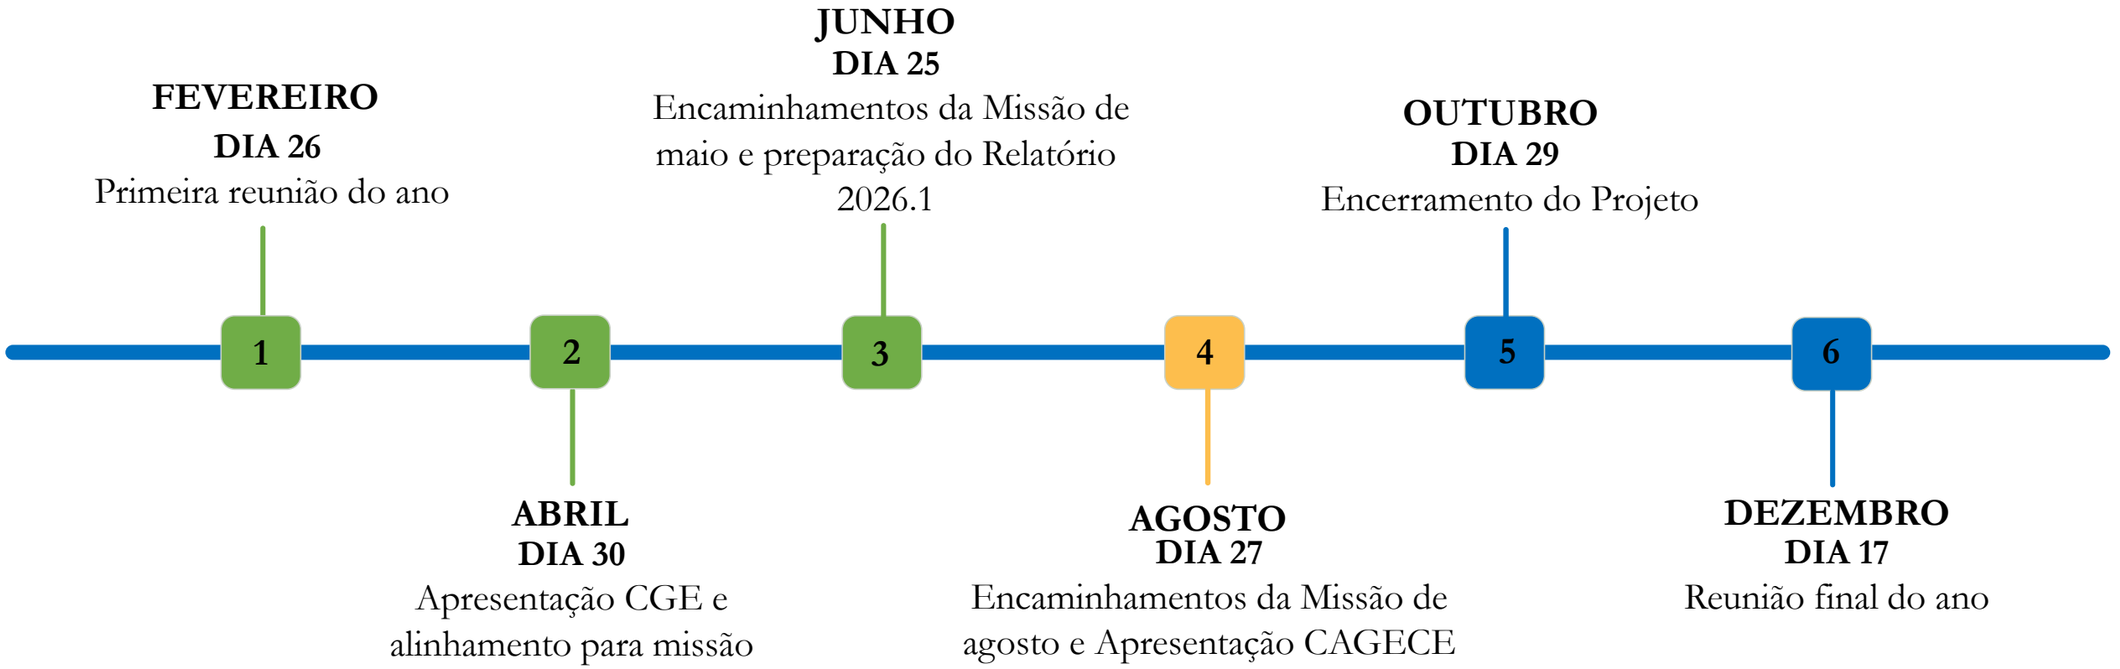

Total de 6 (seis) reuniões programadas ao longo do ano para acompanhamento das atividades.

6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

SETORIAL		ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTAÇÃO
TCE	1	Sistema de monitoramento de obras (e-Obras).	-	OK
CAGECE	2	Elaboração de Estudo de Mercado e da Estrutura Tarifária da Concessionária para os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.	CTR 201/2021 - QUANTUM DO BRASIL LTDA	OK
FUNCEME	3	Monitoramento Utilizando Técnicas de Modelagem Hidrológica e de Sensoriamento Remoto dos Pequenos Açudes Visando sua Incorporação na Estimativa de Aporte aos Reservatórios Estratégicos do Estado.	14/2021 - UP TRANSFER GMBH AT THE UNIVERSITY OF POTSDAM	OK
ARCE	4	Modernização da Gestão e da Atividade Regulatória da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.	04/ARCE/2023 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	OK
IPECE	5	Consultoria para Desenvolvimento de Metodologia do Cálculo do PIB do Agronegócio e do PIB da Agricultura Familiar do Estado do Ceará e Uso de Instrumentos de Análise de Impactos Econômicos com Enfoque nos Recursos Hídricos do Estado do Ceará.	08/2022 - QUADRANTE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA	OK
FUNCEME SDE	6	Levantamento Cadastral de Produtores Rurais, Determinação de Indicadores Socioeconômicos e Estimativa de Demandas Hídricas do Setor Agropecuário nas Bacias do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Estado do Ceará.	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA	OK
IPECE SDE	7	Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o Assessoramento à Irrigação - SEAI do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).	12/2022 - 3V3 TECNOLOGIA LTDA	OK

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

SETORIAL		ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTAÇÃO
COGERH	8	Prestação de Serviços de Consultoria, Contemplando as Ações de Regularização de Recursos Hídricos para as 12 (doze) Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará.	066/2022/COGERH - CONSÓRCIO HYDROS ENGENHARIA LTDA / REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA / IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	OK
IPECE	9	Sistema de Contas Econômicas Ambientais da Água Utilizando Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo Produto.	06/2024 - ROGÉRIO BARBOSA SOARES	OK
CAGECE	10	Consultoria Especializada para Implantação de Melhorias nos Processos de Gestão de Empreendimentos da CAGECE.	0098/2023 - CONSÓRCIO MELHORIAS DE GESTÃO FALCONI CONSULTORES S.A E EFFICO SANEAMENTO LTDA	OK
ARCE	11	Elaboração de Manual de Controle Patrimonial Destinado aos Setores de Distribuição de Gás Canalizado, de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, no Âmbito do Estado do Ceará.	0007/2023/ARCE - KROLL BRASIL LTDA	OK

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

SETORIAL		ATIVIDADE	FORNECEDOR	APRESENTAÇÃO
SEPLAG	12	Consultoria para Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Investimento Público (GIP) do Poder Executivo do Estado do Ceará.	018/2022 - CONSÓRIO MTC: MACROPLAN – PROSPECTIVA, ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA. / TRANSPLAN – PLANEJAMENTO E PROJETOS S.A. / J C M FREITAS– SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (CHERRY IT)	OK
CGE	13	Consultoria para o Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.	07/2022 - CONSÓRCIO: CONFIDERE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. E CANIX SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	OK
ARCE	14	Melhoria de Processos de Controle, Fiscalização e Certificação de Informações para Regulação dos Serviços de Saneamento Básico	CO/PRJ/025/2024 - MBS ESTRATÉGIAS E SISTEMAS LTDA	OK
CAGECE	**15**	**Revisão do Modelo de Gestão Estratégica e de Negócio e Melhoria do Desempenho Empresarial da Cagece.**	**145/2022 - INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA S/S LTDA**	**AGOSTO**
